Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» 11 2024 года

г.Кызылорда

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Промстройсервис. Е» генеральный директор – Еспенбетов Манарбек Нагимович, г. Кызылорда, пр. Н. Назарбаева , № 70***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***генеральный директор – Еспенбетов М.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***"Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(Жилой дом 1-5) Привязка. 1-очередь»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель –Файзуллаев Жеңісбек Исламұлы;***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными ***ТОО «ДК-Спецстройсервис» ГСЛ №24011640 от 22.02.2024г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "КазакЖобаКурылыс";
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, № 125-НК от 21.11.2022 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	квартир	84		84	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	6213,9	6213,9
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	34313,05	34313,05

В том числе подземной части	$м^3$	3072,81	3072,81
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных	-					
двухкомнатных	21	1245,51	654,78	21	1245,51	654,78
трехкомнатных	63	4968,39	2650,2	63	4968,39	2650,2
четырехкомнатных и более	-					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты -ленточные, монолитные ж/б толщиной-500мм. Стены наружные- облегченная кладка, из керамического кирпича, утеплитель- минплиты. Перекрытия и покрытия -плиты сборные железобетонные многопустотные, перемычки -сборные железобетонные. Высота этажа -3,0м, подполья -1,9м. Крыша- чердачная вентилируемая, двускатная с покрытием из металлочерепицы. Лоджии и балконы- ограждены металлопластиковыми витражами, полы- линолеумные, в санузлах- керамическая плитка, отопление – типы нагревательных приборов чугунные радиаторы «МС-90» , вентиляция – приточно- вытяжная, водопровод – хозяйственно-питьевого назначения, горячее водоснабжение – от пластинчатых теплообменников с предусмотренным в системе циркуляционным насосом, канализация – самотечная к выпускам во внутриплощадочную сеть, газоснабжение – от газопровода высокого давления Р=0,56МПа, электроснабжения – ВРУ-1-11-10 УХЛ4, ВРУ1-50-01 УХЛ4 с поквартирными электросчетчиками, комплектуемого с ВРУ1, слаботочные устройства – Видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, телефонизация, многоквартирный домофон, телевидение.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***15 мая – 2023 г;***
месяц, год

окончание работ ***21 ноября – 2024 г;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **18**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,4% и фактически применено 86,8% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

ГКП на ПХВ «Кызылорда Су жүйесі» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжение):

ТОО «ДК-Спецстройсервис» ***Килык Е. К.*** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (теплоснабжение):

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (телефонизация):

АО «Казахтелеком» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

КГУ «Кызылординский городской отдел занятости и социальных программ акимата города Кызылорда» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Промстройсервис.Е»*** считает объект:

"Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(Жилой дом 1-5) Привязка. 1-очередь".

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО «Промстройсервис.Е» Еспенбетов М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____»_____ 2024г.

подпись дата М.П.

«QAZAQGAZ AIMAQ»
акционерлік қоғамы
Қызылорда өндірістік
филиалы

QAZAQGAZ
AIMAQ

Акционерное общество
«QAZAQGAZ AIMAQ»
Кызылординский
производственный филиал

Қазақстан Республикасы, 120003,
Қызылорда облысы, Қызылорда қ.,
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1
Тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

Республика Казахстан, 120003,
Кызылординская область, г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс Султан №1
тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

«12» 11 2024 ж./г.

шыг./исх. № 352-3532-2976

«Промстройсервис-Е» ЖШС
директоры
М.Н.Еспенбетовке

«QAZAQGAZ AIMAQ» акционерлік қоғамының Қызылорда өндірістік филиалы *(бұдан әрі - Филиал)* Сіздің ағымдағы жылдың 06-шы қарашада жазған №100 арызыңызды қарап, келесіні хабарлайды.

Бүгінгі күнге дейін, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті *(бұдан әрі-Департамент)* тарапынан Филиалға табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы бірнеше нұсқамалар келіп түсті.

Нұсқамаларда, Филиалдың табиғи монополия субектісінің желісіне қосуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды қою тоқтатылсын делінген. Яғни, нұсқамалардың мазмұнында техникалық шартта көрсетілмеген өзге де құжаттарды, оның ішінде нысанның газ тұтыну жүйесіндегі құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарды талап етуге, сондай-ақ, жобаға сәйкестігін тексеру жұмыстарына шектеу қойылып отыр.

Аталған нұсқамаларды заңсыз деп танып, күшін жою үшін Филиал сотқа жүгінді. Сот отырыстарында арнайы шақырылған Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мамандары тарапынан ауызша және жазбаша түрде берілген түсіндірмелері ескерілді. Алайда, экономикалық сотымен Департаменттің іс-әрекеті дұрыс деп танылып, нұсқамаларды өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен қатар, екінші саты соты яғни, сот алқасы, Филиалдың талабын қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ деген тұжырым жасап, Филиалдың апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды.

Осылайша, нұсқамалар заңды күшіне еніп, Филиалға тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, айыппұлдар салынды. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде, **Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жақ**

қағалауындағы 7 қабатты 84 пәтерлі №5 тұрғын үй нысанының жобасында сыртқы газбен жабдықтау құрылысы және осыған ұқсас нысандар бойынша сәйкестік декларациясына қол қойып, мөр басуға Филиалдың құқықтық негізі жоқ екенін хабарлай отырып, сәйкестік декларациясының қол қоюшылардың тізімінен Филиалды алып тастау қажет деп санаймыз.

Директордың орынбасары **Б.Әбдіқаппарұлы**

ӨТБ бастығы:Ағайдаров Ғ.Ш.

Орындаған:Таһан Ә.С.

Тел:8(7242) 55-17-42

Жер учаскесінің атқарушы түсірілімі

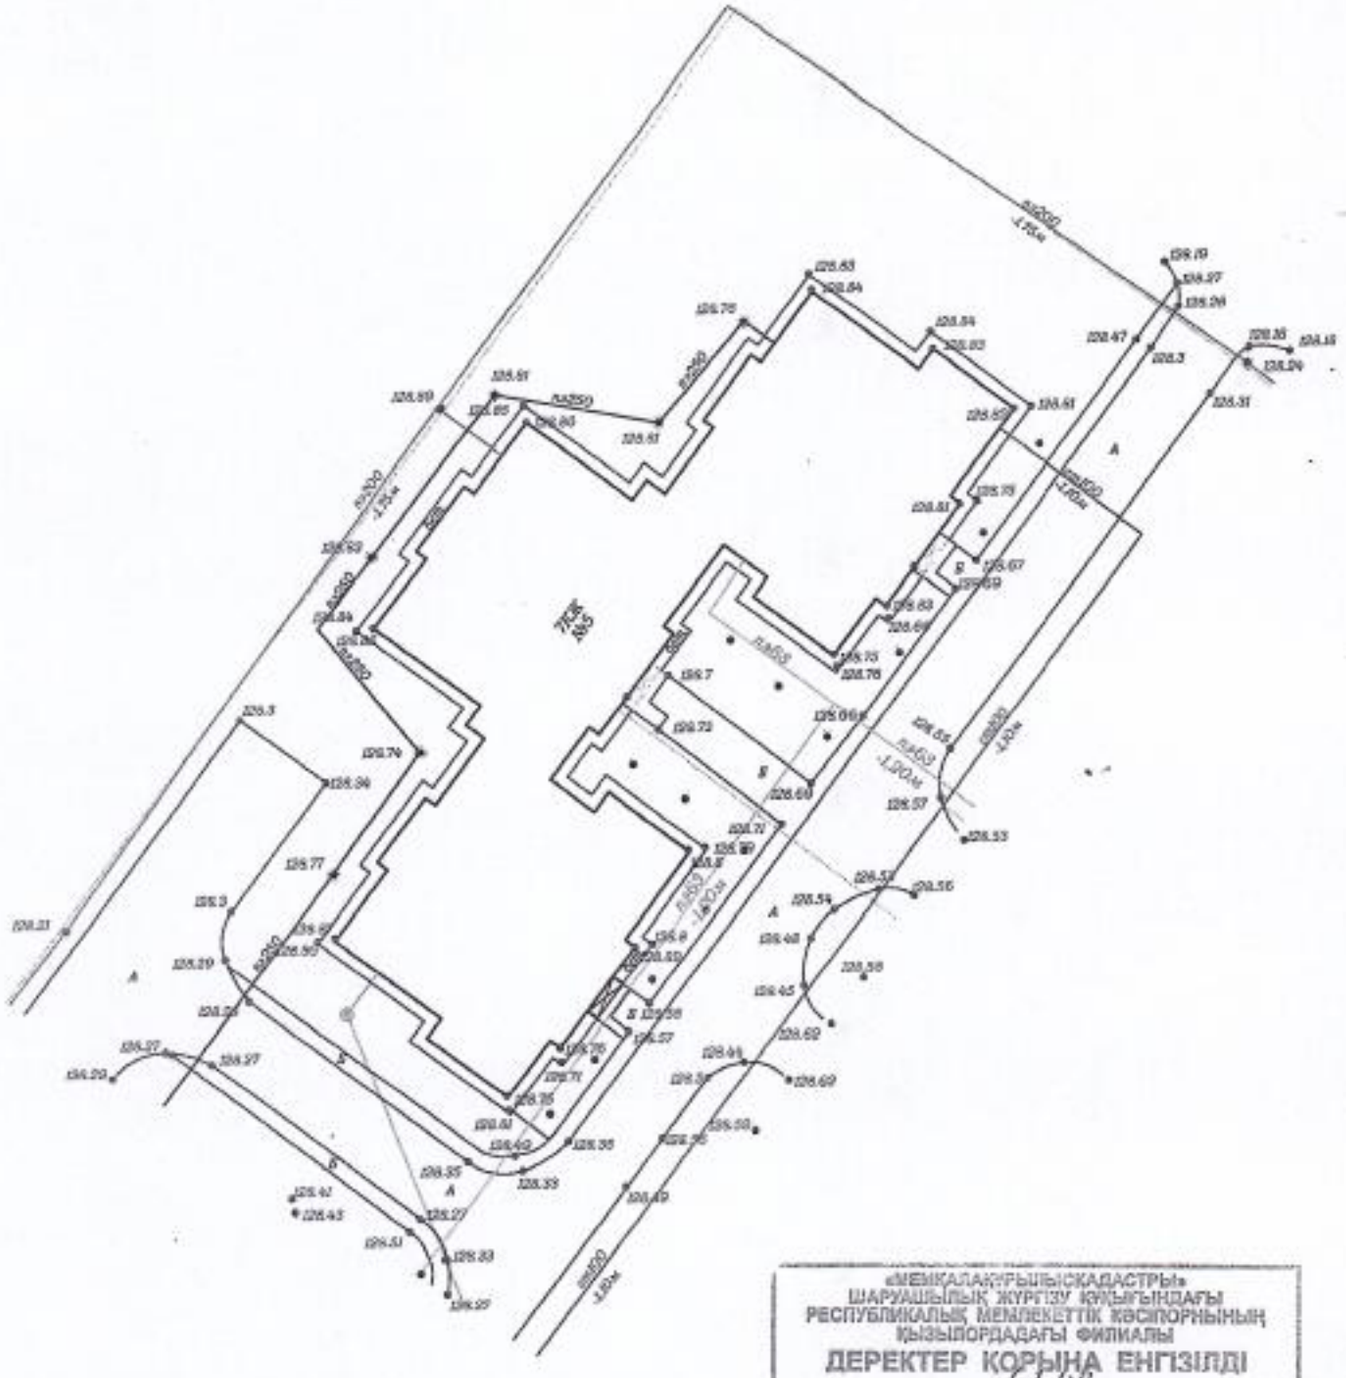

«МЕМЛЕКЕТТІК ЖЕР КАДАСТРЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 1248
20 24 ж. « 08 » 11

Іартты белгілер

- Электр желісі
- Газ желісі
- Телефон желісі
- Жылу желісі
- Су желісі
- Көріз желісі

Меншік иесі:ЖШС "Промстройсервис.Е"

Нысан: Қызылорда қаласы, Сол жағалаудағы 7 қабатты тұрғын үйдің құрылысы,№24

Филиал директоры	Б.Абдикалиров	
Орындаушы	Е.Аманкосов	Жер пайдаланудың ситуациялық жоспары

парақ	масштаб
1	1:500

"Мемлекеттік жер кадастры" РМК-ның Қызылордадағы филиалы

Ескертпе: жоспардың құрастырылған күні

Түсіндіру нөмірі

Жергілікті координаттар жүйесі

Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлігі санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалы
индекс, мекен жайы : 120008 Қызылорда қаласы, Хасан Бектұрғанов көшесі, 10А Тел: (7242) 23-96-08, 23-81-73,
факс: 23-96-07 email: kyzylorda-obl@nce.kz

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области
индекс, адрес 120008, ул.Хасан Бектурганова, 10А
(7242) 23-96-08, 23-81-73,
факс: 23-96-07 email: kyzylorda-obl@nce.kz

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Дыбыс оқшаулауын өлшеу бойынша
сараптамалық қорытынды
(Экспертное заключение
по измерению звукоизоляции)
№17
от «19» 11. 2024 жыл (г.)

1.Өтініш беруші (Заявитель): «Промстройсервис-Е» ЖШС Қызылорда қаласы, Назарбаев көшесі, №70/ ТОО «Промстройсервис-Е» г.Кызылорда, ул. Назарбаева, №70
2. Мекен-жайы (Адрес): Қызылорда қаласы, Сол жағалау м/а, 7-қабатты 84 пәтерлі №5 тұрғын үй құрылысы/ строение 7-этажного жилого 84 квартирного дома №5, мкр. Левый берег, г.Кызылорда
3.Нысан атауы (Наименование объекта): 7 қабатты пәтерлі тұрғын үй құрылысы /строительство 7 этажного квартирного жилого дома
4.Негізі (Основание) келісімшарт №2581 08.11.2024ж /договор №2581 08.11.2024г
5.Өлшеу мақсаты (Цель измерений) ішкі қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын анықтау/определение звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций
6.Өлшеу құралы атауы, тексерілген мерзімі (Средства измерений (наименование, дата поверки) Шумомер виброметр анализатор спектра Экофизика-110А, заводской №БА 221092, № UI-12-24-1016986 23.08.2025ж (г)
Всенаправленный источник звука (долсказдр) OED-SP360 Заводской №220091
-усилитель генератор OED-PA 360, заводской №220096
-калибратор акустический типа АК-1000, заводской №1599
№ВА-12-05-2902 14.11.2025ж(г)
-микрофонный предусилитель Р 200, заводской №227347
7.Нормативті-техникалық құжат (Нормативно-техническая документация)
-СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жилых и общественных зданий»;

-ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкции»;

8. Зерттеу зертханасының/ орталығының атауы, акредиттеу атестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген (Наименование испытательной лаборатории/центра, аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации) Казакстан Республикасы Денсаулық Сактау министрлігі санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалы/ Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области № KZ.T.12.E0718 23.12.2021 ж (г)

9. Дыбыс оқшаулауын өлшеу хаттамасы № 1240001003752878 19.11.2024ж / Протокол измерения звукоизоляции № 1240001003752878 19.11.2024г

10. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения);
Өлшеу кезінде ауа температурасы ,ауа ылғалдылығы ,ауа қозғалысының жылдамдығы атмосфералық қысым өлшемдері жүргізілді / Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления

Сыналатын үй –жайлар мен конструкциялардың параметрлері туралы мәліметтер (Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций)

11. Сараптамаға ұсынылған құжаттар (Документы, предоставленные на экспертизу):

12. Сараптама нәтижелері Результаты экспертизы

Ауа шуын оқшаулау индексі : белгіленген нормадан аспайды /белгіленген нормадан _-_дБ жоғары (Индекс изоляции воздушного шума: не превышает установленной нормы / превышает установленной нормы -дБ)

ҚР СЕ талаптары 2.04-105-2012 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау» Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ауа шуын оқшаулау индекстерінің нормативтік мәндері
≥ 50 құрайды./Требованиям СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан. «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума составляет ≥ 50 дБ.)

- сараптама нәтижелері бойынша ауа шуын оқшаулау индексі аралас үй-жайлардың арасында №6 пәтер және №7 пәтер 2 қабат **54 дБ** құрады, норма бойынша **≥ 50 дБ** /по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума между смежными помещениями квартиры №6 и квартиры №7 2 этажа составил **54 дБ , при норме ≥ 50 дБ.**

- сараптама нәтижелері бойынша ауа шуын оқшаулау индексі аралас үй-жайлардың арасында №10 пәтер және №11 пәтер 3 қабат **54 дБ** құрады, норма бойынша **≥ 50 дБ** /по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума между смежными помещениями квартиры №10 и квартиры №11 3 этажа составил **54 дБ , при норме ≥ 50 дБ.**

- сараптама нәтижелері бойынша ауа шуын оқшаулау индексі аралас үй-жайлардың арасында №14 пәтер және №15 пәтер 4 қабат **53 дБ** құрады, норма бойынша **≥ 50 дБ** /по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума между смежными помещениями квартиры №14 и квартиры №15 4 этажа составил **53 дБ , при норме ≥ 50 дБ.**

Еден аралық плита үшін келтірілген соққы шуының индексі: белгіленген нормадан аспайды/ белгіленген нормадан _-_ дБ жоғары (Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия: не превышает установленной нормы / превышает установленной нормы _-_ дБ)

ҚР СЕ талаптары 2.04-105-2012 « Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау» Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы санатындағы тұрғын үйлер үшін соққы шуынның келтірілген деңгейі индекстерінің нормативтік мәндері ≤ 60 құрайды (Требованиям СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан. «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий составляет ≤ 60 дБ.

Пәтерлерді бөлетін қабатаралық қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі №6 пәтер 2 қабат және №10 пәтер 3 қабат **59** дБ құрады, норма бойынша **≤ 60 (** Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющие квартиры №6 2 этаж и квартиры №10 3 этажа составил **59 дБ, при норме ≤ 60 дБ**

Пәтерлерді бөлетін қабатаралық қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі №10 пәтер 3 қабат және №14 пәтер 4 қабат **60** дБ құрады, норма бойынша **≤ 60 (** Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющие квартиры №10 3 этаж и квартиры №14 4 этажа составил **60 дБ, при норме ≤ 60 дБ**

Пәтерлерді бөлетін қабатаралық қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі №14 пәтер 4 қабат және №118 пәтер 5 қабат **60** дБ құрады, норма бойынша **≤ 60 (** Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющие квартиры №14 4 этаж и квартиры №18 5 этажа составил **60 дБ, при норме ≤ 60 дБ**

Орындаған/Исполнитель:

Зертхана маманы/Специалист лаборатории _____ **Кайруллаева М.Б.**

Сынама алу және қабылдау бөлім бастығы/
Начальник отдела приема и отбора проб _____ **Ізмағамбетов О.А.**

(лауазымы/должность, қолы/подпись)

Директор орынбасары/Заместитель директора _____ **Мурзагулова А.Т.**

(лауазымы/должность, қолы/подпись)

Директор _____ **Калиева Ф.И.**

(лауазымы/должность, қолы/подпись)

KZ.T.12.E0718 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №037 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области, г. Кызылорда	Медицинская документация Форма №037 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ измерения уровней шума, звукоизоляций

№1240001003752878 19.11.2024 ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес): «Промстройсервис-Е» ЖШС, Қызылорда қаласы, Назарбаев көшесі, №70
цех, участке(цех, участок): Қызылорда қаласы, Сол жағалау м/а, 7-кабатты №84 пәтерлі №5 тұрғын үй құрылысы
2. Өлшеу мақсаты(Цель измерения): №2581 08.11. 2024ж. Келісім шарт бойынша
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді(Замеры проводились в присутствии представителя объекта): Нұрман Берікбол
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі(Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер): Усилитель-генератор OED-PA360 Заводской №220096 Шумомер-виброметр, анализатор спектра звука Экофизика-110А Заводской Микрофонный предусилитель Р200 Заводской №227347 Всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-P360 Заводской №220091 Калибратор акустический АК-1000 заводской №1599
5. Тексеру туралы мәліметтер(Сведения о поверке): №БА 221092 №UI-12-24-1016986 до 23.08.2025г. №ВА-12-05-2902 до 14.11.2025г
6. Куәліктің берілген күні мен нөмірі(Дата и номер свидетельства): 23.08.2024, 20:02:40
7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді(Нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения): ГОСТ 27296-2012, СП РК 2.04-105-2012
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты(Основные источники шума и характер создаваемого ими шума):
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны(Количество работающих человек):
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері.(Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров):

11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді.(Исследование проводились на соответствие НД): ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения «Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций» СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

Измерение изоляция воздушного шума

Измерение изоляция воздушного шума

Измерение изоляция воздушного шума



квартира № 6
Измерение фонового шума

квартира №7
Измерение времени реверберации

квартира№10
Измерение фонового шума

квартира №11
Измерение времени реверберации



квартира №14
Измерение фонового шума



квартира №15
Измерение времени реверберации



квартира №6 квартира №6
Измерение ударного шума



квартира №10 квартира №10
Измерение ударного шума



квартира №14 квартира №14
Измерение ударного шума



квартира №6 квартира №10 квартира №10 квартира №14 квартира №14 квартира №18

А и Б – точки расположения все направленный источник звука (додекаэдр) OED-P360
1-90 – точки расположения анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А
УМ-места расположения ударной машины

№1240001003752878 20.11.2024 ж. (г.)

Өлшеулер нәтижелері
(Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескіні бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования))	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шудың жұмыс ауысым ішіндегі әсерінің уақыты) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены))	Шудың сипаты Характер шума					
				Спектр бойынша По спектру		Уақытша сипаттамалары бойынша По временным характеристикам			
				Кеңқұысты Широкополосный	Тондық Тональный	Тұрақты Постоянный	Толқымалы Колеблющийся	Үзілмелі Прерывистый	Импульсті Импульсный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц														L_A дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгейі)/ L_A, дБА дыбыстың ең жоғары деңгейі Уровень звука L_A (эквивалентный уровень звука) / Максимальный уровень звука L_A, дБА	Норма бойынша L_A дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / L_A дБА дыбысының ең жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі Допустимый уровень звука L_A по норме / Максимальный допустимый уровень звука L_A, дБА
1	25	26	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Октавалық жолақта дБ-мен үштен бірі ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері (Уровни звукового давления в дБ третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)															
100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Воздушный шум															
35,0	38,0	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
35,0	38,0	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
34,0	37,0	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Ударный шум															
61	61	61	61	61	61	60	59	58	57	56	53	50	47	44	41
62	62	62	62	62	62	61	60	59	58	57	54	51	48	45	42
62	62	62	62	62	62	61	60	59	58	57	54	51	48	45	42

Ауа шуын оқшалау индексі Rw-дБ (Индекс изоляции воздушного шума Rw-дБ)		Соққы шуының келтірілген деңгей индексі Lnw-дБ (Индекс изоляции приведенного ударного шума Lnw-дБ)	
Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)
43	44	45	46
54	≥50	59	60
54	≥50	60	60
53	≥50	60	60

спец.лаб	Қол қойылды(Подписано)	Кайруллаева Молдир Букенбаевна
зав. лаб.	Қол қойылды(Подписано)	Шойбекова Айнур Саймовна
заместитель директора	Қол қойылды(Подписано)	Мурзагулова Айсулу Турахметовна

Хаттама _2_ данада толтырылды (Протокол составлен в _2__ экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 20.11.2024 ж. (г.)
Парақтар саны (Количество страниц) 4
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің,химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
