«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Нурмубаева Ю.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2022 ж. « 01 » Сентября

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 2022 г.

Заказчик ***ИП «ОралЭлитСтрой» Ткалун Герман Юрьевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***26.08.2022г. ИП «Ткалун Юрий Владимирович» ЗКО, г.Уральск, ул. Ескалиева 293, Ткалун Юрий Владимирович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***26.08.2022г.ТОО «Сана Маркет», Утепкалиев Нагим Утепкалиевич, аттестат KZ 53VJE00037558 от 03.05.2018г., в части несущих и ограждающих конструкции***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***26.08.2022г.ТОО «Сана Маркет» ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолова 137,2, Кабиев Жасталап Уразгалиевич.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «***Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными гаражами по ул. С.Даулымова 71А, в г. Уральск, ЗКО» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***ЗКО, г. Уральск, ул. С.Дауымова, 71А***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***архитектурно-планировочное задание от 23 декабря 2021 года №KZ51VUA00389780,утверждённое руководителем ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства города Уральска» Бердигалиевым М.Т. №KZ51VUA00389780; акт на право постоянного землепользования №10100489016502 от 25 марта 2021 года на земельный участок с кадастровым номером 08-130-011-928 площадью 0.5002 га; постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области №601 от 12 марта 2021 года;***

постановление о сносе, выданное ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства города Уральска» №ЖТ-Т-513 от 17 марта 2021 года;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»____20__года

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***KZ20REA00258141 от 27.12.2021г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ***ТОО «Сана Маркет»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ИП «ОралЭлитСтрой» Ткалун Герман Юрьевич***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2021г.;***

месяц, год

окончание работ ***август 2022г;***

месяц, год

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Идрисбаева Ю.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. «01» сентября

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**10**;

фактически, месяц:**8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь застройки	м2	1262,4		1262,4	

Общая площадь зданий	м2	10728,62		10728,62	
Строительный объем	м3	46708,8		46708,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	10728,62	10728,62
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	46708,8	46708,8
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	6535,36		72	6535,36	
однокомнатных						
двухкомнатных	24	1550,32		24	1550,32	
трехкомнатных	40	3929,92		40	3929,92	
четырехкомнатных	8	1055,12			1055,12	
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемый 72-х квартирный жилой дом Г-образный в плане 9-ти этажный, с техническим этажом, с размерами в осях 45,31 х 50,0 м.

Планировка первого этажа выполнена под размещение гаражей жильцов.

Планировка со второго по девятый этаж выполнена с учетом размещения двух-, трех-, и четырехкомнатных квартир.

Над 9-ым этажом расположен технический этаж, доступ в который осуществляется из лестничной клетки.

Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки. Технический этаж - неотапливаемый.

Высота помещений:

1-й этаж – 3,0 м;

жилые этажи (2-9 этаж) – 3,0 м;

технический этаж – 1,8 м;

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного движения

маломобильных групп населения по зданию согласно СП РК 3.06-101-2012. При входах в здание предусмотрены пандусы шириной 1200 мм с уклоном равным 8%. Вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены ограждения с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м.

Входы в гаражи и жилой дом запроектированы с тамбуром.

Квартиры состоят из: жилых комнат (спальных, гостиных), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений – туалета, ванной комнаты, внутриквартирного коридора с прихожей) и летних помещений (балконов). Жилые комнаты, кухни обеспечены естественным освещением через оконные заполнения проемов и имеют ориентацию, позволяющую обеспечить нормируемое время инсоляции. Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений.

Здание жилого дома оборудовано пассажирскими лифтами по 1 лифту на подъезд, грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 1100 х 2100 х 2200 (h) м.

Все этажи композиционно и технологически объединены между собой по вертикали лестничной клеткой типа Л1. Эвакуация осуществляется по эвакуационным путям через лестницу.

Окна и балконные двери – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Витражи – из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерным стеклопакетом.

Двери входные в подъезд – металлические, утепленные, декоративные по ГОСТ 31173-2003.

Двери входные в гараж – металлические по ГОСТ 31173-2003.

Двери входные в квартиру – металлические, утепленные, декоративные по ГОСТ 31173-2003.

Двери внутренние межкомнатные – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Наружная отделка:

Наружная отделка стен – облицовка из лицевого керамического кирпича t=120 мм Сочетание желтого и коричневого цвета.

Ступени крылец, площадки – бетон кл.В15 с железнением поверхности.

Внутренняя отделка:

Стены:

помещения 1-го этажа: в гаражах, входных тамбурах водоэмульсионная покраска по подготовленной поверхности;

жилые этажи: стены лестничных клеток, лифтового холла, коридоров общего пользования – водоэмульсионная покраска по подготовленной поверхности;

стены жилых комнат, коридоров, кухонь – покраска водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности, в санузлах керамическая плитка на всю высоту;

стены технического этажа - покраска водоэмульсионным составом.

Потолки:

помещения 1-го этажа: в гаражах, входных тамбурах покраска водоэмульсионным составом;

жилые этажи - покраска водоэмульсионным составом;

технический этаж - покраска водоэмульсионным составом.

Полы:

1-й этаж – напольная керамическая плитка;

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Нурлубаева Ю.А.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. 01 » сентября

жилые этажи: в жилых комнатах, прихожих и кухнях – линолеум на теплоизолирующей подоснове, в ванных и туалетах – напольная керамическая плитка, в лестничных клетках, тамбурах – напольная керамическая плитка. технический этаж – в лестничных клетках напольная керамическая плитка, в технических помещениях стяжка из цементно-песчаного раствора.
Противопожарные мероприятия
Проект разработан в соответствии с СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
При одном эвакуационном выходе с этажа, из каждой квартиры, расположенной выше 5-го этажа, предусмотрен один эвакуационный выход наружу через лестничную клетку и один аварийный выход на лоджию, оборудованную наружной лестницей, поэтажно соединяющей лоджии.
Лестничные клетки типа Л1 имеют выходы непосредственно наружу.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

_____
_____
_____
_____
_____
_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 830 000 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 457 000 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 500 000 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 830 000 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 457 000 000 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 500 000 тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания ***С Нормальный от - 5 до - 15***
Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***«Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными гаражами по ул. С.Дауымова 71А, в г. Уральск, ЗКО» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»***принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ИП «ОралЭлитСтрой» ***Ткалун Герман Юрьевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Сана Маркет» ***Утепкалиев Нагим Утепкалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Сана Маркет» ***Кабиев ЖасталапУразгалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ИП «Ткалун Ю.В.» ***Ткалун Юрий Владимирович***

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Нурмубаева Ю.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. «01» Сентября

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Курмубаева Ю.А.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 01 » сентября

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными гаражами по ул. С.Дауымова 71А, в г. Уральск, ЗКО»	9 + тех этаж	72		1262,4	46708,8	10728,62	3800,32		492,5	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Бетонные и железобетонные	Монолитно каркасный	сендвич	автономные крышные (АИТ)	Да	имеется		имеется	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы **прилагается**

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Курмубаева Ю.А.
(А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. « 01 » сентября

План 1-го этажа (М1:100)

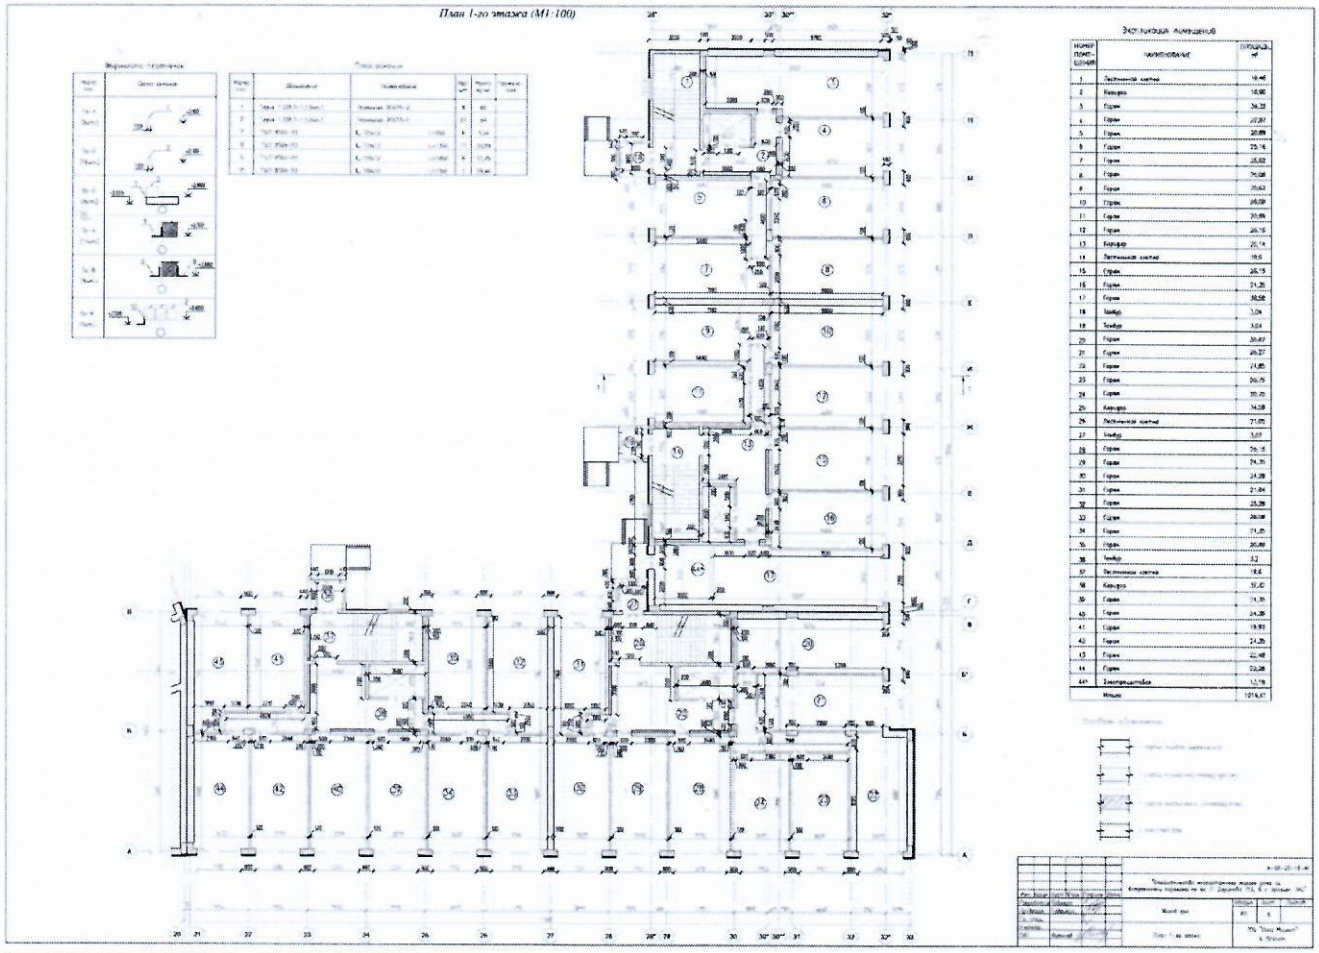

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Лестничная клетка	19.46
2	Коридор	18.90
3	Гардероб	36.33
4	Гардероб	27.27
5	Гардероб	20.89
6	Гардероб	25.16
7	Гардероб	25.63
8	Гардероб	26.08
9	Гардероб	20.62
10	Гардероб	26.09
11	Гардероб	20.66
12	Гардероб	26.15
13	Коридор	25.14
14	Лестничная клетка	19.6
15	Гардероб	26.15
16	Гардероб	21.20
17	Гардероб	30.58
18	Тамбур	3.04
19	Тамбур	3.04
20	Гардероб	30.62
21	Гардероб	49.27
22	Гардероб	21.85
23	Гардероб	26.15
24	Гардероб	20.20
25	Коридор	14.38
26	Лестничная клетка	21.05
27	Тамбур	3.07
28	Гардероб	26.15
29	Гардероб	24.35
30	Гардероб	24.28
31	Гардероб	21.84
32	Гардероб	25.28
33	Гардероб	26.08
34	Гардероб	21.20
35	Гардероб	20.89
36	Тамбур	3.2
37	Лестничная клетка	19.6
38	Коридор	50.42
39	Гардероб	21.35
40	Гардероб	24.28
41	Гардероб	19.93
42	Гардероб	24.25
43	Гардероб	22.48
44	Гардероб	22.28
44*	Электрощитовая	13.79
	Итого:	1214.47

План 2-5 этажей (М1:100)

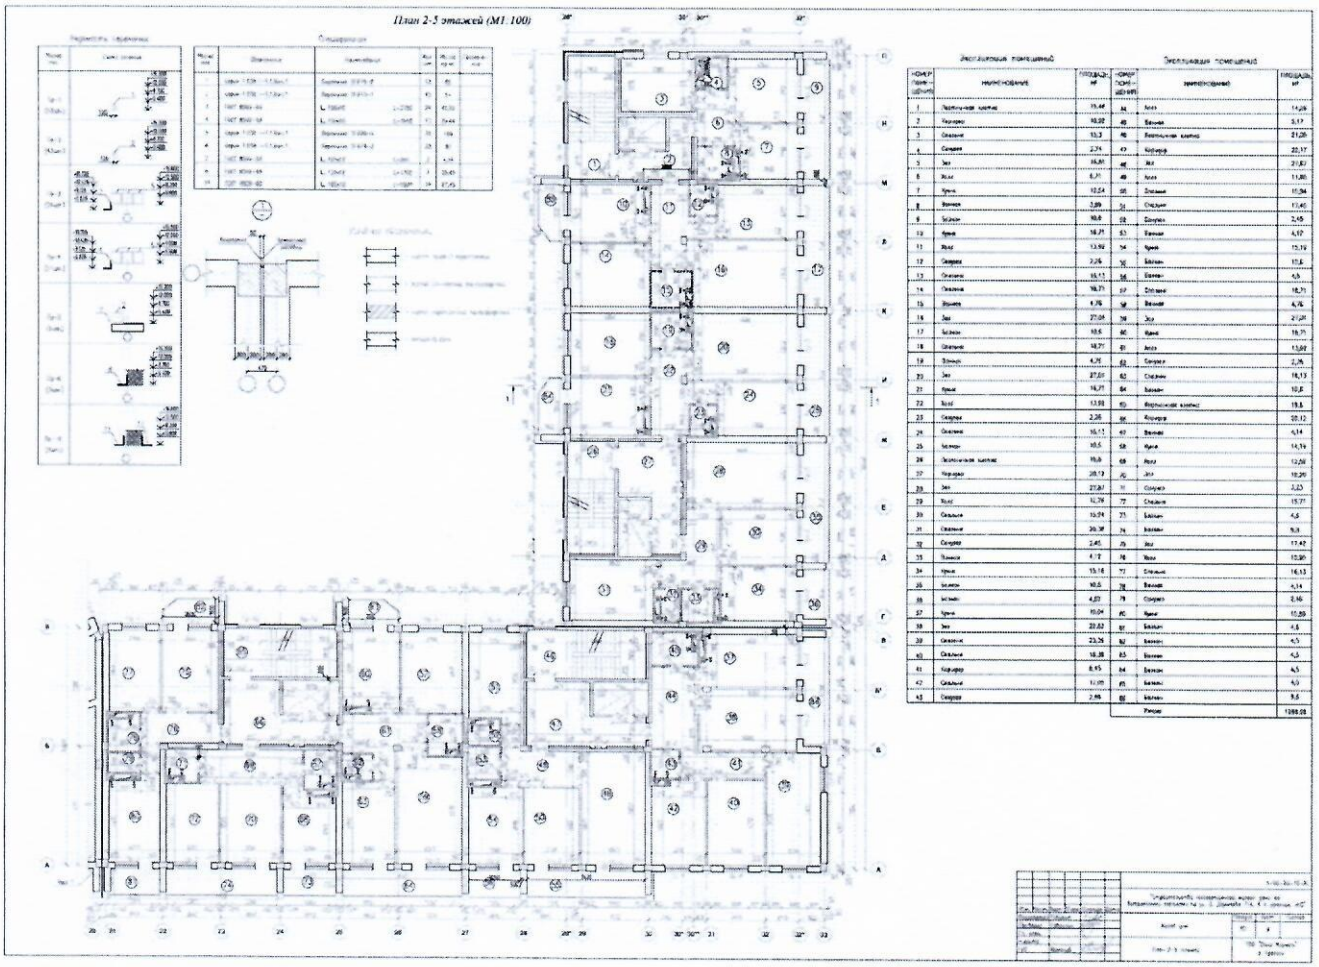

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Лестничная клетка	19.46
2	Коридор	18.90
3	Спальня	19.3
4	Спальня	27.4
5	Зал	16.81
6	Холл	6.71
7	Душ	10.54
8	Санузел	3.89
9	Балкон	10.8
10	Душ	18.71
11	Холл	13.92
12	Санузел	2.26
13	Спальня	16.11
14	Спальня	18.71
15	Душ	4.76
16	Зал	27.04
17	Балкон	10.5
18	Спальня	18.71
19	Санузел	4.76
20	Зал	27.01
21	Душ	18.71
22	Холл	13.92
23	Санузел	2.26
24	Спальня	16.11
25	Балкон	10.5
26	Лестничная клетка	19.6
27	Коридор	28.12
28	Зал	27.07
29	Холл	13.79
30	Спальня	19.04
31	Спальня	20.38
32	Санузел	2.45
33	Душ	4.77
34	Душ	18.18
35	Балкон	10.5
36	Балкон	4.07
37	Душ	19.04
38	Зал	28.02
39	Спальня	23.26
40	Спальня	18.38
41	Коридор	8.45
42	Спальня	11.05
43	Санузел	2.86
44	Холл	6.71
45	Балкон	5.17
46	Лестничная клетка	21.26
47	Коридор	22.17
48	Холл	21.87
49	Холл	11.86
50	Спальня	19.34
51	Спальня	17.40
52	Санузел	2.45
53	Душ	4.17
54	Душ	13.79
55	Балкон	10.5
56	Балкон	4.5
57	Спальня	18.71
58	Душ	4.76
59	Зал	27.04
60	Душ	18.71
61	Холл	13.92
62	Санузел	2.26
63	Спальня	16.11
64	Балкон	10.5
65	Лестничная клетка	19.6
66	Коридор	22.12
67	Балкон	4.14
68	Душ	14.34
69	Холл	12.08
70	Зал	18.29
71	Санузел	2.23
72	Спальня	15.77
73	Балкон	4.5
74	Балкон	9.3
75	Холл	17.42
76	Душ	10.90
77	Спальня	16.13
78	Балкон	4.14
79	Санузел	2.46
80	Душ	10.89
81	Балкон	4.5
82	Балкон	4.5
83	Балкон	4.5
84	Балкон	4.5
85	Балкон	4.0
86	Балкон	9.3
	Итого:	1288.08

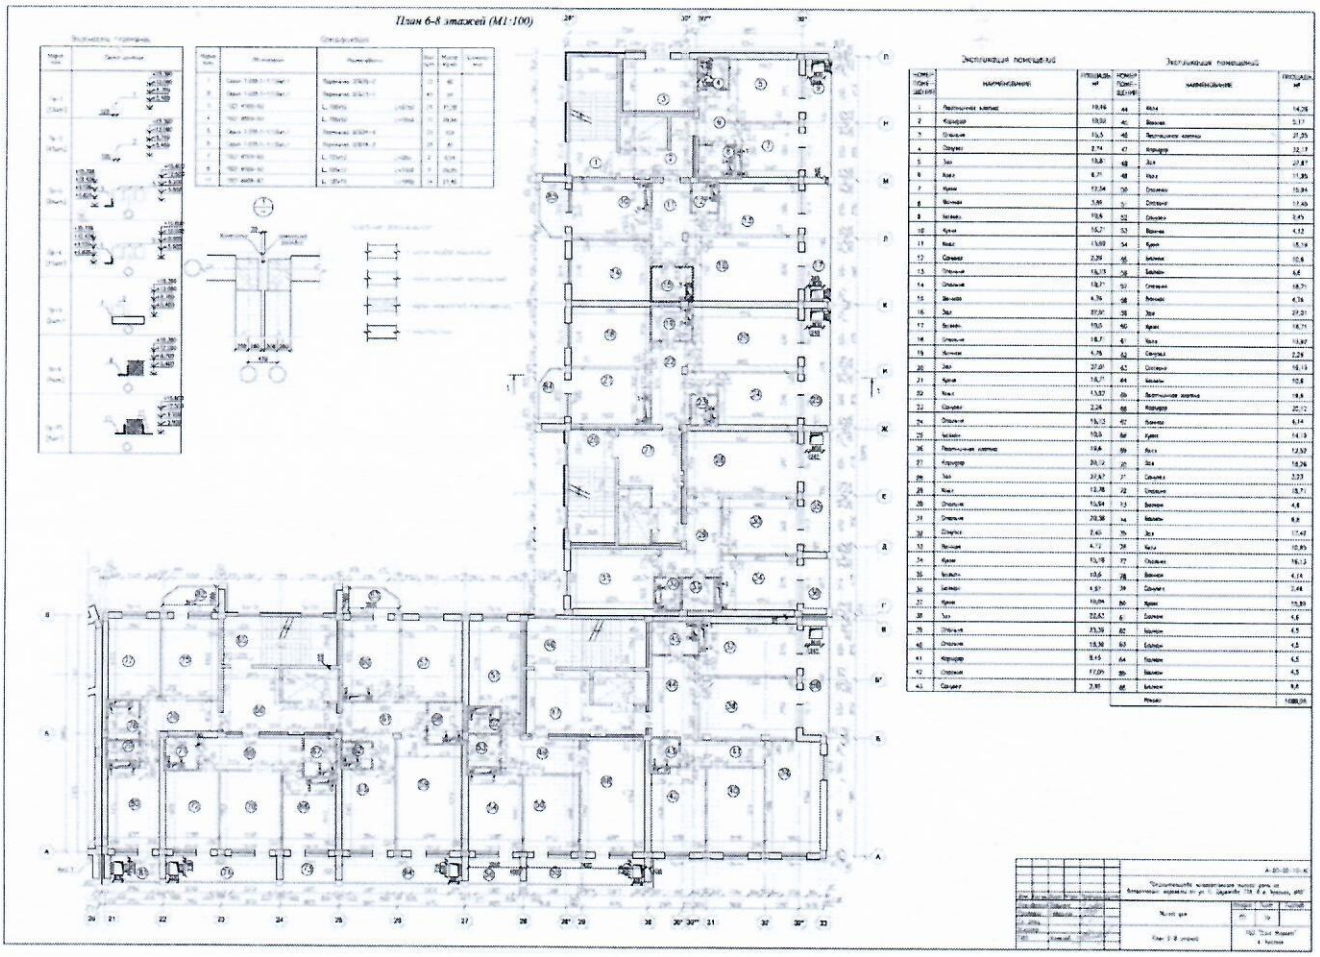

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Нурлыбаева Ю.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 01 » Сентября

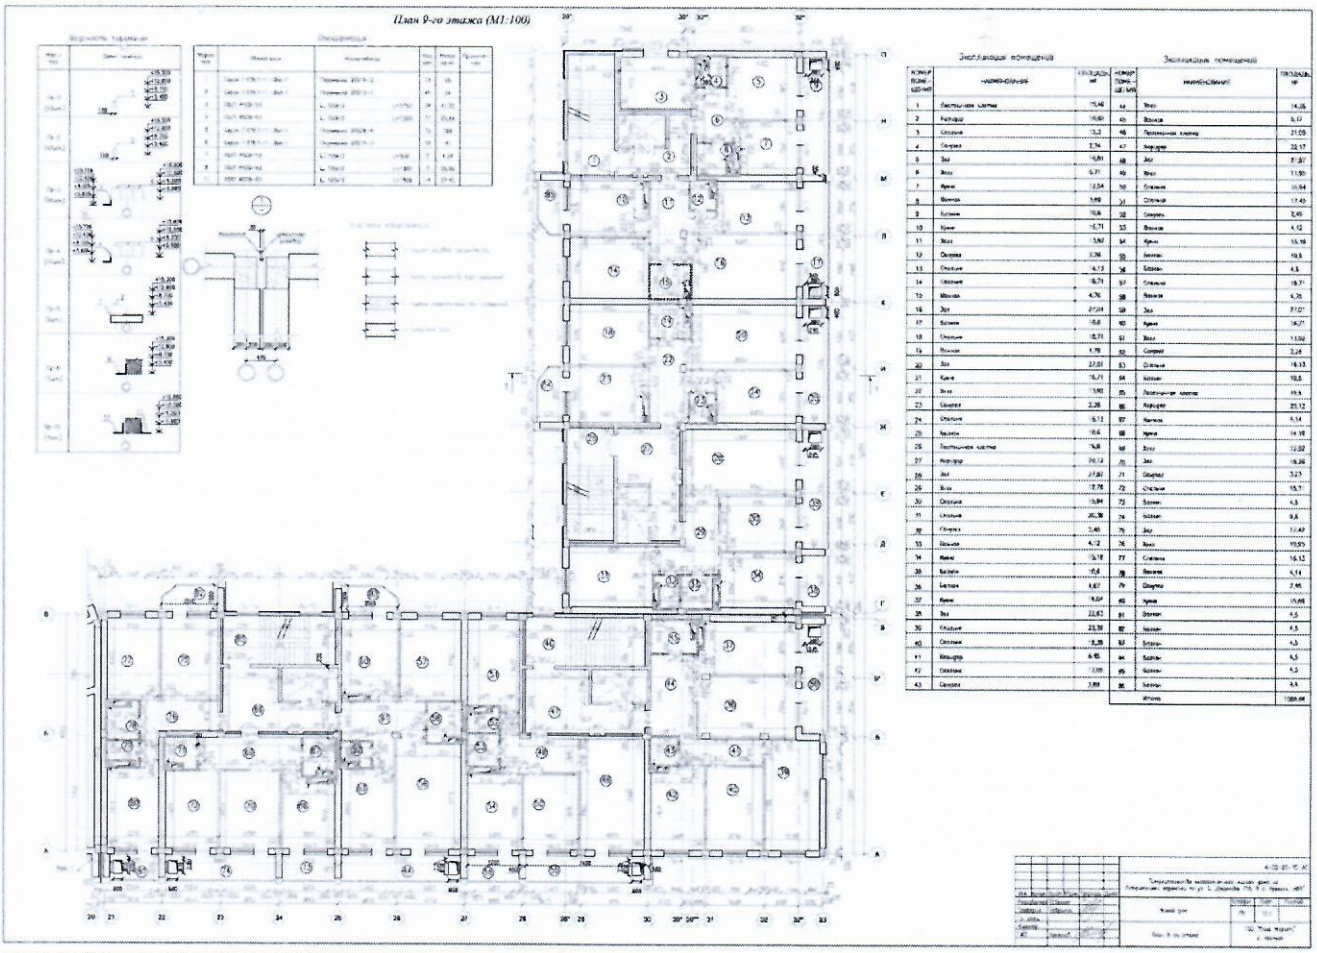

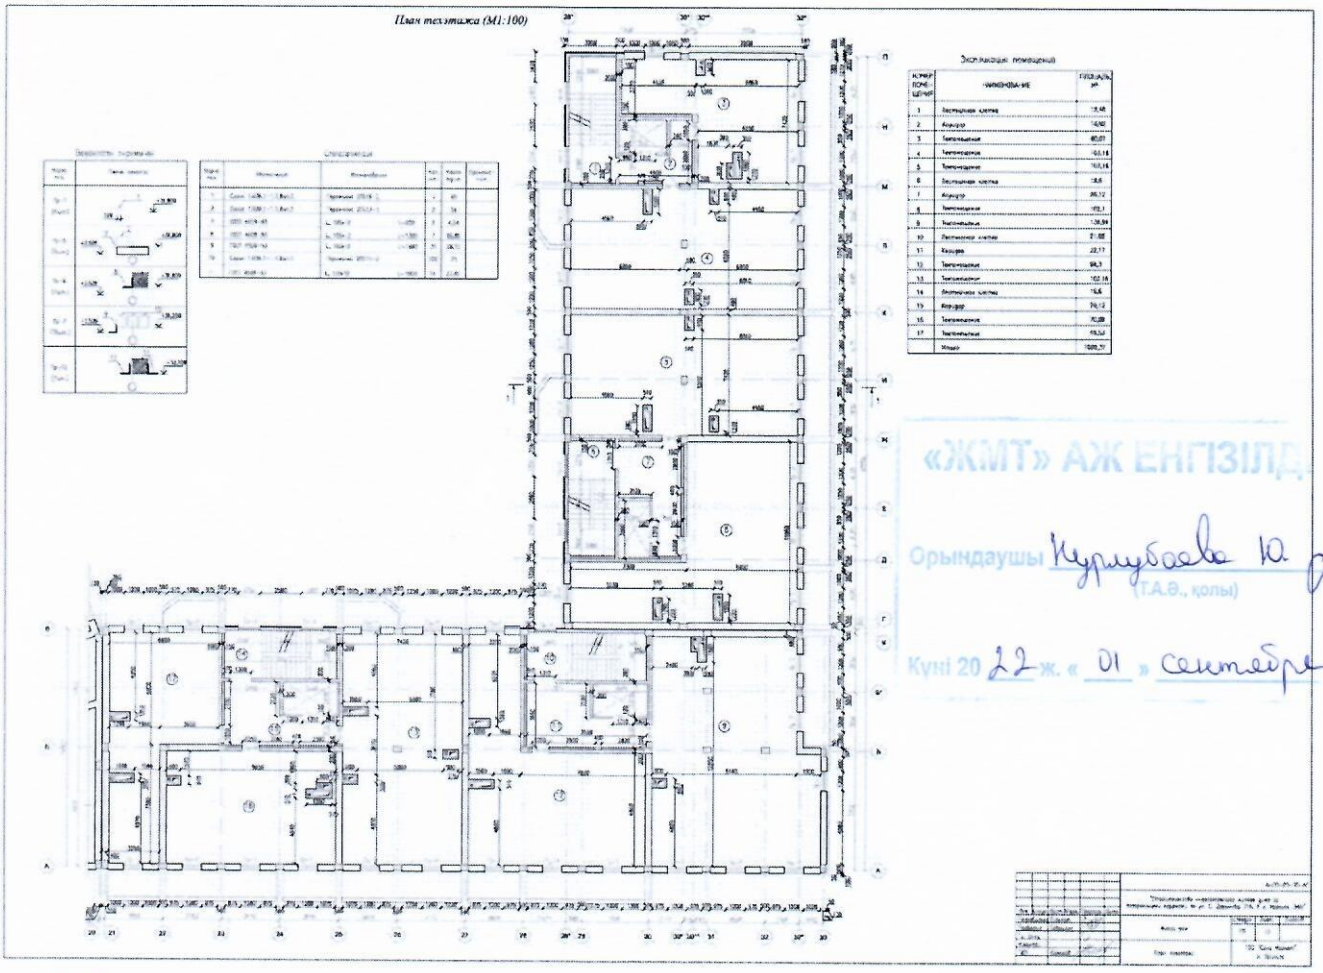

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДі

Орындаушы Курлубаева Ю.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 01 » сентября

2. Экспликация к поэтажным планам **прилагается**

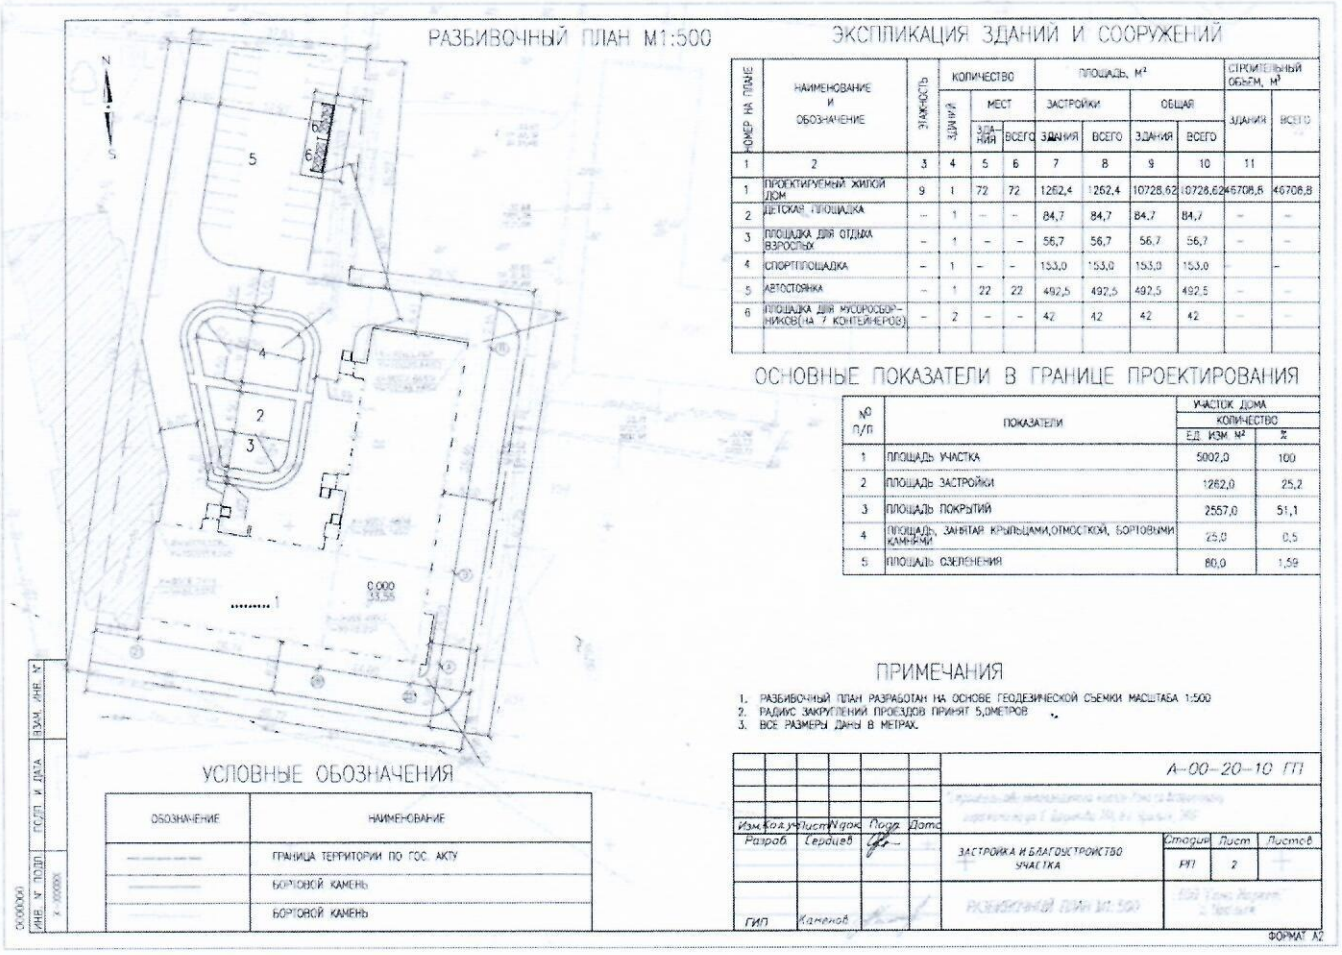

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5002,0	1269,0	1269,0		2557,0	400,0	359,6

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
336,4	153,0	141,4	42,0	80,0	80,0				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монж/б
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		сендвич
	2) перегородки		-
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		профлист
5	Полы	1-го этажа	бетон.стяжка
		последующих этажей	

6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		Металл.
7	Отделочные работы	внутренние		-
		наружные		-
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			-
10	Канализация			
11	Электроосвещение			да
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Нурлубаева Ю.
(Т.А.Ж., қолы)
Күні 20 22 ж. « 01 » сентября

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									

Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Стены и перегородки		Орындаушы Нурлубаева Ю. (Т.А.Ж., қолы)
Крыша		
Полы		Күні 20 22 ж. « 01 » сентября
Перекрытия		
Проемы	окна	

	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Курмубаева Ю.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 22 ж. « 01 » сентября

Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ИП «ОралЭлитСтрой» ***Ткалун Герман Юрьевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Сана Маркет» ***Кабиев ЖасталапУразгалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Курмубаева Ю.А

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. « 01 » Сентября

00223104 6655

08-130-011-928-7/Л

06.09.2022 ж.

С. Дауылова, ст-е 71/А

Шайхаров

Джалмуханов
