Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2020 г.

Заказчик: **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», 050001, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 4;**
на основании: **Договора №1 с/к от 18 марта 2019года.**
Декларации о соответствии: **от «10» августа 2020 года, Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», директор – Зейнеш Ербол, Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, д. 52 В, корпус 1, кабинет 515, Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», директор – Умралиев Дархан Алимжанович, Республика Казахстан, 050005, г.Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, дом № 23А.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 10 августа 2020 года, ТОО «Музтау», эксперт Жунисбеков Г.М., аттестат № KZ22VJE00030162 от 06.09.2017г. эксперт Боскымбаев Д.Б. аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г. эксперт Жумагалиев С.Ж., аттестат № KZ07VJE00041393 от 03.10.2018г. эксперт Мадиханов А.Е., аттестат № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от 10 августа 2020 года, ТОО «Зи-Дан», авторский надзор Шынгысбаев Н.М., приказ №04/17 от 03.04.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, Турксибский район.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» 06 2017 года № 2/213, Акимат города Алматы;**
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» от 08.04.2019 года KZ54REA00125124, от 18.05.2020 года KZ08REA00173191**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Зи-Дан», Заказ №56 с/к**утвержденный**КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы»,**утвержденным , приказ **№184/1 н/к от 09.11.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:**апрель 2019 года;**
месяц, год
окончание работ:**август 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**
фактически, месяц:**15;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка в отведенных границах	га	55,00		55,00	
Площадь озера включая пляжные зоны	м2	176000,00		176000,00	
Площадь оврага и существующей дороги	м2	169687,60		169687,60	
трансформаторная подстанция № 1	м2	8,00		8,00	
водозаборный комплекс	м2	4,00		4,00	
резервуар для полива 100 м3	м2	51,00		51,00	
резервуар для пожаротушения 100 м3	м2	51,00		51,00	
асфальтового покрытия проездов	м2	10756,50		10756,50	
асфальтобетонного (для велосипедных дорожек)	м2	5929,60		5929,60	
плиточного покрытия тротуаров	м2	10808,60		10808,60	
прорезиненного	м2	1888,00		1888,00	
покрытие из тактильной плитки	м2	2145,00		2145,00	
Площадь озеленения участка	м2	170016,00		170016,00	

Пирс	м2	2831,90		2831,90	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение). Участок в установленных границах функционально разделен на две части: парк микрорайона «Жас-Канат» и Аэропортовское озеро с пляжными зонами. Прогулочный пирс для дополнительной связи между частями участка. В рекреационной зоне парка предусмотрено функциональное зонирование: ландшафтно-прогулочная зона – благоустройство территории с организацией двух основных прогулочных аллей, второстепенных дорожек с местами отдыха и декоративным освещением; мини-футбольное поле; площадки «Work out» с тренажерами; площадка паркур, полоса препятствий; площадка для Street Bail; детская игровая зона – детские площадки с комплексным оборудованием на разные возрастные группы; хозяйственная зона – площадка для парковки автомашин, каждая по 30 машино-мест; площадка для мусорных контейнеров; биотуалеты; трансформаторная подстанция – 2 шт; резервуар для полива V=100 м3; пункт полиции; водозаборный комплекс. МАФы переносного оборудования: дорожные знаки; общего пользования: скамьи, урны; информационный щит, велопарковка по 5 мест, ротонда, биотуалеты, пляжный лежак, стол со скамьями, скамейка-клумба.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 210 316, 385** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 145 423, 330** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **961 797,235** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **871 427,793** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)** принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Ливинская Наталья Игоревна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
ТОО «Музтау» _____ **Боскымбаев Даниял Болгабекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор
ТОО «Зи-Дан» _____ **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер:
ТОО «Фирма «Акназар» _____ **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Партнер 2:
ТОО «Анкор-2005» _____ **Умралиев Дархан Алимжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"10" августа 2020 года

Технический надзор **ТОО «Музтау», директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна, г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева, дом 16.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Боскымбаев Даниял Болгабекович, аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№2 с/к от 19.03.2019 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**

наименование и местонахождение объекта

КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Titto строй»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Рахтаев Самат Салауатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев;**

фактически: **15 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 210 316, 385** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 145 423, 330** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **961 797,235** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **871 427,793** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО «Зи-Дан», ГСЛ № 15018061 от 08.10.2015г., Заказ №56 с/к

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», № 184/1 н/к от 09.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация

ТОО «Музтау»,

директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Боскымбаев Даниял Болгабекович,

аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 10 " августа 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Зи-Дан», директор Бисенов Дидар Закиржанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич, в соответствии с приказом от 03.04.2019 года № 04/17;.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№56 с/к от 31 июля 2017 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Titto строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Рахтаев Самат Салауатович**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **август 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев**;

фактически: **15 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Зи-Дан», №56 с/к**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» № 184/1 н/к от 09.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО «Зи-Дан»,**
директор Бисенов Дидар Закиржанович_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич, с приказом от 03.04.2019 года № 04/17**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Прошнуровано

Пронумеровано 12 ст.

Приложение №-3-Э к договору №_____
на пользование электрической энергией

УТВЕРЖДАЮ	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Потребитель	Энергопередающая организация	Владелец электросетей
_____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (подпись)
«___» _____ _____г.	«13» 10 2020 г.	«___» _____ _____г.
М.П.	М.П.	М.П.

АКТ

Разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности между Потребителем, Энергопередающей организацией, владельцем электросетей и определения категорийности электроприемников

Настоящий акт составлен *«13»* *октября* 2020 г
представителем Владельца Электросетей *Управление энергоэффективности и инфраструктурного строительства г. Алматы.*
наименование организации

в лице *руководителя Мусаева Б*
должность, фамилия, имя, отчество

представителем Энергопередающей организации *АО «Алатау Жарык Компаниясы»*
наименование организации

в лице *Заместителя главного инженера АО «АЖК» Адильбекова Н.К.*
должность, фамилия, имя, отчество

представителем Потребителя *ТОО «Анкор-2005»*
наименование организации

в лице *Директора Непомнящий Д.А.*
должность, фамилия, имя, отчество

предмет разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности между электроустановками Владельца электросетей, Потребителя и Энергопередающей организации.

При этом отмечаем, что:

1. В отношении надежности электроснабжения и существующей схемы присоединения электроприемники Потребителя относятся к **III** категории.

2. Потребитель несет ответственность, согласно «Правилам пользования электрической и тепловой энергией», за эксплуатацию нижеследующих электроустановок находящихся на балансе Потребителя:

№ № п/п	Наименование электроустановок, находящихся на балансе Потребителя	Местонахождение электроустановок Потребителя
1	*2Каб. линии 10кВ АСБ 3*120 длинной L- 1600 метров от РП-254 РУ-10кВ сек№1 яч.№7, сек-2 яч.№8 выход на ТП-4963*	*г. Алматы Турксибский район м-н. Жасканат*
2	*ТП- 10/0,4кВ с силовыми трансформаторам 250кВА, щит учета кабель 0,4кВ*	

Приложение 4
к Правилам сдачи в аренду сейфовых физическим
и юридическим лицам
в АО «Народный Банк Казахстана»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды ячейки механического сейфового депозитария
№ 134002-17.10.19-0698 от 17.10.19г
(продление срока аренды)

г. Алматы «16» октября 2020 года

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Старшего менеджера ЦПС №30 Магаляс Марина Юрьевна, действующего (-ей) на основании доверенности № 364 от 01.01.2020 года, с одной стороны,

И Кабдолдин Рустем Булатович, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», Удостоверение личности №034732977 от 17.05.2013 года, выдано МВД РК , с другой стороны,

вместе также именуемые как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды ячейки механического сейфового депозитария № 134002-17.10.19-0698 от 17.10.19г (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Комиссия за весь срок аренды ячейки, причитающаяся Банку по настоящему Дополнительному соглашению, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) тенге.

2. В пункте 3.1. Договора слова и цифры «по «17» октября 2020 года» заменить словами и цифрами «по «17» октября 2021 года».

3. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94–V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) Клиент предоставляет Банку согласие на сбор и обработку Банком своих персональных данных с целью заключения с Банком и исполнения Договора, включая, в частности, передачу персональных данных Клиента организациям, входящим в Группу «Халык» (Банк и его дочерние организации), трансграничную передачу персональных данных Клиента, в том числе согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных Клиента осуществляется Банком способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6. Все условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений. Стороны настоящим подтверждают свои обязательства по ним.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах на языке, согласованном Сторонами, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

АНКОР

СТРОИТЕЛЬСТВО

Адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, 23А,
БИН 051140012523

Акт приема-передачи

Г. Алматы **«18» января 2021г.**

ТОО «АНКОР 2005» в лице директора Непомнящих Д.А., передает на безвозмездной основе акимату Турксибского района города Алматы охранную будку размером 3000х3000 в количестве 1 единицы в парке «Желтоксан», расположенная на въезде в паркинг со стороны мкр. «Жас-Канат».

Передал
Директор ТОО "Анкор 2005" **Непомнящих Д.А.**

Принял
Акимат Турксибского района г.Алматы
Должность руководитель отдела
Ф.И.О. Воронцов К.Ю

050000, г.Алматы,
ул. Новгородская 172/2, офис 513
Тел.: +7 727 354 42 87
Моб.: +7 747 373 78 71
sales@almametall.kz
www.almametall.kz

ALMAMETALL

050000, Алматы к.
Новгородская к-сі 172/2, 513 офис
Тел.: +7 727 354 42 87
Ұялы.: +7 747 373 78 71
sales@almametall.kz
www.almametall.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАВИЛЬОНА

1. **Каркас:** Металлический, сварной из профильных квадратных труб, размером 100х50мм, 50х50мм и 50х25мм;
2. **Крыша:** Односкатная, профнастил оцинкованный, фермы металлические из профильных квадратных труб 40х20мм, утепление минплита изобокс экстралайт, толщина 100мм, фольгированная пленка теплорд и пароизоляционная пленка;
3. **Козырек:** Каркас металлически из стального уголка,40х3 и металлосайдинг L брус с полимерным покрытием, толщина 0,45мм, RAL 5005
4. **Внешняя отделка:** Металлосайдинг L брус с полимерным покрытием, толщина 0,45мм, RAL 5005;
5. **Внутренняя отделка:** Стена - ламинированный МДФ потолок – металлосайдинг с полимерным покрытием, толщина 0,45мм, RAL (цвет) белый. Утепление минплита изобокс экстралайт, толщина 100мм, фольгированная пленка теплорд и пароизоляционная пленка;
6. **Пол:** Холоднокатаный лист, толщина 0,4мм. Утепление минплита изобокс экстралайт, толщина 100мм; Фанера с толщиной 12мм, представляющий собой многослойный строительный материал, который изготавливается из экологически чистого сырья – древесины. А именно, из древесного шпона. Полукоммерческое покрытие-напольное гетерогенное покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) на не вспененной основе. Верхний защитный полиуретановый слой толщиной 1,5 микрона, выполняет функций защиты от грязи, увеличивает износостойкость покрытия. Фольгированная пленка теплорд и пароизоляционная пленка;
7. **Электричество:** Светильник, двойные розетки, автомат и кабеля в кабельном канале. Уточняется расположение в момент изготовления.
8. **Реклама:** Надпись POLISIA и эмблема

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИТРАЖА

1. 4-х камерный ПВХ, Казахстанский профиль, EuroSuperPlast, по немецкой технологии
2. Размер профиля: 60*60
3. Внешняя отделка: белый
4. Внутренняя отделка: металлическое армирование 1,2 мм, с уплотнителем
5. Стеклопакет: 1-камерный (4*16*4) мм., под 24 мм. штапик.
6. Форточки: 1-шт. с распашным открыванием
7. Витраж: полностью застекленная. Размер 1500х2000мм,2900х2000мм и 700х2000мм
8. Дверь: одностворчатая с нажимной ручкой. Дверные навесы – регулирующие, 4 шт. Полный комплект замка. Количестве 1 шт. Размер 800х2000

ФОТО ДЛЯ ОБРАЗЦА

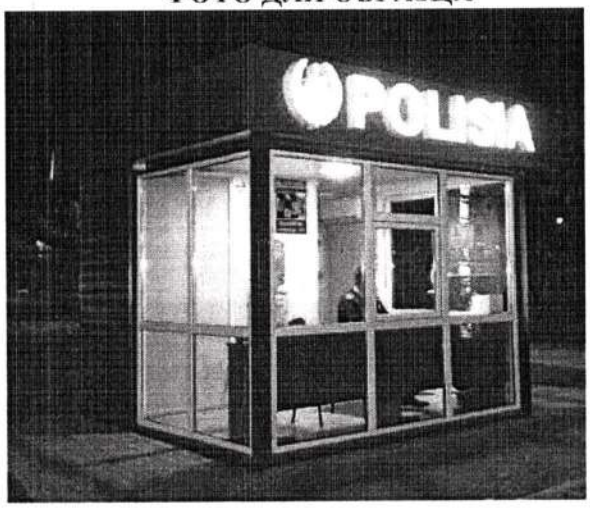

С уважением,
ДИРЕКТОР ТОО «ALMAMETALL»

БЕЙСЕНБЕКОВ Е.К.
