Приложение 1
Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 21 " мая 2021 года

Заказчик: **ИП «Изатуллаева Н.С.» , ИИН 700323402709 , 071407, РК, ВКО, г. Семей ,Переулок Международный 1/1, ИИК KZ64914102204KZ00DP8, БИК SABRKZKA , Банк ДБ АО «Сбербанк» , +7 701 530 34 22.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 21 декабря 2020г., Товарищество с ограниченной ответственностью «КУРЫЛЫС» БИН 980240001295, 071412,РК,ВКО,г.Семей, Ул.Би Боранбая 19. Государственная лицензия 1 категории ГЛ -16000191 от 12.01.2016 , Генеральный директор Аралова Жибек Ганиевна т. +7 777 292 22 22** ,
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 22 декабря 2020 года, ТОО «TexAutorVizion», Шоранов Е.К. , KZ80VJE00029894 от 24.08.2017 г в части инженерных сетей, KZ53VJE00029895 от 24.08.2017 г в части технического оборудования, KZ26VJE00029896 от 24.08.2017 г в части несущих и ограждающих конструкций. БИН180940008716, т. +7 777 292 22 22 ,**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при е г о наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 23 декабря 2020 года, ТОО «ПрофСтройПроектМонтаж» , инжинер Каипова А.Е., лицензия № 15019844, 10.11.2015г., БИН 140440030013, т. +7 777 622 97 01**,
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при е г о наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Надстройка этажей над поликлиникой » , расширение, второй - нормальный уровень ответственности**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, т е х н и ч е с к о е перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **переулок Международный 1/1, г. Семей, ВКО.**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе
посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"14" апреля 2021 года № 10100494166984 ; кадастровый номер 05-252-030-1320**;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов)
, н а основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный
у ч а с т о к , в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,
свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс
п р и реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком
н а праве собственности или выкупивших право временного возмездного
землепользования (аренды).
**либо решения о реконструкции (перепланировке,
переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от Постановление акимата г.Семей №699 от 30.05.2017г, №584 от 06.04.2018 г**;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение " Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области", № KZ83REA00160686 от 30.01.2020 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПрофСтройПроектМонтаж» , лицензия № 15019844, 10.11.2015г., Рабочий проект 18/09 - 2019**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Рабочий проект 18/09 - 2019, ТОО«Центр Экспертизы РК»ЦЭ-0100/20 от 26.02.2020 года, г. Павлодар**;
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей)
проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **" 30 " января 2020 года**;
окончание работ **" 30 " ноября 2020 года**;
при продолжительности с т р о и т е л ь с т в а ,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;**
фактически, месяц: **11** ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
п о к а з а т е л и (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
в м е с т и м о с т ь , объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и
тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения
соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Существующее здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	1571,5	1571,5
Число этажей	этаж	2+ цок.	

		этаж	2+ цок. этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	4531,00	4531,00
Площадь застройки	$м^2$	691,0	691,0
Основная площадь	$м^2$	958,90	958,90

Надстраиваемое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1025,60	1025,60
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5106,24	5106,24
Основная площадь	$м^2$	908,00	908,00

Общие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2597,10	2597,10
Число этажей	этаж	4+ цок. этаж	4+ цок. этаж

Общий строительный объем	**метр в кубе (далее - м^3)**	**9637,24**	**9637,24**
Площадь застройки	**м^2**	**691,00**	**691,00**
Основная площадь	**м^2**	**1866,90**	**1866,90**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Надстройка этажей выполнена по стенам существующего здания. Стены – кирпич керамический 510 мм. Утеплитель - минеральная плита (IZOTERM п75) 100 мм. Облицовка - кирпич силикатный окрашенный 120мм. Перекрытие – многопустотные железобетонные плиты. Кровля – профлист по деревянному каркасу;**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (**холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение**, газоснабжение, **электроснабжение и связь**)
о б е с п е ч и в а ю т нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты г о р о д с к и м и эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **136 456,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**130 050,6** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6 406,0** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **136 456,6** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **130 050,6** тысяч тенге;
с т о и м о с т ь оборудования, инструмента и инвентаря **6 406,0** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания **В+**;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Надстройка этажей над поликлиникой по адресу переулок Международный 1/1 г. Семей ВКО»

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик : Изатуллаева Н. С. _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

ДАРА КӘСІПКЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗАТУЛЛАЕВА НАСИБА СУЛТАНОВНА 760323402709

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шоранов Е.К. , KZ80VJE00029894 от 24.08.2017 г в части инженерных сетей, KZ53VJE00029895 от 24.08.2017 г в части технического оборудования, KZ26VJE00029896 от 24.08.2017 г в части несущих и ограждающих конструкций**.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «TexAutorVizion» Шоранов Е.К.** _____,
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Шоранов Е.К. , KZ80VJE00029894 от 24.08.2017 г в части инженерных сетей, KZ53VJE00029895 от 24.08.2017 г в части технического оборудования, KZ26VJE00029896 от 24.08.2017 г в части несущих и ограждающих конструкций.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),
подпись, дата _____
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «ПрофСтройПроектМонтаж» , инжинер Каипова А.Е., лицензия № 15019844, 10.11.2015г., БИН 140440030013**.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата _____
Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ПрофСтройПроектМонтаж», Мезенцева М.С.** _____
,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **инжинер Каипова А.Е. лицензия № 15019844, 10.11.2015г**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),
подпись, дата _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КУРЫЛЫС», Аралова Ж.Г.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Существующее здание общие	4+подвал	- -	116	691,00	9637,24	2597,10	-	2597,10	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная железобетонная подушка и фундаментные блоки	Кирпич	Профлист	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей	Не предусмотрено

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-			

6

2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м ^{2})				
4	Жилая площадь (м ^{2})				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м^2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	55	-	--	-	61	2597,10

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:
1. Поэтажные планы _5 листов
2. Экспликация к поэтажным планам 5 листов

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
850	691,00	691,00	-	-	159,00	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе

8

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	2597,10	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитная железобетонная подушка и фундаментные блоки
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич керамический
	2) перегородки		Кирпич силикатный
3	Перекрытия	чердачное	Плита ЖБИ
		междуэтажное	Плита ЖБИ
4	Крыша		Профлист
5	Полы	1-го этажа	бетон
		последующих этажей	бетон

9

6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, окраска
		наружные		Кирпич под расшивку швов
8	Горячее водоснабжение			От городских сетей
9	Водопровод			От городских сетей
10	Канализация			От городских сетей
11	Электроосвещение			От городских сетей
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		от ТЭЦ
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м ^{2})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м ^{3})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем ($м^3$)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	-
Стены и перегородки	-
Крыша	-
Полы	-
Перекрытия	-
Проемы -	

	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

12

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
	-	-	-	-					

Заказчик ИП " Изатуллаева Насиба Султановна "
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ПрофСтройПроектМонтаж» , инжинер Каипова А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

13

Обмерочный план цокольного этажа

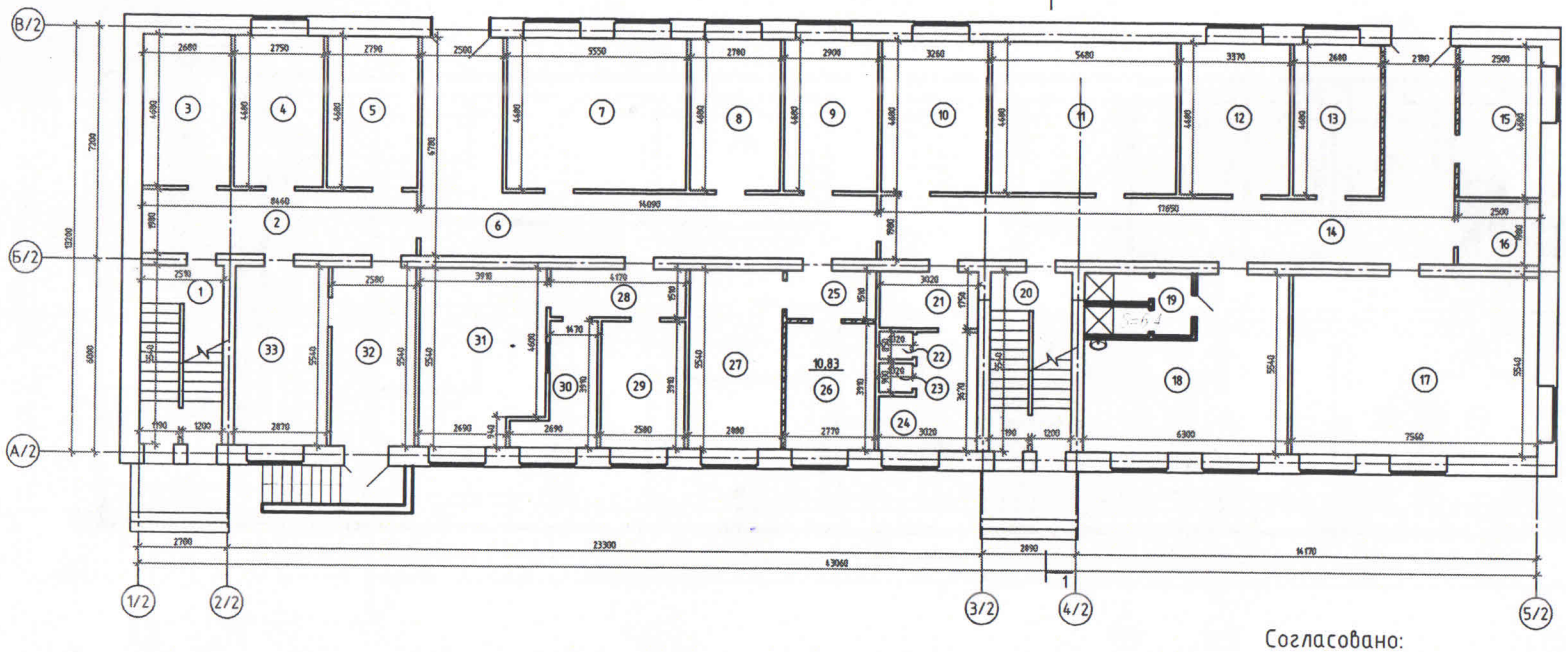

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь м2
1	Лестничная клетка	13,40
2	Коридор	16,90
3	Электрощитовая	12,40
4	Тепловой узел	12,60
5	Комната временного хранения медицинских отходов	12,90
6	Коридор	39,00
7	Вентканера	25,70
8	Мастерская медтехника	12,90
9	Кабинет медтехника	12,80
10	Кабинет врача	12,90
11	Вентканера	30,00
12	Электрощитовая	15,80
13	Комната хранения дез.средств	12,70
14	Коридор	50,00
15	Кабинет врача	11,90
16	Серверная	5,50
17	Комната приема пищи	41,90
18	Бытовое помещение персонала	25,60
19	Душевая	6,40
20	Лестничная клетка	13,40
21	Санузел	5,30
22	Санузел	0,90
23	Санузел	1,00
24	Санузел	7,90
25	Коридор	4,40
26	Кабинет ЭЭГ	11,00
27	Кабинет ЭЭГ	16,20
28	Коридор	6,30
29	Кабинет рентгенолога	10,10
30	Пультовая рентгенкабинета	6,10
31	Рентгенкабинет	20,40
32	Фильтр	14,30
33	Кабинет врача	15,90
	Общая площадь	506,80

Согласовано:

Авторский надзор

Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж" Мезенцева М.С

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК БИН 140440030013 ПрофСтройПроектМонтаж ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, Г. СЕМЕЙ

Обмерочный план 1-го этажа.

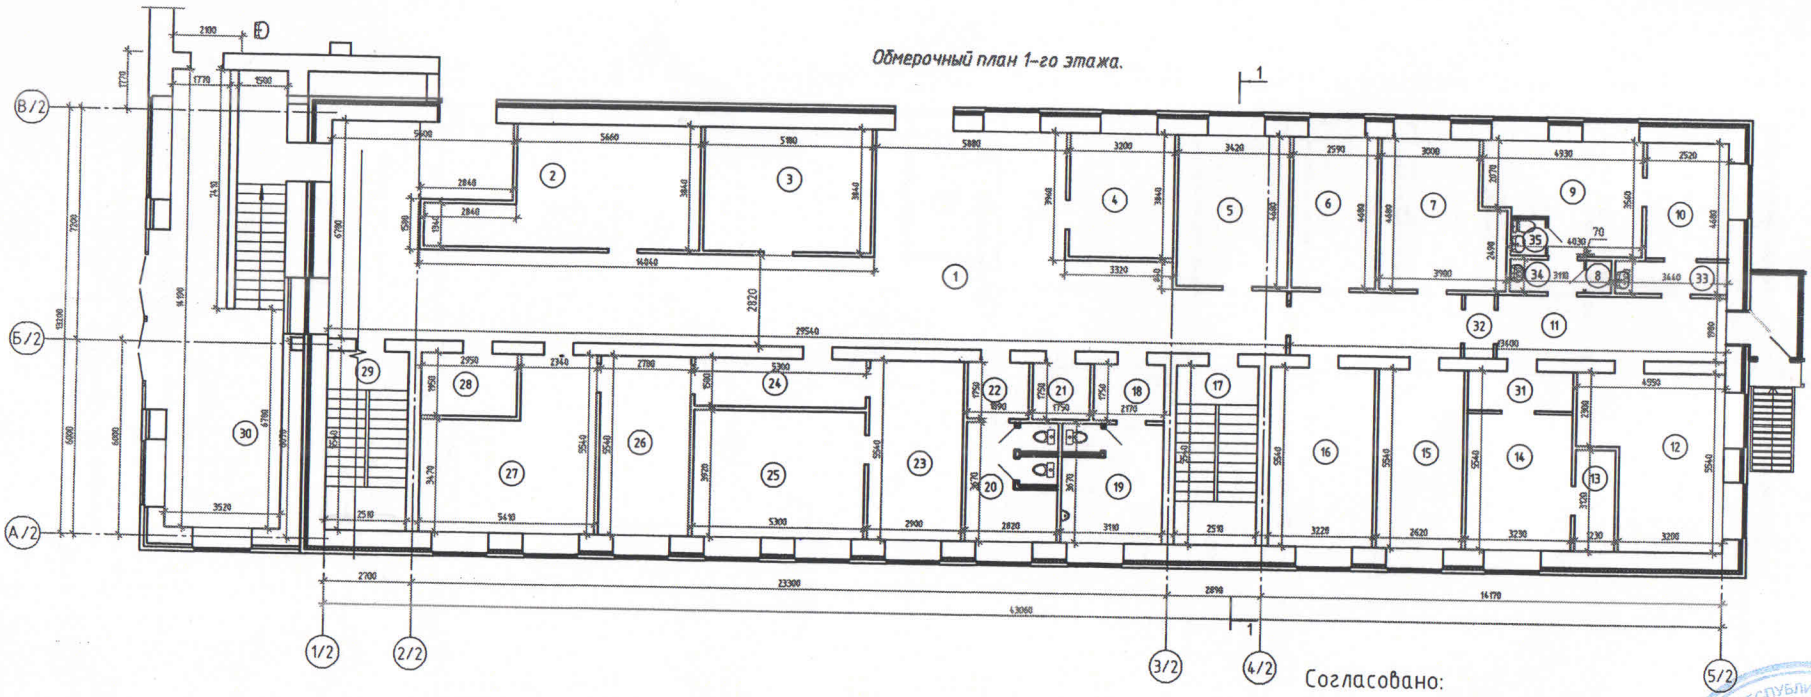

Экспликация помещении

Номер помещения	Наименование	Площадь м2
1	Коридор	120,90
2	Раздевалка	25,10
3	Раздевалка	19,80
4	Кабинет эпидемиолога	12,30
5	КЭК	15,70
6	Цитологическая лаборатория	12,00
7	Общеклиническая лаборатория	16,00
8	ПЦР лаборатория	3,10
9	ПЦР лаборатория	14,60
10	ПЦР лаборатория	9,30
11	Коридор	24,30
12	Биохимическая лаборатория	20,80
13	Помещение хранения реагентов	3,80
14	Иммунологическая лаборатория	14,00
15	Стерилизационная	14,50
16	Моечная	17,80
17	Лестничная клетка	14,00
18	Санузел для посетителей (м)	3,80
19	Санузел для посетителей (м)	10,20
20	Санузел для посетителей (ж)	10,00
21	Спермограмма	2,60
22	Санузел для посетителей (ж)	3,30
23	Кабинет гинеколога	16,00
24	Шлюз	8,00
25	Комната осмотра	20,70
26	Комната патологии шейки матки	15,40
27	Кабинет гинеколога	23,60
28	КУИ	5,80
29	Лестничная клетка	14,00
30	Тамбур	47,90
31	Коридор	3,90
32	Коридор	1,70
33	Коридор	3,40
34	Санузел	1,10
35	Санузел	1,10
	Общая площадь	550,50

Согласовано:

Авторский надзор

Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж" Мезенцева М.С

ЖАУАПКЕРШЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРТІКТЕСІГІ
БИН 140440030013
«ПрофСтройПроектМонтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЕКО.Г.СЕМЕЙ

Обмерочный план 2-го этажа

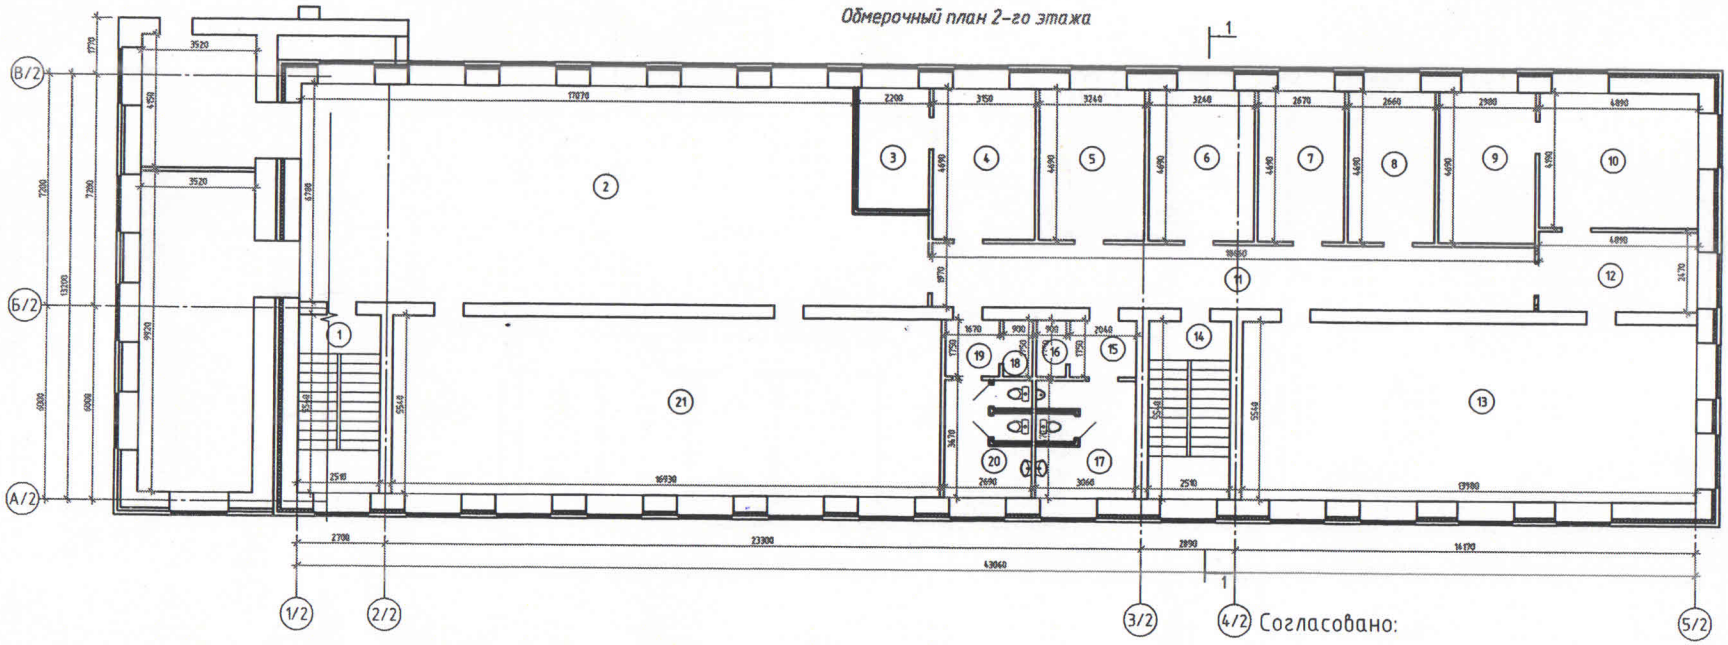

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь м2
1	Лестничная клетка	14,00
2	ЛФК	121,50
3	Парафин	9,80
4	Обертывание	15,20
5	Массаж	15,10
6	Кабинет вакуумной терапии	15,10
7	Кабинет врача	12,40
8	Бухгалтерия	12,40
9	Кабинет врача	13,80
10	Кабинет главного врача	20,20
11	Коридор	48,30
12	Кабинет врача	12,40
13	Конференц зал	78,00
14	Лестничная клетка	14,00
15	Моечная	3,40
16	Санузел	9,90
17	Душевая	1,60
18	Душевая	1,60
19	Моечная	3,10
20	Санузел	9,30
21	ЛФК	95,50
Общая площадь		514,20

Согласовано:

Авторский надзор

Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж" Мезенцева М.С

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШКО СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 140340030013
«ПрофСтройПроектМонтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, Г.СЕМЕЙ

Обмеречный план 3-го этажа

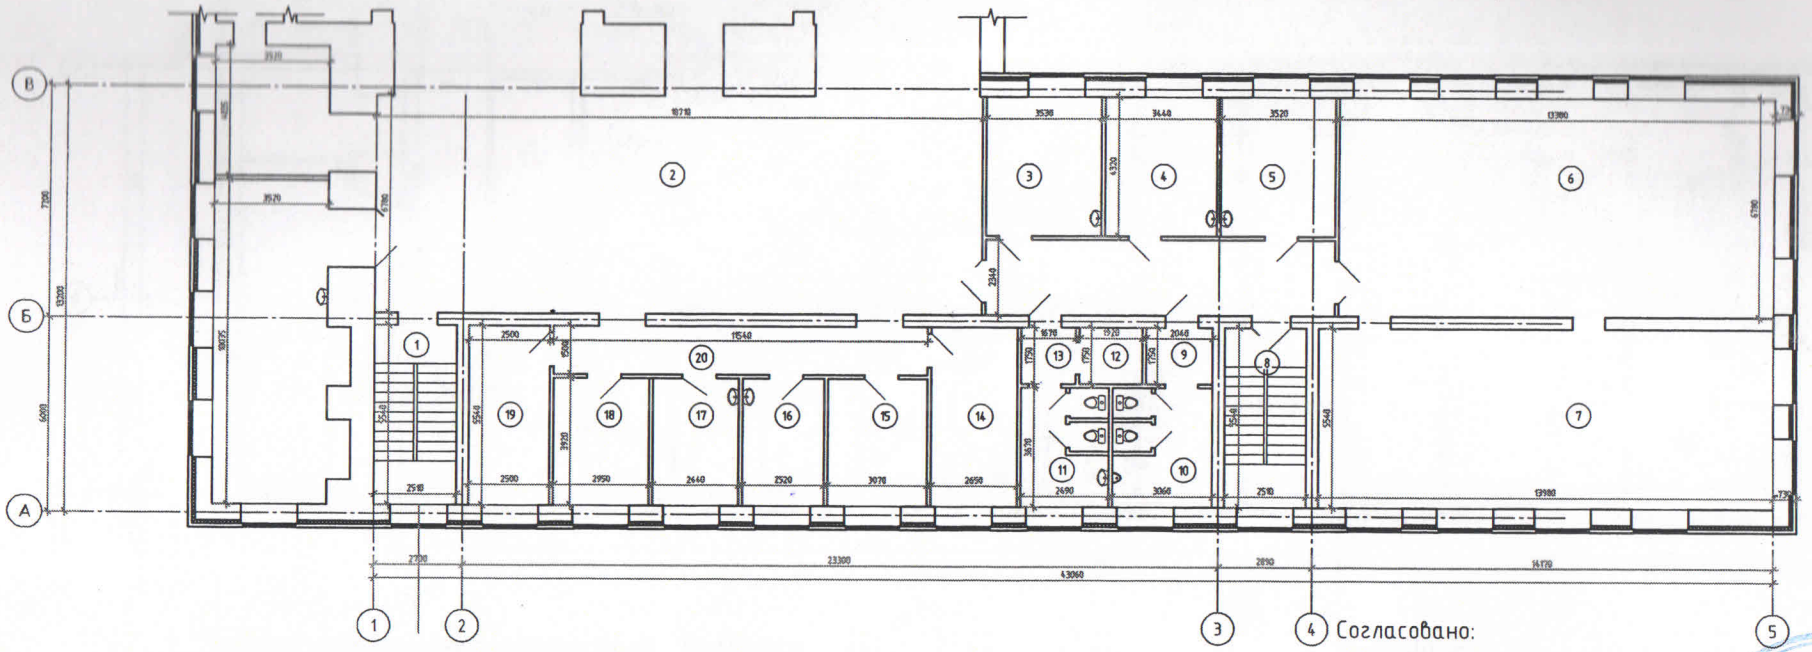

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь м2
1	Лестничная клетка	14,00
2	ЛФК	126,80
3	Кабинет	15,20
4	Кабинет	14,80
5	Кабинет	15,10
6	ЛФК	90,70
7	ЛФК	77,40
8	ЛК	14,00
9	Помещение	3,50
10	Санузел	10,80
11	Санузел	10,80
12	Куи	3,30
13	Помещение	3,50
14	Кабинет	14,60
15	Кабинет	12,00
16	Кабинет	9,80
17	Кабинет	10,30
18	Кабинет	11,50
19	Кабинет	13,80
20	Коридор	17,30
	Общая площадь	541,30

1. Наружные стены надстройки выполнить из кирпича керамического КР-Р-ПО 1НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с утеплителем каменная вата "Технониколь Н80" и облицовкой из силикатного кирпича СОЛПо-М150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М50.
2. Внутренние стены и перегородки надстройки выполнить из кирпича керамического КР-Р-ПО 1НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
3. Разрез 1-1 см.АС- .
4. Фасады см.АС- АС- .
5. Ведомость внутренней отделки помещений см.АС- .
6. Экспликация полов см.АС- .
7. Ведомость проемов и их заполнение см.АС- .

Согласовано:

Авторский надзор

Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж" Мезенцева М.С

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
БИН 140440000013
«Профстройпроектмонтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО Г.СЕМЕЙ

Обмеречный план 4-го этажа

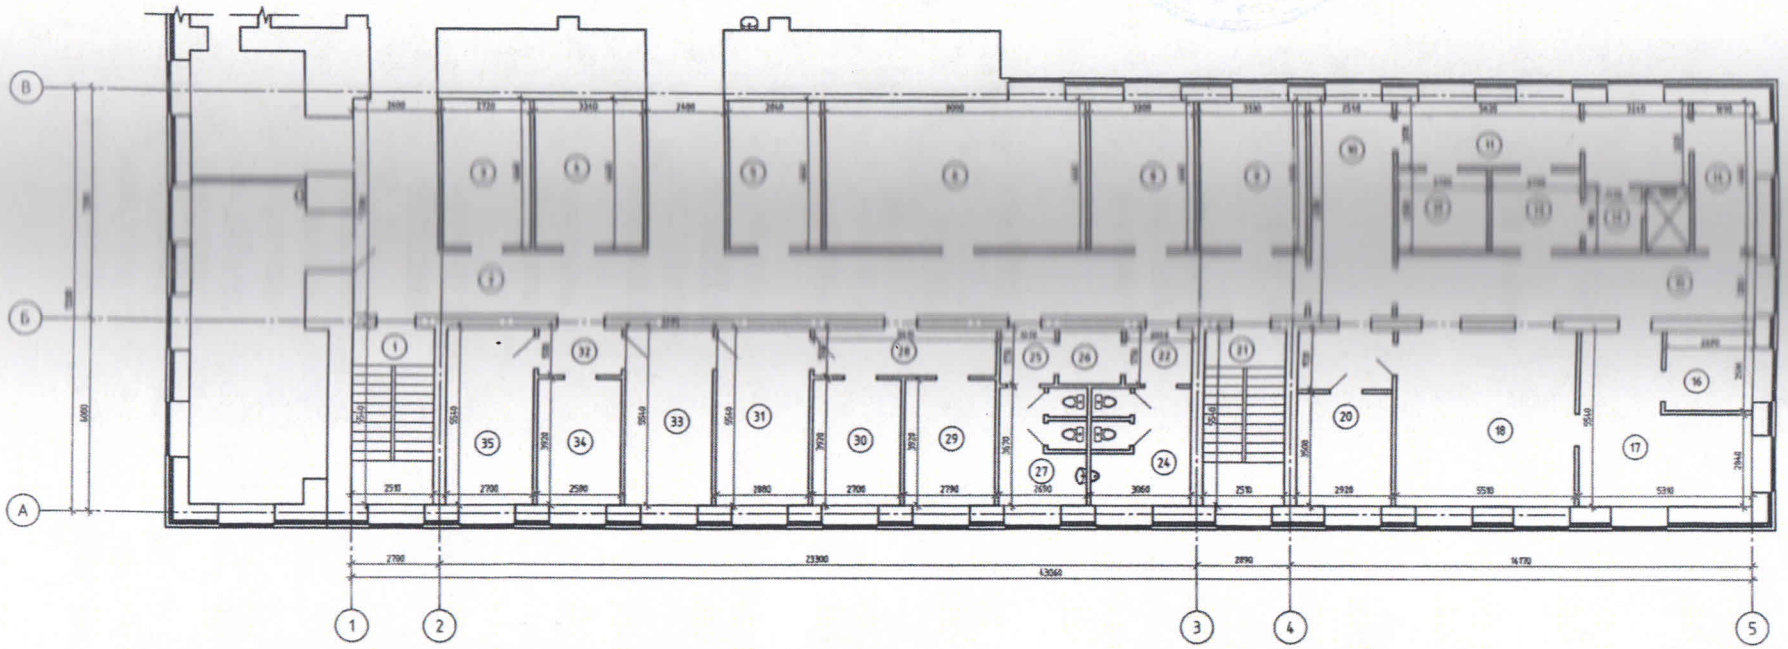

1. Наружные стены надстройки выполнить из кирпича керамического КР-Р-ПО 1НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с утеплителем каменная вата "Технониколь Н80" и облицовкой из силикатного кирпича СОЛПо-М150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М50.
2. Внутренние стены и перегородки надстройки выполнить из кирпича керамического КР-Р-ПО 1НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
3. Разрез 1-1 см.АС- .
4. Фасады см.АС- АС- .
5. Ведомость внутренней отделки помещений см.АС- .
6. Экспликация полов см.АС- .
7. Ведомость проемов и их заполнение см.АС- .

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м2
1	Лестничная клетка	14,00
2	Коридор	100,00
3	Подсобное помещение	12,60
4	Подсобное помещение	12,60
5	Моечная	12,60
6	Комната приема пищи	12,60
7	Подсобное помещение	12,60
8	Кабинет	14,50
9	Кабинет	13,60
10	Коридор	25,10
11	Коридор	15,00
12	Коридор	3,80
13	Коридор	11,10
14	Подсобное помещение	3,80
15	Коридор	10,20
16	Подсобное помещение	2,00
17	Помещение	17,00
18	Кабинет	30,10
19	Кабинет	15,00
20	Кабинет	16,10
21	Лестничная клетка	14,00
22	Моечная	3,60
23	Душевая	1,60
24	Санузел	11,20
25	Моечная	2,90
26	Душевая	1,60
27	Санузел	9,90
28	Коридор	8,40
29	Кабинет	10,90
30	Кабинет	10,60
31	Кабинет	16,00
32	Коридор	8,10
33	Кабинет	14,90
34	Кабинет	10,10
35	Кабинет	10,60
	Общая площадь	503,0

Согласовано:

Авторский надзор
Директор ТОО "ПрофСтройПроектМонтаж"

Мезенцева М.С

Пронумеровано и прошнуровано

78 (восемьдесят 8) страниц

0022/1007409 03.07.2021

05:232:030:1320 09:16

пер. Международный д. 1/1

Даулетова АС

Нурарбеков ЕА
