Подписано через ЕСОРАГУ.KZ (#5p1aecc1-4ac8-b1b1-b8b9-0ee25e3d9e01)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Орман" в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области "под ключ"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**129**	**от 11.08.2023 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г.; №2 от 30.01.2024 г.; №3 от 28.02.2024 г.; №4 от 16.04.2024 г.; №5 от 26.07.2024г.; №6 от 08.08.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**3 030 812 767**	**3 030 812 767**	**2 706 082 827,68**				**324 729 939,32**	**3 030 812 767**
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	**369 635 347**	**369 635 347**	**330 031 559,82**				**39 603 787,18**	**369 635 347**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Заместитель директора (приказ №31/1 от 04.12.2023г.) ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382** **Айтмұқан Ә.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Подписано через ЕСОДУ ГУ2.КЗ (#5Р1ЗЕСС1-АА8-А1Р1-В8В9-0ЕЕ2С3Е3Е0С1)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Орман" в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области "под ключ"

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 34	Архитектурные решения /Включение согласно протоколу №19 от 6 августа 2024 года/	369 635 347
		ИТОГО	**369 635 347**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Заместитель директора (приказ №31/1 от 04.12.2023г.) ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382** **Айтмұқан Ә.Б.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	Подписано: 13.11.2024 10:52
Технический надзор: ИИН 850808351063 - БУТАШЕВ РУСЛАН null	эксперт технического надзора	Подписано: 13.11.2024 11:42
Технический надзор: ИИН 881007300280 - АЙТМҰҚАН ӘДІЛЕТ null	заместитель директора	Подписано: 13.11.2024 13:08
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 13.11.2024 15:01
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	Подписано: 13.11.2024 15:57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2b7aecc7-44c8-46fd-889d-0ee5293d6607)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2b7aecc7-44c8-46fd-889d-0ee5293d6607)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2b7aecc7-44c8-46fd-889d-0ee5293d6607)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне "Орман" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **129 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения /Включение согласно протоколу №19 от 6 августа 2024 года/				
			Раздел: Наружная отделка (АР-13,15,18)				
1	1	6112-0403-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	м2	4720.4	31 728	149 768 851
2	2	212-401-0203РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	39.17932	22 713	889 880
3	3	СТТООРСНБ РК 2022	Кирпич керамический 250х60х65 0,5НФ/175-200 /сливки/	шт.	173056	105	18 324 900
4	4	СТТООРСНБ РК 2022	Кирпич керамический 250х60х65 0,5НФ/175-200 /шоколад/	шт.	56420	92	5 195 154
5	5	СТТООРСНБ РК 2022	Кирпич керамический 250х60х65 0,5НФ/175-200 /морковь/	шт.	11264	69	777 892
6	6	234-101-0203РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 (IZOTERM BENT)	м3	72.972	34 448	2 513 739
7	7	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	52.01229	355 224	18 476 014
8	8	214-201-0103РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	52.01229	615 375	32 007 063
9	9	6103-0701-0807ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	3.4136	2 285 905	7 803 165
10	10	1109-0501-0302РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных /Установка химических анкеров/	болт	624	987	615 888
11	11	217-103-0701СпрСЦ 03.2024	Шпилька анкерная HAS-U, кл. пр. 8.8	кг	624	12 363	7 714 512
12	12	217-103-0202РСНБ РК 2022	Анкер клеевой HIT-RE 500 V4	шт.	624	33 296	20 776 704
			Итого по разделу: Наружная отделка (АР-13,15,18)				**264 863 762**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения /Включение согласно протоколу №19 от 6 августа 2024 года/				**264 863 762**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**264 863 762**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				264863762.000 x 7.30%	19 335 055
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				264863762.000 + 19335055.131	284 198 817
		Сметная прибыль, 5.00%				284198817.131 x 5.00%	14 209 940
		Непредвиденные расходы, 5.000%				284198817.131 x 5.000%	14 209 940
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					312 618 698
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г. , к = 1.0557				312618698.844 x 1.0557	330 031 560
		НДС (12%)				330031560.370 x 12%	39 603 787
		Итого с НДС				330031560.370 + 39603787.244	369 635 347

Лист согласования
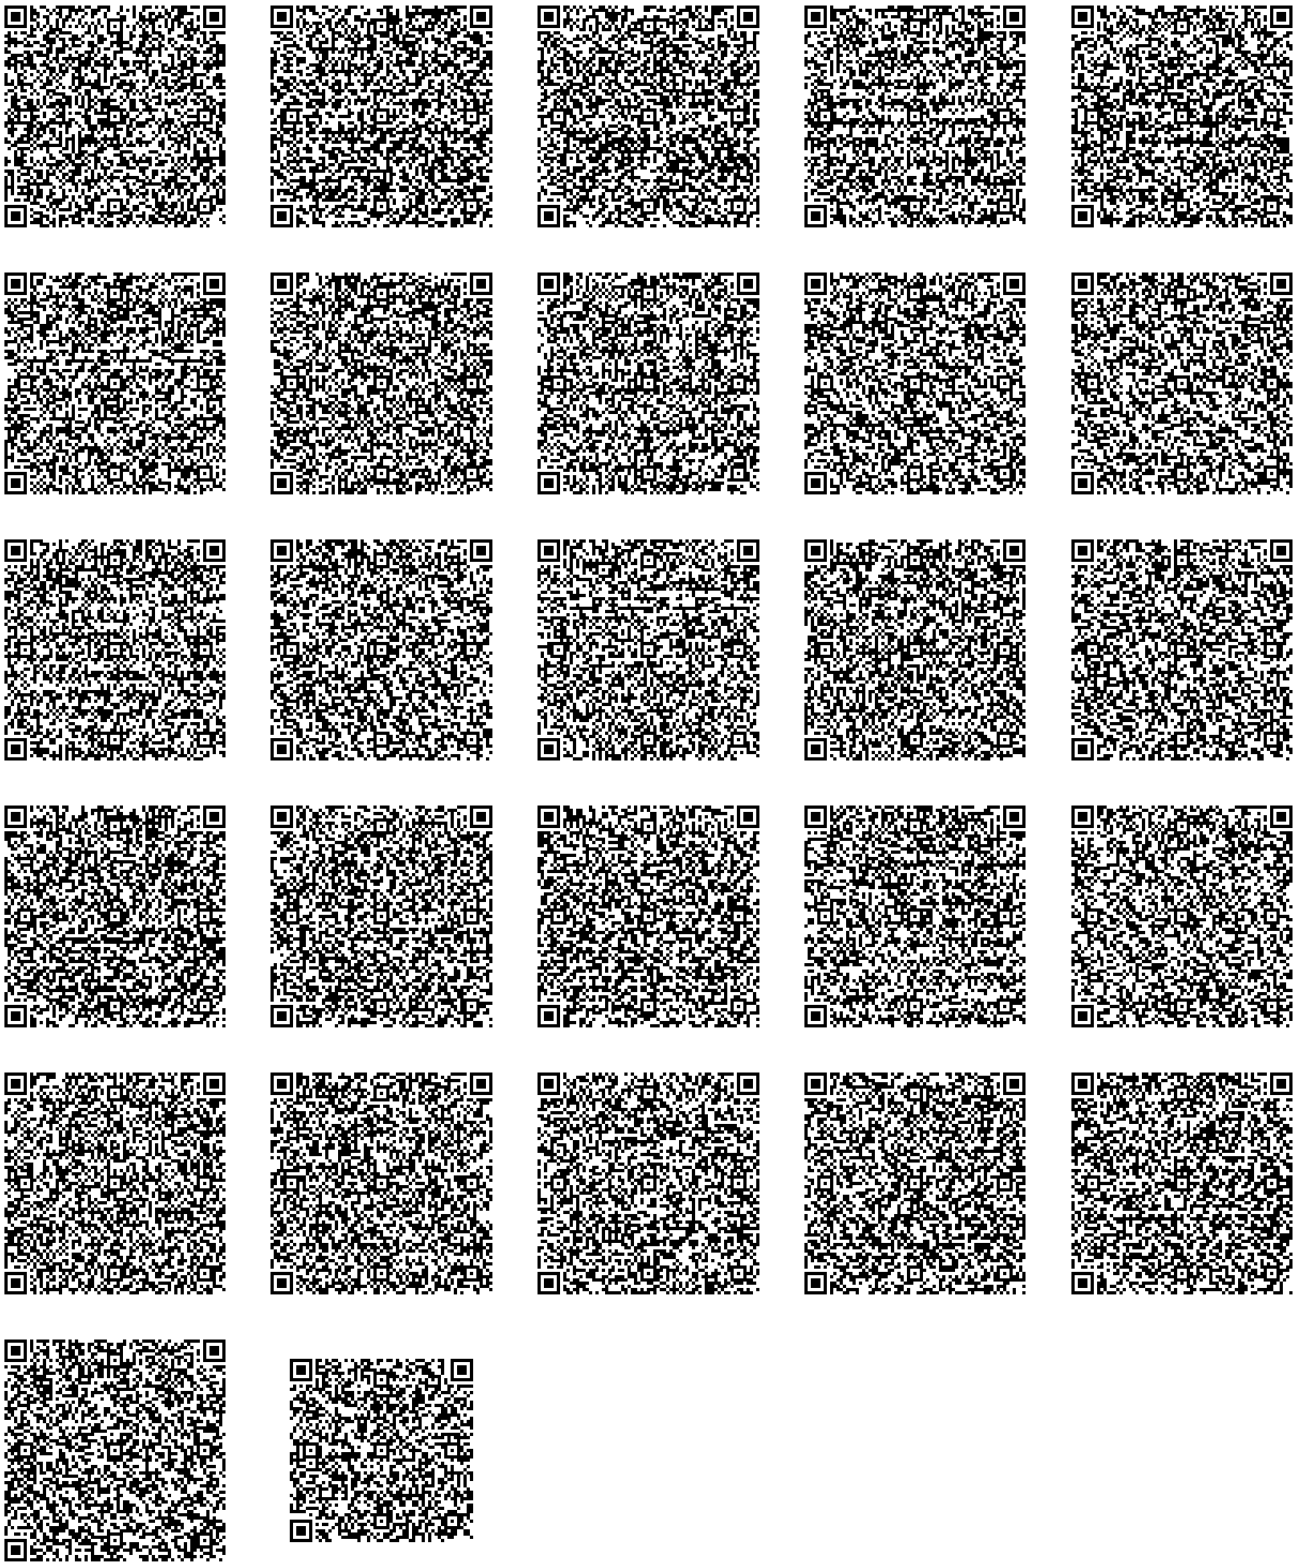
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	12.11.2024 06:00
Представители технического надзора		
850808351063 - БУТАШЕВ РУСЛАН АМАНТАЕВИЧ	эксперт технического надзора	12.11.2024 06:49
Представители авторского надзора		
631130350235 - КОЙЛАНОВ ИБИРАИМ ЭСЕНОВИЧ	Авторский надзор	12.11.2024 06:29
Представители заказчика		
900414350114 - КУЖУМБАЕВ КАНАТ ХАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	12.11.2024 10:14
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:06 Комментарий: Согласно протоколу технического совета от 06.08.2024г. №19
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 14:05 Комментарий: Согласно протоколу технического совета №19 от 06.08.2024 года.
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	13.11.2024 05:18
