Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» июня 2023 года

Заказчик **ИП Кожабергенов Мурат Моканович**, ИИН 790520302482, тел.: +7-702-21-52-22, 130200, Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, дом 1, кв 87

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 26.06.2023г., **ТОО «Аксу»**, директор **Избасов Б.О.**, г. Жанаозен, с.Тенге, ул.М.Бегенова, дом 76, БИН 980740002915, тел: +7-702-421-52-22

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 26.06.2023г., **ТОО «Актан техсервис», Дуйсембаев Н. Е.** №KZ72VJE00069614 от 07.10.2021г., БИН 200140009662 тел: +7-702-421-52-22

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 26.06.2023г., **ТОО «Контракт-А»** в лице директора **Азирбаев С.А.,** лицензия №0000770 от 17.04.2018г., БИН 090140001186, тел: +7-702-421-52-22

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Магазин и офис

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр. Оркен, дом 1, не жилое помещение 87**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации **«26» июня 2023 года**, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 02.09.2022г. Постановление Акимата №426; Акт на право частной собственности на земельный участок №2209261720590151 от 28.09.2022г.; кадастровый номер: 13:201:005:1635

Акт на право временного возмездного землепользования(аренды) на земельный участок №2209261720590143 от 28.09.2022г.; кадастровый номер: 13:201:005:2271 Договор купли-продажи земельного участка №86 от 05.09.2022 г.; Договор об аренде земельного участка №328 от 05.09.2022 г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" **KZ17REA00324640 от 31.03.2022г.**___

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Контракт-А», б/н

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Кожабергенов М. 22.02.2023г._____

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«31» марта 2022 года**;

окончание работ **«26» июня 2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

офис и магазин имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	158,9	158.9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	275	275

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Стены наружные и внутренние выполнить из камня ракушечника, толщиной 390 мм и 190 мм соответственно, марки М35 по ГОСТ 4001-86 на цем.-песч. растворе М50.Фундаменты – монолитные и блок бетонные. Перекрытия, покрытия – плиты;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ___ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания D;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Магазин и офис по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр. Оркен, дом 1, не живое помещение 87»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Кожабергенов Мурат Моканович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Актан техсервис» Сарсенбаев М.О.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Дуйсембаев Н. в части несущих и ограждающих конструкции

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик **проекта Азирбаев С.А. директор ТОО «Контракт-А»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Избасов Б.О.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные,торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магазин и офис	2	-	7	41,7	275	158,9				-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточные-бетонные	Камень ракушечник	Металлочерепица	Автономное	централизованное	Централизованное	Автономное	Септик	централизованное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
	5				

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	5

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-		-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
360	158,9	158,9	-	-	-	201,1

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1-этаж							
Торговый зал	1	1	-	70,0	-	-	70,0
Лестничная клеть	1	2	-	3,3	-	-	3,3
коридор	1	3	-	4,2	-	-	4,2
шкаф	1	4	-	0,7	-	-	0,7
санузел	1	5	-	2,9	-	-	2,9
2-этаж							
Торговый зал	1	1	-	70,0	-	-	70,0
шкаф	1	2	-	0,7	-	-	0,7
коридор	1	3	-	4,2	-	-	4,2
санузел	1	4	-	2,9	-	-	2,9

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Бетонно-ленточный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Камень-ракушечник
	2) перегородки		Камень-ракушечник
3	Перекрытия	чердачное	Плиты перекрытия
		междуэтажное	-
4	Крыша		Металлочерепица
5	Полы	1-го этажа	кафель
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	Металлопластиковые
		двери	Деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, побелка, кафель
		наружные	Штукатурка, побелка
8	Горячее водоснабжение		автономное
9	Водопровод		централизованное
10	Канализация		автономное
11	Электроосвещение		централизованное
12	Отопление	печное	-
13		печное газовое	-
14		от ТЭЦ	-
15		от АГВ	-

16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	централизованное
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	-
	-	-
Отделочные работы	-	-
	-	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-

-

Перекрытия		-
Проемы	-	-
	-	-
Отделочные работы	-	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик **Кожабергенов Мурат Моканович.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Азирбаев С.А. директор ТОО «Контракт-А»**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

План благоустройства
М 1:250

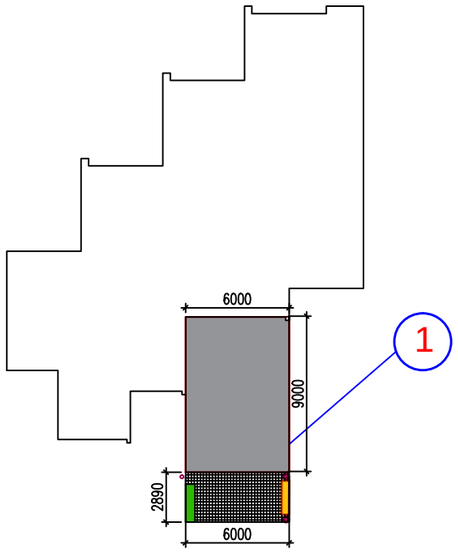

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Плот-ть %	Примечание
1	Площадь территории	м2	87.0		
2	Площадь застройки	м2	41.7		
3	Площадь проездов и площадок	м2	17.34		
4	Озеленение	м2	12.0		

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
1	Реконструкция магазина и офиса по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, нежилое помещение 87	

Конструкция тротуара и площадки из брусчаток

М 1:25



Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Условное изображение	Наименование	Длина, м	Ширина м	Площадь покрытия м2	Бордюр из бортового камня	
					Тип	Кол.,шт
	Тротуары и площадки из брусчатка			17.34	БР100.20.8. по ГОСТ6665-91	110
	Газоны			12.0		
	Деревья			3 шт.		

Ведомость переносного оборудования.

Условное изображение	Наименование	Кол., шт.	Обозначение типового проекта
	Скамейка	1	
	Урна для мусора.	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разработал		Жайлау М			
ГИП		Жайлау М			

ГП

«Реконструкция магазина и офиса по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, нежилое помещение 87 ».

Архитектурно-строительное решение

Стадия	Лист	Листов
РП	3	3

План благоустройства
масштаб 1:250

ТОО "Контракт-А"

План 1-го этажа на отм.±0,000

М 1:100

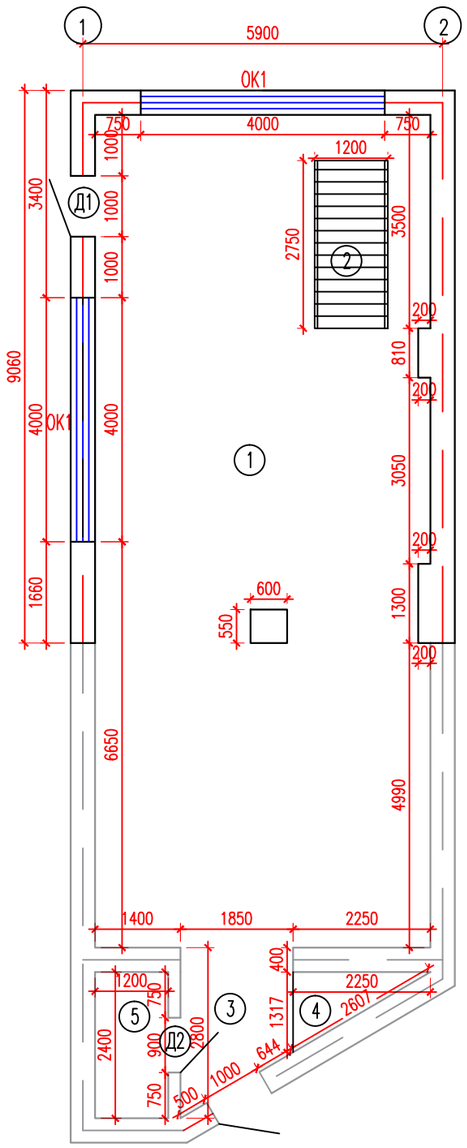

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

N-помещений	Наименование помещений	Площадь м2	Примечание
1	Торговый зал	70.0	
2	Лестничная клеть	3.3	
3	Коридор	4.2	
4	Шкаф	0.7	
5	Санузел	2.9	
	Всего:	81.1	

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

N-помещений	Наименование помещений	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок			Примечание
		Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Высота в мм	
1	Торговый зал	70.0	водоэмульсионная окраска	95.21	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
2	Лестничная клеть	3.3	водоэмульсионная окраска	25.28	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
3	Коридор	4.2	водоэмульсионная окраска	11.37	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
4	Шкаф	0.7	водоэмульсионная окраска	4.85	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
5	Санузел	2.9	водоэмульсионная окраска	21.15	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
	Всего:	81.1		157.86					

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примеч.
Д1	Металлопластиковая дверь	Дверь ДН 21-10	3	Дверь индив. изготовления
Д2	Металлопластиковая дверь	Дверь ДН 21-9	3	Дверь индив. изготовления
		Окна		
ОК1	Металлопластиковый профиль	Оконный блок ОС 4000х2400	3	Окно индив. изготовления
ОК2	Металлопластиковый профиль	Оконный блок ОС 2000х1400	2	Окно индив. изготовления

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N-док.	Подпись	Дата
ГИП					
Разработал					

01/14-АС

«Реконструкция магазина и офиса по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, нежилое помещение 87 ».

Архитектурно-строительное решение

Стад.	Лист	Листов
РП	2	11

План 1-го этажа на отм.±0,000.

ТОО "Контракт-А"

План 2-го этажа на отм.±0,000

М 1:100

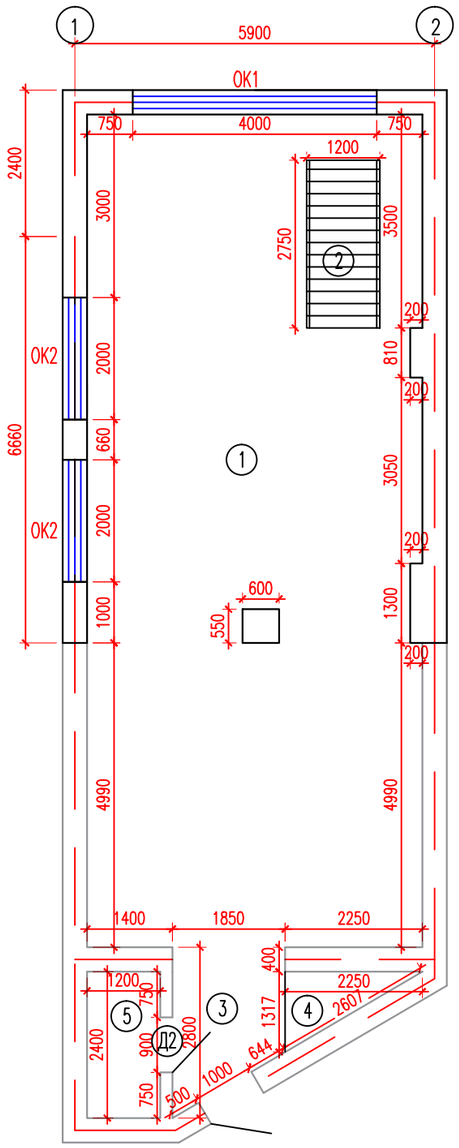

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА

N-помещений	Наименование помещений	Площадь м2	Примечание
1	Торговый зал	70.0	
2	Лестничная клеть	3.3	
3	Коридор	4.2	
4	Шкаф	0.7	
5	Санузел	2.9	
	Всего:	81.1	

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

N-помещений	Наименование помещений	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок			Примечание
		Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Высота в мм	
1	Торговый зал	70.0	водоэмульсионная окраска	99.21	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
2	Лестничная клеть	3.3	водоэмульсионная окраска	25.28	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
3	Коридор	4.2	водоэмульсионная окраска	11.37	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
4	Шкаф	0.7	водоэмульсионная окраска	4.85	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
5	Санузел	2.9	водоэмульсионная окраска	21.15	водоэмульсионная окраска по улуч. штукатурке	–	–	–	
	Всего:	81.1		161.86					

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примеч.
Д1	Металлопластиковая дверь	Дверь ДН 21-10	3	Дверь индив. изготовления
Д2	Металлопластиковая дверь	Дверь ДН 21-9	3	Дверь индив. изготовления
	Окна			
ОК1	Металлопластиковый профиль	Оконный блок ОС 40-20	3	Окно индив. изготовления
ОК2	Металлопластиковый профиль	Оконный блок ОС 14-14	2	Окно индив. изготовления

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N-док.	Подпись	Дата
ГИП					
Разработал					

01/14-АС

«Реконструкция магазина и офиса по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, нежилое помещение 87 ».

Архитектурно-строительное решение

Стад.	Лист	Листов
РП	3	11

План 2-го этажа на отм.±0,000.

ТОО "Контракт-А"
