Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Подземная строительная часть здания				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Гидроизоляция фундаментов (КЖ1.4)				
1	45	6111-0501-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	м2	8306.82	1 967	16 339 515
2	46	6111-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	1193.15	5 099	6 083 872
3	47	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2744.245	435	1 193 747
4	48	6111-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	1193.15	2 140	2 553 341
5	49	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	36.98765	25 241	933 605
			Итого по подразделу: Гидроизоляция фундаментов (КЖ1.4)				**27 104 080**
			Итого по разделу: Фундаменты				**27 104 080**
			Итого по локальной смете: Подземная строительная часть здания				**27 104 080**
			ИТОГО по акту:				**27 104 080**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				27104080.000 x 7.30%	1 978 597
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				27104080.000 + 1978597.892	29 082 677
		Сметная прибыль, 5.00%				29082677.892 x 5.00%	1 454 133
		Непредвиденные расходы, 5.000%				29082677.892 x 5.000%	1 454 133
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					31 990 945
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				31990945.681 x 1.0368	33 168 212
		НДС (12%)				33168212.482 x 12%	3 980 185
		Итого с НДС				33168212.482 + 3980185.498	37 148 397

Лист согласования
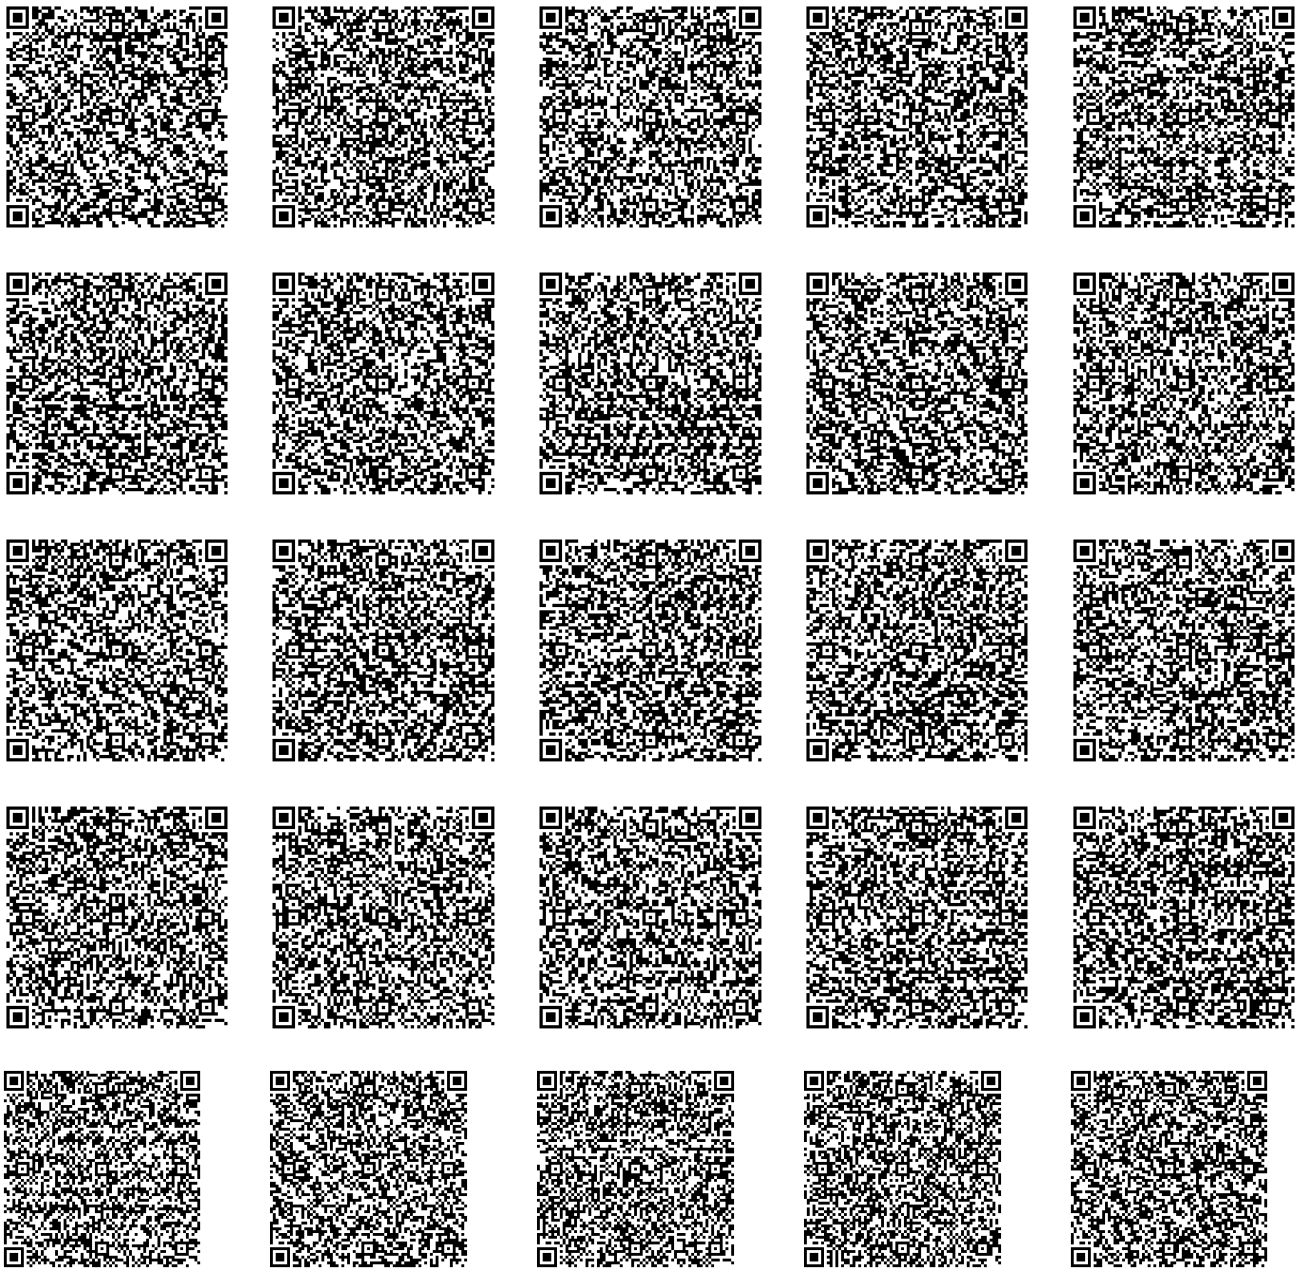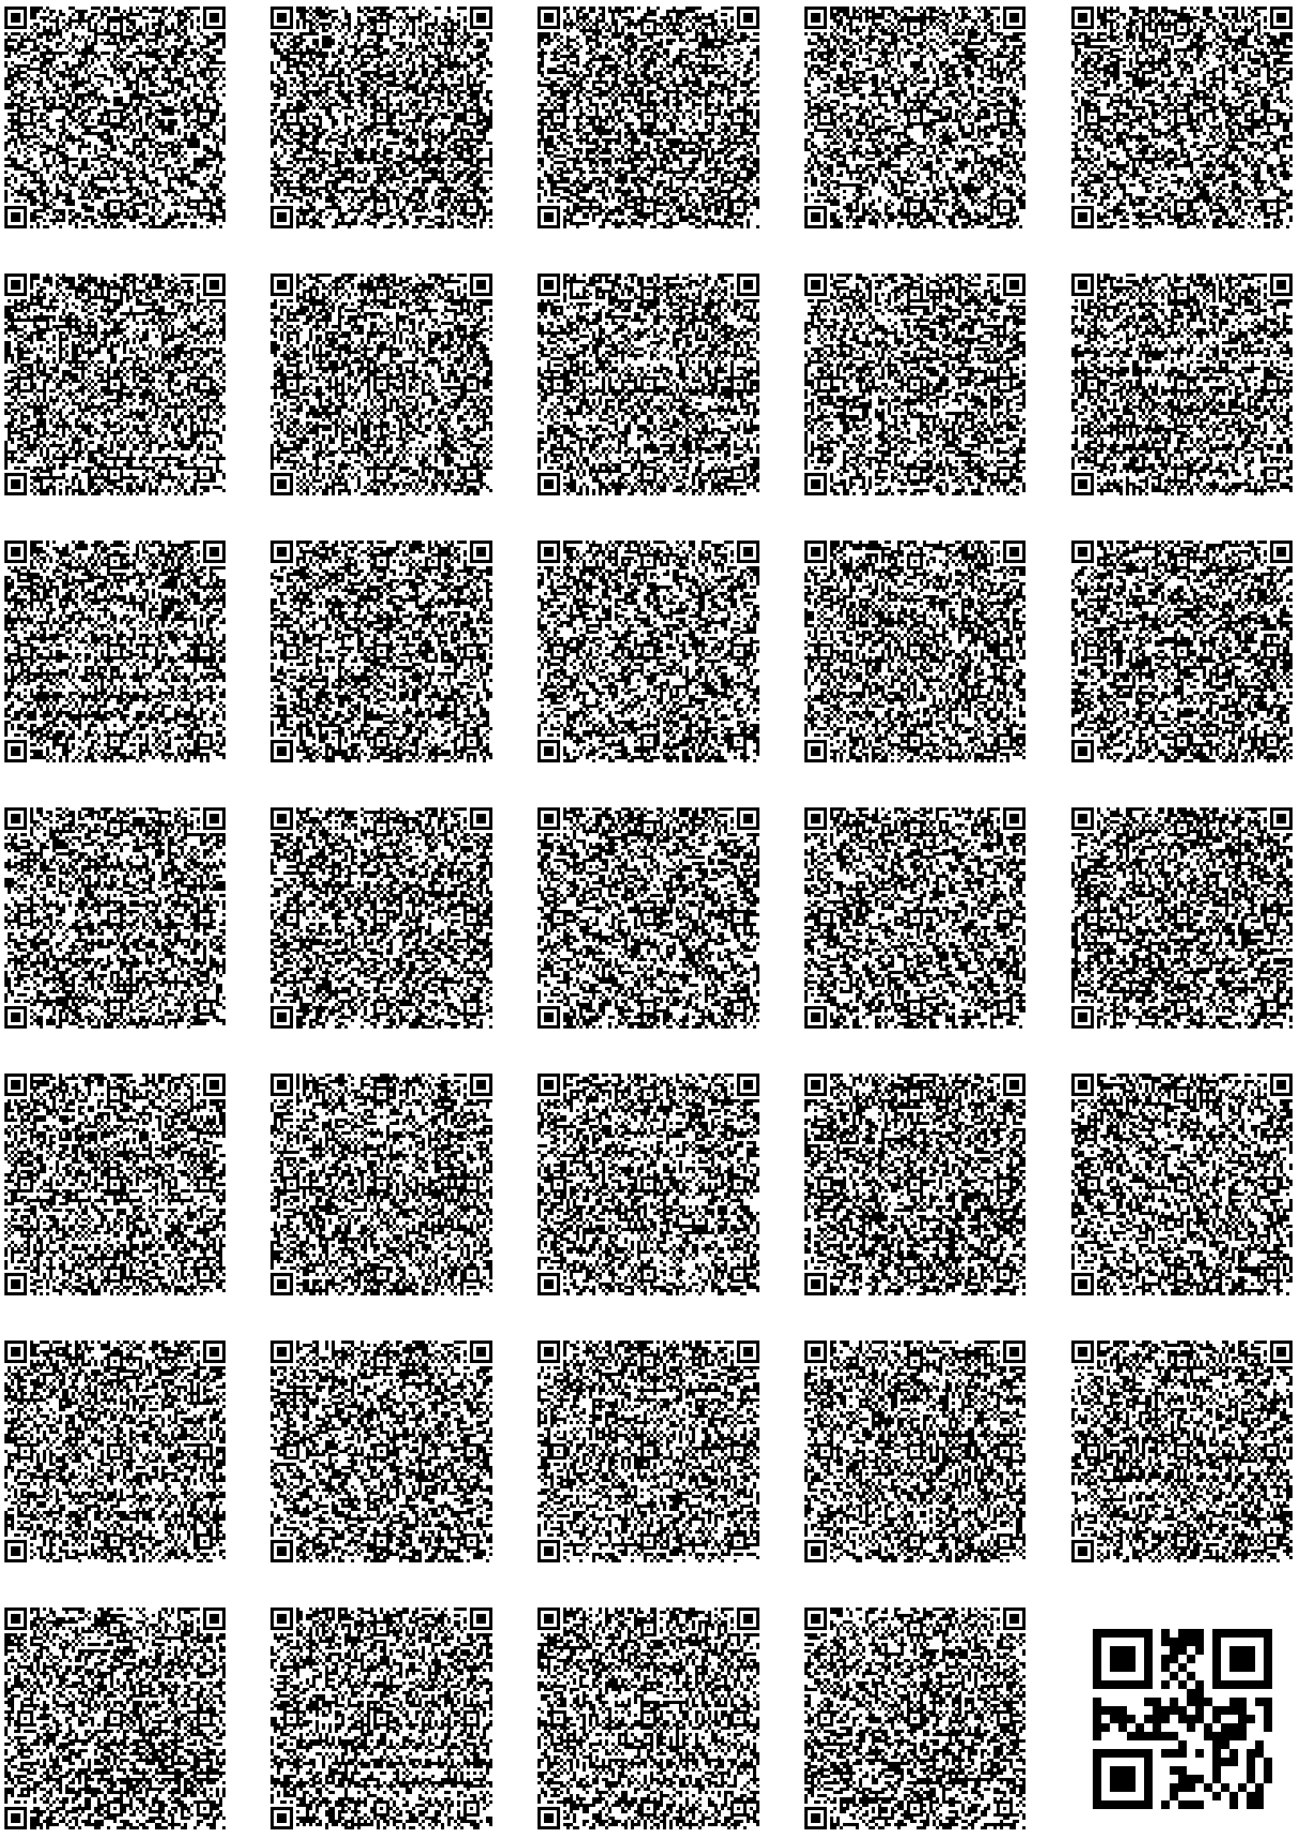
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	13.11.2024 06:33
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	13.11.2024 09:09
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	13.11.2024 07:57
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	18.11.2024 11:29
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	13.11.2024 12:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.11.2024 08:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	15.11.2024 10:02
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	15.11.2024 11:47
