Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **011240001633 - КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **031240001439 - ТОО "Alem Qurylys AQ"**

Стройка: **Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: пр. Гагарина, Бостандыкский район, г. Алматы**

Договор подряда (контракт) №: **8 от 13.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета: общестроительные работы - КЖ, Блок 2					
			Раздел: Каркас					
			Подраздел: Площадь опалубки дана на все колонны					
1	8	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	165.09	3 821	630 809	
2	9	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	165.09	1 780	293 860	
			Итого по подразделу: Площадь опалубки дана на все колонны				**924 669**	
			Подраздел: Колонна КМ-1 /8 шт/ (л.9,47)					
3	10	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	3.7981	89 284	339 109	
4	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1557	301 988	349 007	Казахстан
5	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.6424	277 519	733 316	Казахстан
6	13	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6.6	18 803	124 100	
7	14	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.699	21 990	147 311	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-1 /8 шт/ (л.9,47)				**1 692 844**	
			Подраздел: Колонна КМ-1.1 /4 шт/ (л.9,48)					
8	15	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1.8991	89 284	169 559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	16	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5779	301 988	174 519	Казахстан
10	17	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3212	277 519	366 658	Казахстан
11	18	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3.3	18 803	62 050	
12	19	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.349	21 990	73 644	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-1.1 /4 шт/ (л.9,48)				**846 431**	
			Подраздел: Колонна КМ-1.2 /5 шт/ (л.9,49)					
13	20	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	2.5687	89 284	229 344	
14	21	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7222	301 988	218 096	Казахстан
15	22	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.8465	277 519	512 439	Казахстан
16	23	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.125	18 803	77 562	
17	24	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.1869	21 990	92 070	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-1.2 /5 шт/ (л.9,49)				**1 129 511**	
			Подраздел: Колонна КМ-2 /2 шт/ (л.9,50)					
18	25	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.9795	85 685	83 928	
19	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3185	301 988	96 183	Казахстан
20	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.661	277 519	183 440	Казахстан
21	28	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.98	18 803	37 230	
22	29	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.0097	21 990	44 193	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-2 /2 шт/ (л.9,50)				**444 975**	
			Подраздел: Колонна КМ-2.1 /2 шт/ (л.9,51)					
23	30	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	1.1223	85 685	96 165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	31	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3186	301 988	96 214	Казахстан
25	32	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8036	277 519	223 014	Казахстан
26	33	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.98	18 803	37 230	
27	34	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.0097	21 990	44 193	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-2.1 /2 шт/ (л.9,51)				**496 815**	
			Подраздел: Колонна КМ-3 /2 шт/ (л.9,52)					
28	35	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1.1604	89 284	103 605	
29	36	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3481	301 988	105 122	Казахстан
30	37	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8125	277 519	225 484	Казахстан
31	38	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.65	18 803	31 025	
32	39	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.6746	21 990	36 824	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-3 /2 шт/ (л.9,52)				**502 061**	
			Подраздел: Колонна КМ-4 /2 шт/ (л.9,53)					
33	40	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	1.1607	85 685	99 455	
34	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3481	301 988	105 122	Казахстан
35	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8126	277 519	225 512	Казахстан
36	43	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.98	18 803	37 230	
37	44	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.0097	21 990	44 193	Казахстан
			Итого по подразделу: Колонна КМ-4 /2 шт/ (л.9,53)				**511 512**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-1 /8 шт/ (л.19,20)					
38	45	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	10.8	87 975	950 130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	46	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.962	21 990	241 054	Казахстан
40	47	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.0696	301 988	323 006	Казахстан
41	48	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.766	277 519	767 617	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-1 /8 шт/ (л.19,20)				**2 281 808**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-2 /4 шт/ (л.19,21)					
42	49	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	3.2	87 975	281 520	
43	50	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.248	21 990	71 423	Казахстан
44	51	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3612	301 988	109 078	Казахстан
45	52	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1908	277 519	330 469	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-2 /4 шт/ (л.19,21)				**792 491**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-3 /4 шт/ (л.19,22)					
46	53	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	1.76	87 975	154 836	
47	54	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7864	21 990	39 283	Казахстан
48	55	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1648	301 988	49 767	Казахстан
49	56	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.55	277 519	152 635	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-3 /4 шт/ (л.19,22)				**396 522**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-4 /4 шт/ (л.19,23)					
50	57	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	3.6	87 975	316 710	
51	58	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.654	21 990	80 351	Казахстан
52	59	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3618	301 988	109 259	Казахстан
53	60	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9632	277 519	267 306	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-4 /4 шт/ (л.19,23)				**773 627**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-5 /4 шт/ (л.19,24)					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	61	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	5	87 975	439 875	
55	62	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.075	21 990	111 599	Казахстан
56	63	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5046	301 988	152 383	Казахстан
57	64	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.6012	277 519	444 364	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-5 /4 шт/ (л.19,24)				**1 148 220**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-6 /4 шт/ (л.19,25)					
58	65	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	1.32	87 975	116 127	
59	66	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.3398	21 990	29 462	Казахстан
60	67	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1426	301 988	43 063	Казахстан
61	68	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4336	277 519	120 332	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-6 /4 шт/ (л.19,25)				**308 984**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-7 /4 шт/ (л.19,26)					
62	69	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	6.8	87 975	598 230	
63	70	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.902	21 990	151 775	Казахстан
64	71	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6964	301 988	210 304	Казахстан
65	72	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.9262	277 519	534 557	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-7 /4 шт/ (л.19,26)				**1 494 866**	
			Подраздел: Монолитная балка БМ-8 /3 шт/ (л.19,27)					
66	73	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	8.2	87 975	721 395	
67	74	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.323	21 990	183 023	Казахстан
68	75	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.82	301 988	247 630	Казахстан
69	76	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.37	277 519	657 720	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-8 /3 шт/ (л.19,27)				**1 809 768**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел: Монолитная балка БМ-9 /3 шт/ (л.19,28)					
70	77	6103-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 800 мм	м3	3.4	87 975	299 115	
71	78	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.451	21 990	75 887	Казахстан
72	79	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3472	301 988	104 850	Казахстан
73	80	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9632	277 519	267 306	Казахстан
			Итого по подразделу: Монолитная балка БМ-9 /3 шт/ (л.19,28)				**747 159**	
			Итого по разделу: Каркас				**16 302 265**	
			Раздел: Стены					
			Подраздел: Площадь опалубки дана на все стены					
74	89	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	142.035	4 374	621 261	
75	90	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	142.035	1 799	255 521	
			Итого по подразделу: Площадь опалубки дана на все стены				**876 782**	
			Подраздел: Стена монолитная См-1 (л.55)					
76	91	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.4898	139 931	208 469	
77	92	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.135	301 988	40 768	Казахстан
78	93	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3548	277 519	375 983	Казахстан
79	94	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	4.751	22 878	108 693	
80	95	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.822	21 990	106 036	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-1 (л.55)				**839 949**	
			Подраздел: Стена монолитная См-2 (л.57)					
81	96	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2.0081	139 931	280 995	
82	97	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1413	301 988	42 671	Казахстан
83	98	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.8668	277 519	518 072	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	99	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	4.751	22 878	108 693	
85	100	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.822	21 990	106 036	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-2 (л.57)				**1 056 468**	
			Подраздел: Стена монолитная См-3 (л.58)					
86	101	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.699	139 931	237 743	
87	102	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1293	301 988	39 047	Казахстан
88	103	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5697	277 519	435 621	Казахстан
89	104	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	5.55	22 878	126 973	
90	105	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.633	21 990	123 870	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-3 (л.58)				**963 254**	
			Подраздел: Стена монолитная См-4 (л.59)					
91	106	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.3192	139 931	184 597	
92	107	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1293	301 988	39 047	Казахстан
93	108	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1898	277 519	330 192	Казахстан
94	109	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	5.55	22 878	126 973	
95	110	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.633	21 990	123 870	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-4 (л.59)				**804 679**	
			Подраздел: Стена монолитная См-5 (л.60)					
96	111	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.271	139 931	177 853	
97	112	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1293	301 988	39 047	Казахстан
98	113	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1416	277 519	316 815	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	114	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	5.55	22 878	126 973	
100	115	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.633	21 990	123 870	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-5 (л.60)				**784 558**	
			Подраздел: Стена монолитная См-6 (л.61)					
101	116	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.2999	139 931	181 896	
102	117	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1293	301 988	39 047	Казахстан
103	118	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1706	277 519	324 864	Казахстан
104	119	6103-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м3	5.55	22 878	126 973	
105	120	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.633	21 990	123 870	Казахстан
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-6 (л.61)				**796 650**	
			Итого по разделу: Стены				**6 122 340**	
			Раздел: Перекрытия					
			Подраздел: Площадь опалубки дана на все перекрытия					
106	137	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	749.9	5 791	4 342 671	
107	138	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	749.9	3 232	2 423 677	
			Итого по подразделу: Площадь опалубки дана на все перекрытия				**6 766 347**	
			Подраздел: Плита перекрытия на отм. +3,800 (л.38)					
108	144	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.2983	113 191	939 293	
109	145	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5204	301 988	157 155	Казахстан
110	146	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.7779	277 519	2 158 515	Казахстан
111	147	6103-0501-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м	м3	73.5	4 433	325 826	
112	148	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74.6025	21 990	1 640 509	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу: Плита перекрытия на отм. +3,800 (л.38)				**5 221 298**	
			Подраздел: Плита перекрытия на отм. +7,700 (л.42)					
113	149	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.2745	113 191	936 599	
114	150	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5204	301 988	157 155	Казахстан
115	151	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.7541	277 519	2 151 910	Казахстан
116	152	6103-0501-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м	м3	73.5	4 433	325 826	
117	153	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74.6025	21 990	1 640 509	Казахстан
			Итого по подразделу: Плита перекрытия на отм. +7,700 (л.42)				**5 211 999**	
			Итого по разделу: Перекрытия				**17 199 644**	
			Итого по локальной смете: общестроительные работы - КЖ, Блок 2				**39 624 249**	
			ИТОГО по акту:				**39 624 249**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.600%)			39624248.882 x 6.60%	2 615 200	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			39624248.882 + 2615200.388	42 239 449	
			Сметная прибыль, (5.00%)			42239449.271 x 5.00%	2 111 972	
			Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)			42239449.271 x 5.000%	2 111 972	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				46 463 394	
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2025 год 2 квартал, к = 1.0388			46463394.198 x 1.0388	48 266 174	
			НДС (12%)			48266173.893 x 12%	5 791 941	
			Итого с НДС			48266173.893 + 5791940.867	54 058 115	

Лист согласования
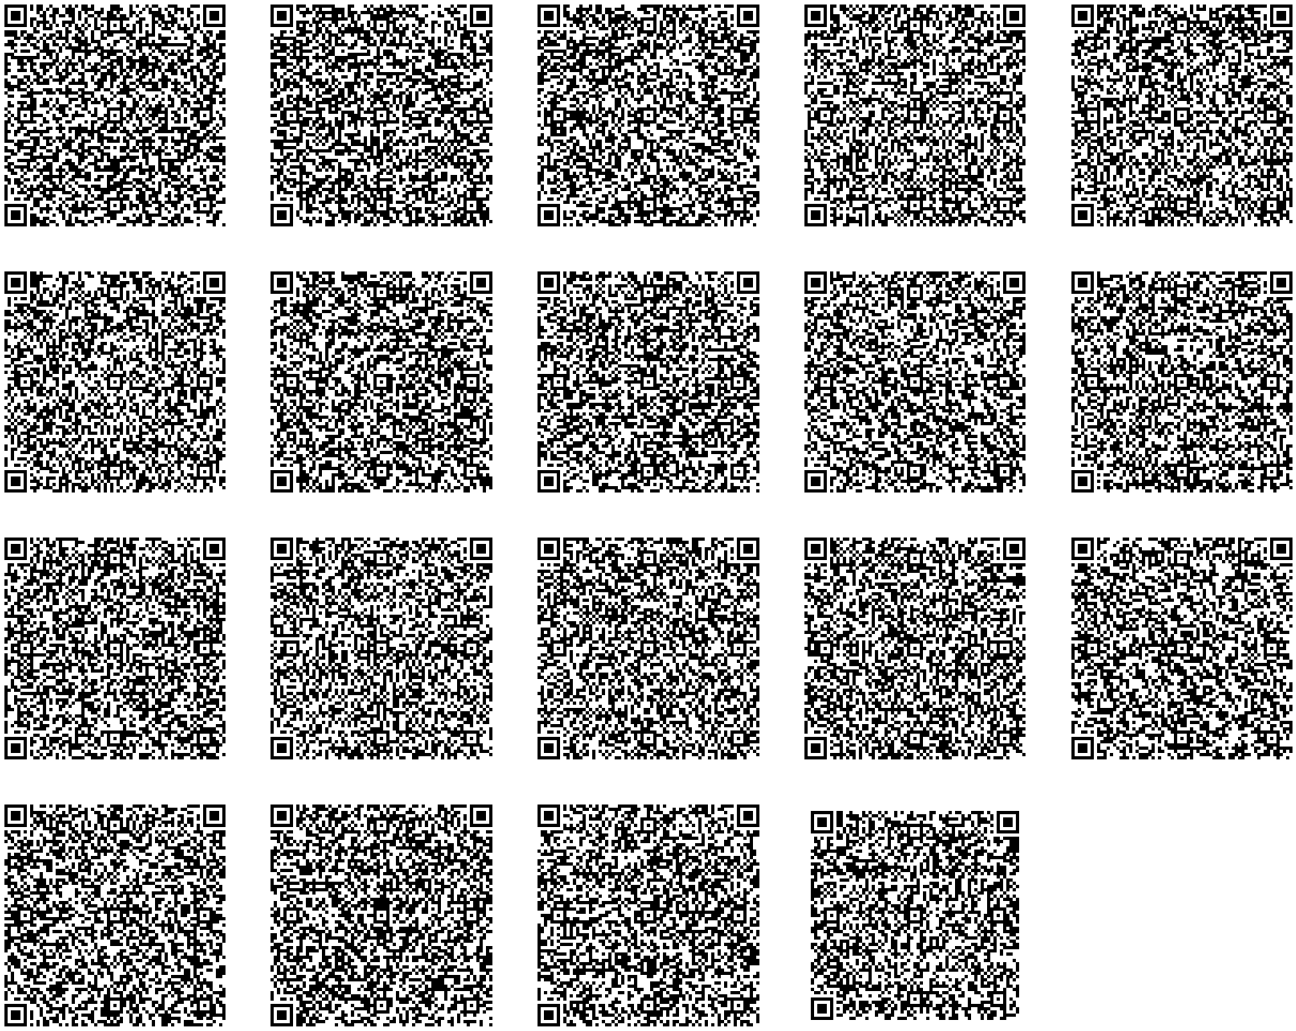
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
921220300131 - ӘЛИХАН НҰРЖАН НҰРЛАНҰЛЫ	Руководитель проекта	24.07.2025 08:45
Представители технического надзора		
890412302713 - АСАНБАЕВ МЕЙРБЕК ОРАЗАЛИЕВИЧ	Эксперт Технического Надзора	24.07.2025 17:36
950316301698 - МАҚСҰТ МҰХАММЕДӘЛИ ТАЛҒАТҰЛЫ	Сметчик	25.07.2025 11:40
Представители авторского надзора		
880802302305 - БЕДЕБАЕВ АРДАК НУРЛАНОВИЧ	Авторский Надзор	24.07.2025 10:40
Представители заказчика		
960301400557 - РЫС МАҚПАЛ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ	Главный специалист	31.07.2025 16:14
000110500417 - БЕКБОЛҰЛЫ АЙТБЕК null	Главный специалист	25.07.2025 20:03
