7491561

Акт выполненных работ **

№ 190097/01/2 24.05.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **17.05.2019** года № **1 (050140000775/190097/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Алматинская область, г.Талдыкорган Кабанбай батыра № 26	24.05.2019	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос	Разработка технической документации с получением положительного заключения ведомственной экспертизы на средний ремонт а/д "Сарыозек - Коктал" - "Когалы - Коксу - Карабулак, подъезд к с. Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	393252.16	393252.16
						Итого	393 252.16	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 393 252.16 тенге, (триста девяносто три тысячи двести пятьдесят два тенге шестнадцать тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"	050340008728	HSBKKZKX KZ606017131000002687	АО "Народный Банк Казахстана"	г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, 16А, 803
Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Абишев Руслан Владимирович		Генеральный директор		24.05.2019 10:17:43

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
393 252.16 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**025-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос	24.05.2019	Работа	1.00	393252.16	393252.16
				Итого	393 252.16

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 393252.16

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	050140000775	KKMFKZ2A KZ93070102KSN0901000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика)		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич	Заместитель руководителя управления	24.05.2019 11:29:36
Джуманов Багдат Сальменович	Руководитель одела	24.05.2019 11:34:48
Накыпбаев Алмаз Жомартович	Главный специалист	24.05.2019 11:33:39
Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Самуратов Серик Зейноллаевич	Заместитель руководителя ГУ	24.05.2019 11:35:51

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

24.05.2019 11:35:51
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

24.05.2019 10:17:43
Абишев Руслан Владимирович
"АИС Проект" ЖШС

ТОО "АИС Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/7933188/7491561

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/7933188/7491561

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

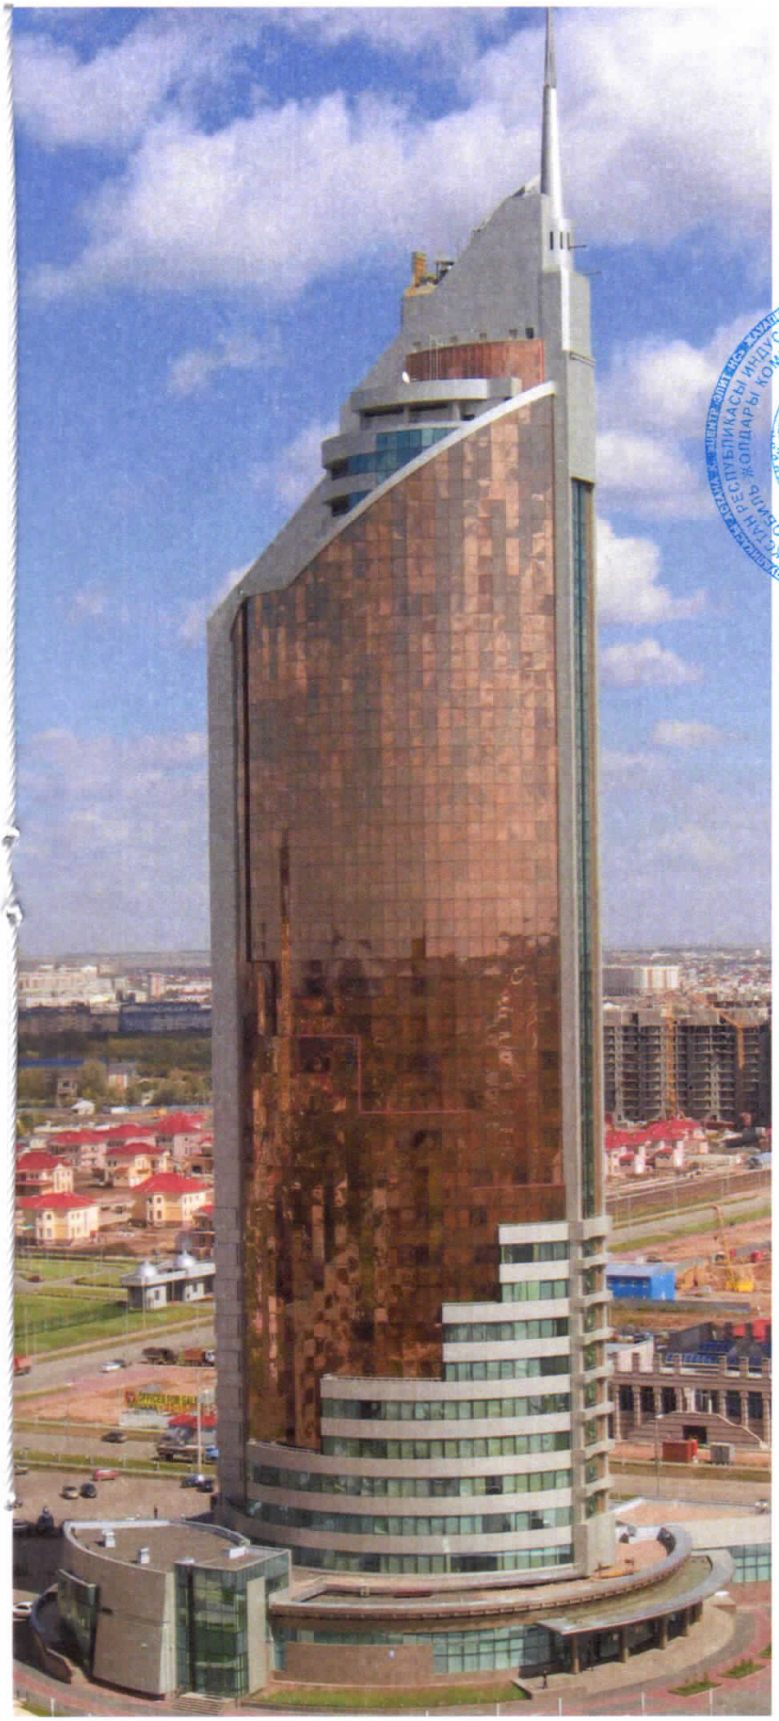

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары

_____ С.А. Аблалиев

Алматы облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «15» мамыр № 453

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИИР РК
_____ Аблалиев С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 453 от «15» мая 2019 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения
Алматинской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области»

Нур-Султан 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района;

2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района;

3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района;

4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района;

5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района;

6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района;

7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района;

8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района;

9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района;

10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района;

11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района;

12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района;

13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- техническое задание;
- пояснительная записка;
- акт обследования;
- ведомость дефектов и намечаемых видов работ;
- фото существующей автодороги;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов;
- схема источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов;
- сметная документация;
- ведомость объемов работ;
- схема организации дорожного движения.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района:

- киркование покрытия (участок КМ 0+000-0+100);
- исправление профиля (участок КМ 0+000-0+100);
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси (участок КМ 0+000-0+100);
- исправление профиля (участок КМ 0+100-21+600);;
- восстановление покрытия переходного типа из щебеночной смеси С1, укрепленной цементом (участок КМ 0+100-21+600);
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района:

- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района:

- ликвидация пучинистых участков;
- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района:

- фрезерование покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из горячей а/б смеси;
- устройство слоя износа из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин фрезерованным материалом с добавлением песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района:

- киркование покрытия (участок КМ 3+740-3+900) :
- исправление профиля (участок КМ 3+740-3+900);
- фрезерование покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из горячей а/б смеси;
- устройство слоя износа из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин фрезерованным материалом с добавлением песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района:

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района:

- ликвидация пучинистых участков;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района:

- ликвидация пучинистых участков;
- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог областного значения Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района:

- Протяженность - 20,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 755 216,202 тыс. тенге

2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района:

- Протяженность - 21,6 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 492 955,983 тыс. тенге

3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района:

- Протяженность - 2,625 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 88 458,416 тыс. тенге

4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района:

- Протяженность - 30,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 1 493 284,710 тыс. тенге

5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района:

- Протяженность - 6,964 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 213 790,356 тыс. тенге

6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района:

- Протяженность - 3,72 км

- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 110 683,681 тыс. тенге

7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района:

- Протяженность - 6,9 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 232 769,899 тыс. тенге

8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района:

- Протяженность - 3,9 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 117 936,441 тыс. тенге

9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района:

- Протяженность - 3,046 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 121 069,777 тыс. тенге

10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района:

- Протяженность - 7,512 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 297 098,747 тыс. тенге

11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района:

- Протяженность - 24,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 737 358,929 тыс. тенге

12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района:

- Протяженность - 2,2 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 79 361,014 тыс. тенге

13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района:

- Протяженность - 8,5 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 311 373,634 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. на учебе

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш.

Утепбергенов К.Е.

Кушков С.М.

10 б. нөмірленіп, байланды

Қолы
