7491716

**Акт выполненных работ ******

№ 190099/01/2 24.05.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **17.05.2019** года № **1 (050140000775/190099/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

**Сведения о выполненной работе ****

| № | Место выполнения работ | Дата/период выполнения работ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС | Сумма, в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматинская область, г.Талдыкорган Кабанбай батыра № 26 | 24.05.2019 | Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос | Разработка технической документации с получением положительного заключения ведомственной экспертизы на средний ремонт а/д "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области | Работа | 1 | 1421435.68 | 1421435.68 |
| | | | | | | Итого | 1 421 435.68 | |

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 1 421 435.68 тенге, (один миллион четыреста двадцать одна тысяча четыреста тридцать пять тенге шестьдесят восемь тиын), в том числе НДС

| Наименование поставщика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк ** | Юридический адрес ** |
|---|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект" | 050340008728 | HSBKKZKX KZ606017131000002687 | АО "Народный Банк Казахстана" | г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, 16А, 803 |
| **Утверждаю **** | | | | |
| Ф.И.О. | | Должность | | Дата подписи |
| Абишев Руслан Владимирович | | Генеральный директор | | 24.05.2019 10:23:42 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Информация по договору**

**Общие сведения**

| Общая стоимость Договора * | Сумма авансовых платежей *** | Сумма оплаты с начала действия Договора *** | Ранее заактированные суммы *** | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств *** | Количество просроченных дней *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 421 435.68 тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика *** | | | **025-015-159** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии *** ) | | | | | |
| Наименование * | Дата/период выполнения работ * | Единица измерения * | Количество * | Цена за единицу тенге * | Сумма, в тенге * |
| Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос | 24.05.2019 | Работа | 1.00 | 1421435.68 | 1421435.68 |
| | | | | Итого | 1 421 435.68 |

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 1421435.68

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

| Наименование заказчика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк * | Юридический адрес *** |
|---|---|---|---|---|
| Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" | 050140000775 | KKMFKZ2A KZ93070102KSN0901000 | РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" | Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 |
| **Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика)** | | | | |
| Ф.И.О. | | Должность | | Дата подписи |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | |
|---|---|---|
| Дарибаев Галымжан Темиргалиевич | Заместитель руководителя управления | 24.05.2019 14:28:01 |
| Джуманов Багдат Сальменович | Руководитель одела | 24.05.2019 14:24:20 |
| Әліпбаев Мәди Серікбайұлы | Главный специалист | 24.05.2019 14:33:36 |
| **Утверждаю (руководитель организации) *** | | |
| Ф.И.О. | Должность | Дата подписи |
| Самуратов Серик Зейноллаевич | Заместитель руководителя ГУ | 24.05.2019 14:41:14 |

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

24.05.2019 14:41:14
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

24.05.2019 10:23:42
Абишев Руслан Владимирович
"АИС Проект" ЖШС

ТОО "АИС Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/7932867/7491716

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/7932867/7491716

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**САРАПТАМА** **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

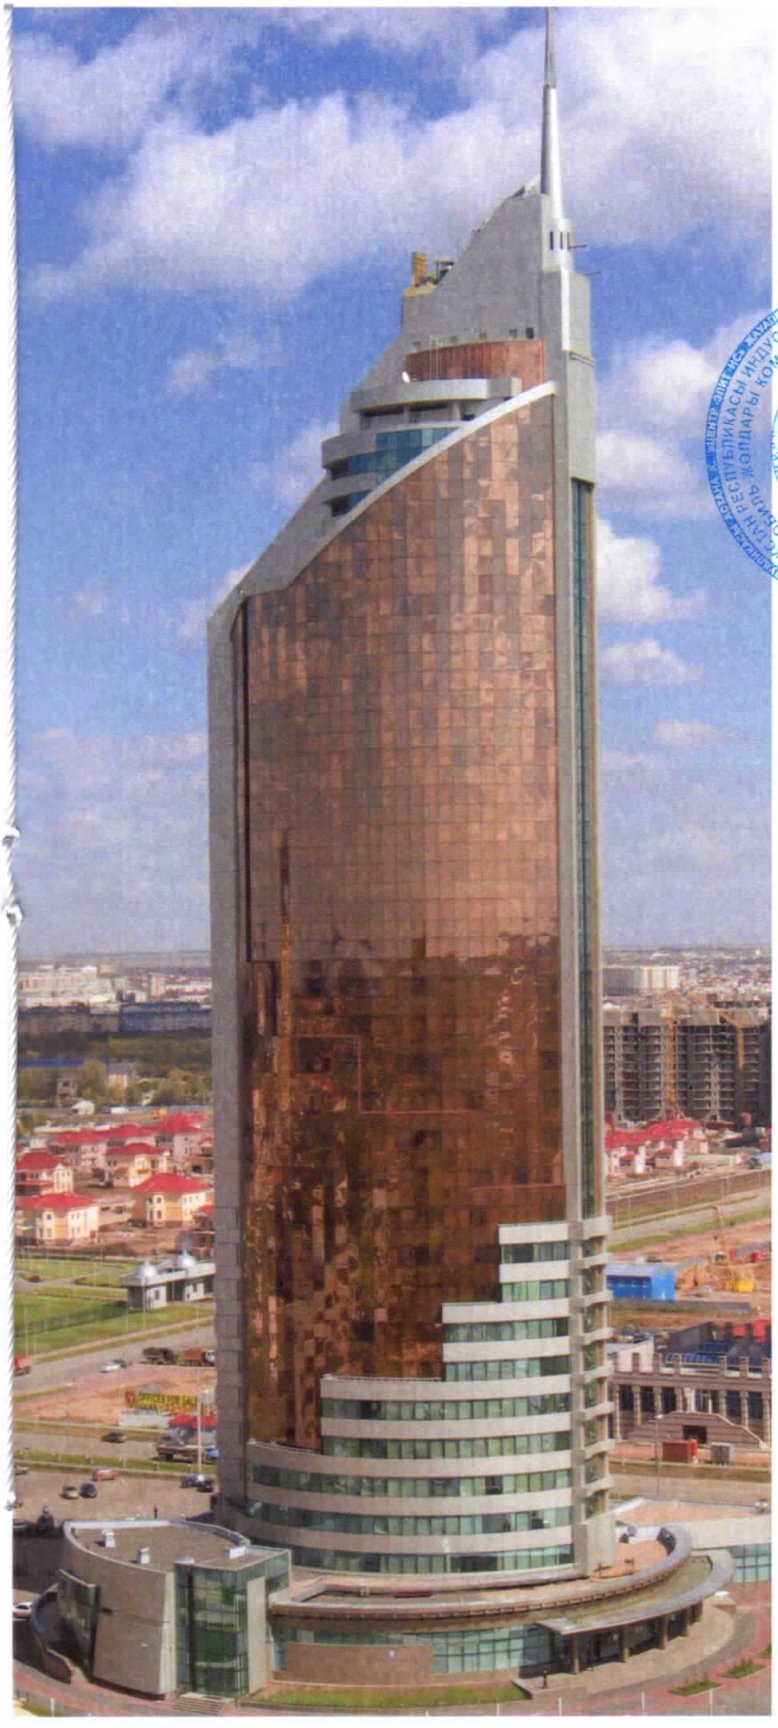

**Бекітемін:**

**Қазақстан Республикасы**
**Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің**
**Автомобиль жолдары комитеті**
**төрағасының орынбасары**
**_____ С.А. Аблалиев**

**Алматы облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға**

2019 жылғы «15» мамыр № 453

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
**«Алматы облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ**

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИИР РК

**Утверждаю:**

**Заместитель председателя**
**Комитета автомобильных дорог**
**МИИР РК**
**_____ Аблалиев С.А.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 453 от «15» мая 2019 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения
Алматинской области

**Заказчик:**
**ГУ «Управление пассажирского**
**транспорта и автомобильных дорог**
**Алматинской области»**

**Нур-Султан 2019 г.**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Наименование проекта:**

1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района;

2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района;

3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района;

4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района;

5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района;

6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района;

7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района;

8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района;

9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района;

10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района;

11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района;

12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района;

13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района.

**Заказчик:** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

**Инвестор, источники финансирования:** бюджетные средства
**Подрядная строительная организация:** будет определена тендером
**Вид работ:** средний ремонт

**Основание, исходные данные для разработки:**
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

**Комплектность представленной документации:**
- техническое задание;
- пояснительная записка;
- акт обследования;
- ведомость дефектов и намечаемых видов работ;
- фото существующей автодороги;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов;
- схема источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов;
- сметная документация;
- ведомость объемов работ;
- схема организации дорожного движения.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

**1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района:**

- киркование покрытия (участок КМ 0+000-0+100);
- исправление профиля (участок КМ 0+000-0+100);
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси (участок КМ 0+000-0+100);
- исправление профиля (участок КМ 0+100-21+600);;
- восстановление покрытия переходного типа из щебеночной смеси С1, укрепленной цементом (участок КМ 0+100-21+600);
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района:**

- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района:**

- ликвидация пучинистых участков;
- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района:**

- фрезерование покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из горячей а/б смеси;
- устройство слоя износа из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин фрезерованным материалом с добавлением песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района:**

- киркование покрытия (участок КМ 3+740-3+900) :
- исправление профиля (участок КМ 3+740-3+900);
- фрезерование покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из горячей а/б смеси;
- устройство слоя износа из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин фрезерованным материалом с добавлением песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района:**

- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района:**

- ликвидация пучинистых участков;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

**13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района:**

- ликвидация пучинистых участков;
- киркование покрытия;
- исправление профиля;
- восстановление покрытия из горячей а/б смеси;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- ремонтно-восстановительные работы по искусственным сооружениям;
- установка дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков.

## ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог областного значения Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

**1. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Кабанбай-Лепсинск», км 0-20 Алакольского района:**

- Протяженность - 20,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 755 216,202 тыс. тенге

**2. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Жансугуров-Арасан», км 0-21,6 Аксуского района:**

- Протяженность - 21,6 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 492 955,983 тыс. тенге

**3. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова», км 0-2,625 Аксуского района:**

- Протяженность - 2,625 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 88 458,416 тыс. тенге

**4. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Капшагай-Баканас-Карой», км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района:**

- Протяженность - 30,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 1 493 284,710 тыс. тенге

**5. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай», км 0-6,964 Ескельдинского района:**

- Протяженность - 6,964 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 213 790,356 тыс. тенге

**6. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" от "Алматы-Жетиген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района:**

- Протяженность - 3,72 км

- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 110 683,681 тыс. тенге

**7. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений М-36 «Екатеринбург-Алматы, подъезд к ст.Коркудук», км 0-6,9 Карасайского района:**

- Протяженность - 6,9 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 232 769,899 тыс. тенге

**8. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Бекболат Ашекеев (Первомайское) – Кайнар», км 0-3,9 Карасайского района:**

- Протяженность - 3,9 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 117 936,441 тыс. тенге

**9. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак», км 0-3,046 Кербулакского района:**

- Протяженность - 3,046 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 121 069,777 тыс. тенге

**10. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал» - «Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с. Онжас», км 0-7,512 Кербулакского района:**

- Протяженность - 7,512 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 297 098,747 тыс. тенге

**11. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек», км 0-24 Сарканского района:**

- Протяженность - 24,0 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 737 358,929 тыс. тенге

**12. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Петропавловка-Садовое-Шатырбай», км 0-2,2 Сарканского района:**

- Протяженность - 2,2 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 79 361,014 тыс. тенге

**13. Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы», км 0,912-9,412 Сарканского района:**

- Протяженность - 8,5 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2019 г.) - 311 373,634 тыс. тенге

**Заместитель председателя комиссии:**

**Габдуллина А.М.** на учебе

**Члены экспертной группы:**

**Нурметов С.Ш.**

**Утепбергенов К.Е.**

**Кушков С.М.**

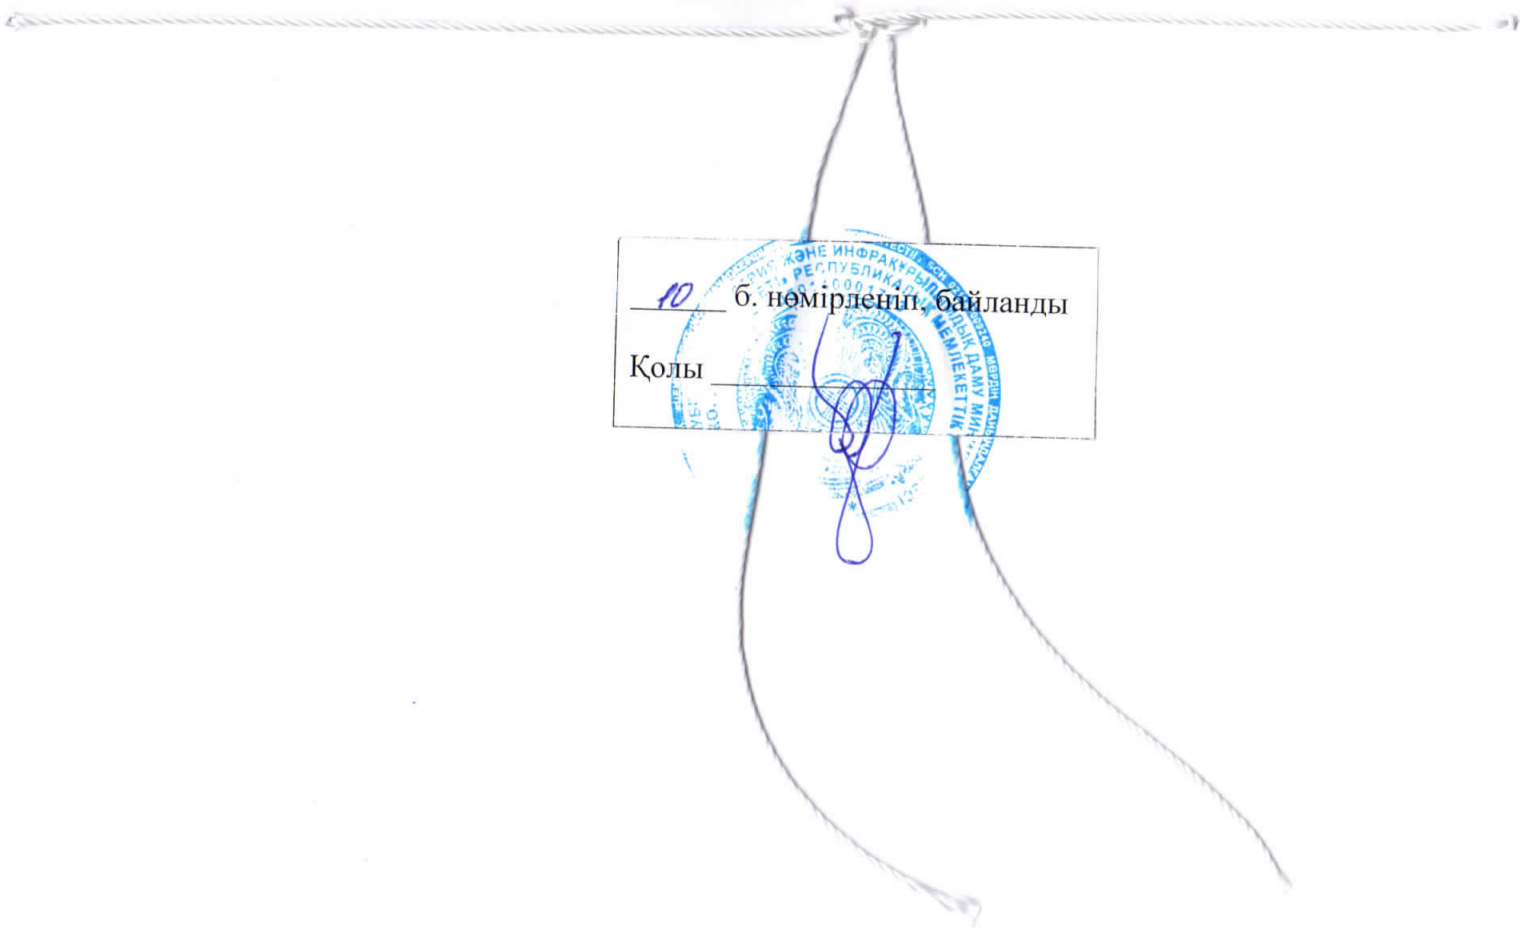
10 б. нөмірленіп, байланды
Қолы
