КӨШІРМЕ
КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

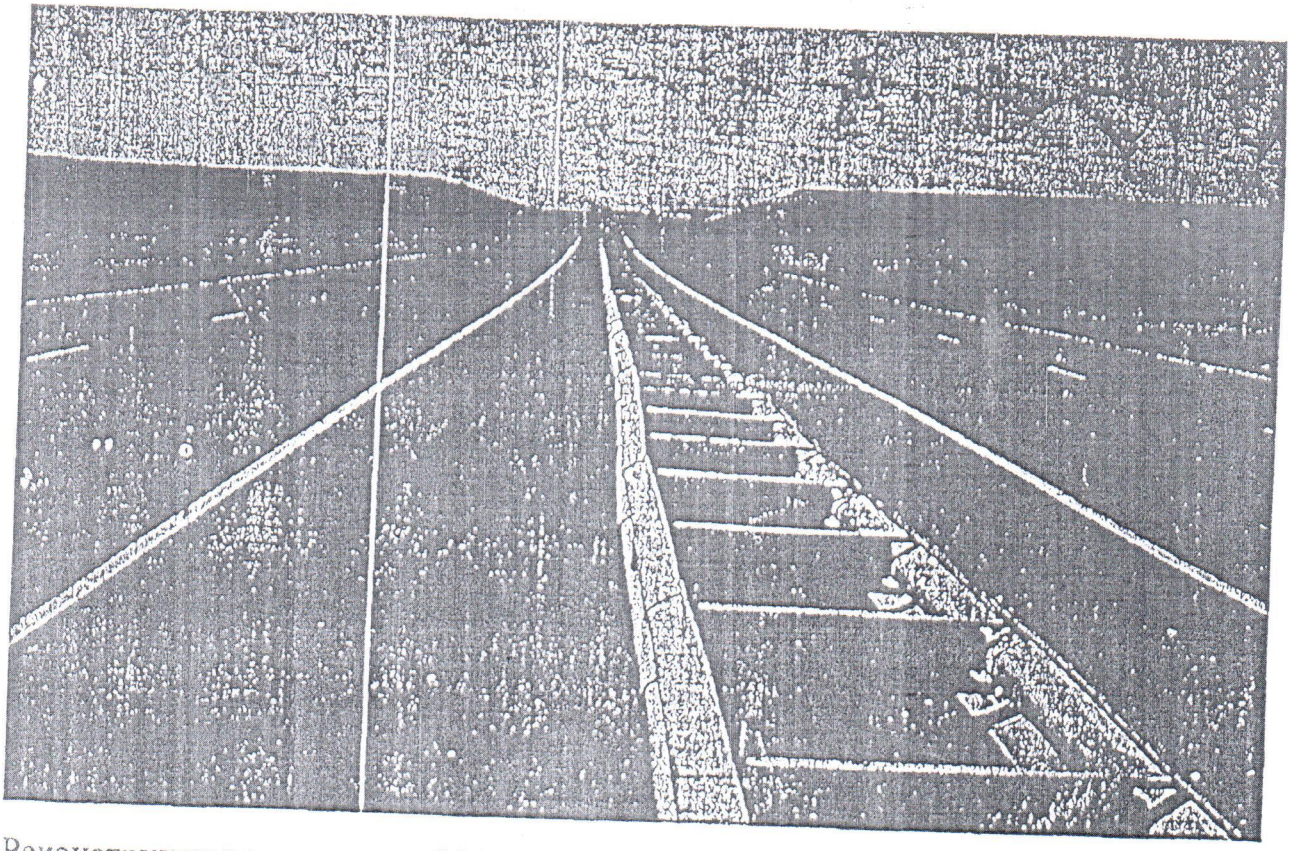

Реконструкция участка км 2012 – 2056+313 автомобильной дороги «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент» входящей в состав международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

КФ АО «ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ДЖЕНЕРАЛИ С.П.А»

АРҒЫ ЖАҒЫНА
КАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

2013 г.

Заключение рабочей комиссии

п.Жанакорган *30 мая 2013 года*

Рабочая комиссия, назначенная Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан *Приказом от 30 апреля 2013 года № 21*

в составе:

Председателя – представителя заказчика –

Беков Амангельды Ауезханович – *заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;*

членов комиссии – представителей:

Жунисов Ерулан Бактыбаевич – *директор Кызылординского областного департамента КАД МТК РК;*

Идирисов Алмаз Серикболович – *начальник Управления внешних займ КАД МТК РК;*

Сигачева Татьяна Ивановна – *начальник управления финансирование КАД МТК РК;*

Досымахулы Куанышбай – *директор ГУ «Кызылордажоллаборатория» КАД МТК РК;*

Абыласанов Базархан Касымханович – *директор Кызылординского областного филиала РГП «Казахавтодор»;*

Амиров Еркеш Мейрамбекович – *инспектор, майор полиции Управления организации регистрационно-экзаменационной работы и дорожно-технической инспекции Комитета дорожной полиции МВД РК;*

Ибрагимов Абдирахил Искакович (Турекожаев Алишер) – *Заместитель акима Жанакорганского района Кызылординской области;*

Кулмаганбетов Айбек Калдыбекович – *Старший госавтоинспектор Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Кызылординской области;*

Нирмал Шрестха – *заместитель руководителя по надзору за строительством «Роугтон/ДБЮК»;*

Ерманова Римма Нуртаевна – *начальник отдела Кызылординского департамента Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК;*

Абылкасымов Марат Абылкасымович – *заместитель руководителя ГУ «Территориальная земельная инспекция Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития РК по Кызылординской области;*

Алжан Абдигазиз Аскарулы – *заместитель руководителя департамента контроля и социальной защиты населения Кызылординской области Министерства труда и социальной защиты населения РК;*

Омаров Берикбай Мажитулы (Сабырханов Абдимаулен) – *и.о начальника Жанакорганского отдела по чрезвычайным ситуациям Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области МЧС РК;*

Ногаев Шайхислам – *заместитель руководителя департамента Комитета экологического регулирования и контроля департамента экологии по Кызылординской области Министерства охраны окружающей среды РК;*

Аманбаев Сагыныш Рахманович – *начальник отдела управление земельных отношений Кызылординской области;*

Хожаметова Светлана Нурмахановна – *начальник отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области;*

Калбергенов Шакизат Балтабаевич – *начальник инспекции Кызылординской региональной инспекции геологии и недропользования «Южно-Казахстанской межрегиональной департамента геологии и недропользования»;*

Памурзин Андрей Николаевич – *главный инженер АО «Казахтелеком» Объединение «Дальная связь» Технический узел сети магистральной связей и телевидения №11;*

Ахметов Орман Айтмагамбетович - *начальник Жанакорганского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области;*

Ахметов Абдимажит – *начальник участка «Жанакоргансушар» Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК;*

Налибаев Багдат Женсикбаевич – *и.о. начальника городского филиала РГП «Государственный научно-производственный центр земельных ресурсов и землеустройства» Кызылординского дочерного государственного предприятия Агентства РК по управлению земельными ресурсами;*

Аширбеков Зейнулла Абиласанович – *начальник отдела архитектуры, градастроительства и строительства Акимата Жанакорганского района;*

Ахметов Нуржан Мейранбаевич (Курышжанов Е.Н) – *начальник Жанакорганского районного электрических сетей;*

Уркараев Зинадулла Халжигитулы – *начальник Жанакорганского районного отдела связей Кызылординской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»;*

Асматулаев Руслан Борисович – *исполнительный директор ТОО «КазНИиПИ» Дортранс;*

Ахмет Будан – *генеральный директор ТОО «СП «СинеМИдасСтрой»;*

Фабио Альмано – *региональный менеджер Кызылординского филиала АО «Тодини»;*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *АО «Тодини Коструциони Дженерали*

С.п.А.», предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная *Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Гр.РФ (на Самару)-Шымкент» км 2012-2057, входящей в состав международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» под I-Б техническую категорию с 4-х полосной проезжей частью», расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области.*

2. Реконструкция осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим *дорожно-строительные работы,* и его субподрядными организациями *согласно приложения С.*

3. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана проектной организацией *ТОО КазНИиПИ «Дортранс» г.Алматы.*

4. Реконструкция осуществлялась с использованием Рабочего проекта *«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Гр.РФ(на Самару)-Шымкент» км 2012-2057.*

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом Агентства РК по делам строительства и ЖКХ №198 от 20.11. 2009 год.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *январь 2010 года;*

окончание работ *май 2013 года;*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-14. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

а) мощность (протяжение дороги) - *44,313 км*

б) ширина земляного полотна - *27,5 м.*

в) ширина проезжей части - *15,0 м*

г) ширина укрепленной полосы обочины - *0,75 м*

д) наибольший продольный уклон - *34 ‰*

е) поперечный уклон проезжей части - *15 ‰*

ж) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений:

Мост на км 2052+628 (41,2 пм) –Г-6,8+2х0,75 м, расчетная нагрузка А 14 НК 180;

з) водопропускные трубы - *30 шт*

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основные показатели трассы:

Количество углов поворота - *10 углов;*

Минимальный радиус закругления - *800 м;*

Общая длина прямых – *41313 м;*

Общая длина кривых - *3000 м;*

Длина трассы - *44,313 км;*

б) Земляное полотно и водоотвод:

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров- при высоте насыпи до 3 м 1:4, при высоте насыпи более 3 м 1:1,5. Для обеспечения продольного водоотвода устроены кюветы с уклоном дна 20 ‰ в полевую сторону и приданием продольных уклонов в сторону труб.

Водоотвод с проезжей части автодороги обеспечивается двухскатным поперечным профилем дороги с уклонами 15 ‰ *и* обочин 40 ‰

На участках с продольными уклонами более 30 ‰ устроены сбросы воды с проезжей части телескопического типа с устройством гасителей у подошвы насыпи.

Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	**от км**	**до км**	**примечание**
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 толщиной 5 см	2012	2057	
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	2012	2057	
Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	2012	2057	

Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 толщиной 20 см	2012	2057	
Подстилающий слой основания из гравийно-песчанной смеси толщиной 25 см	2012	2057	

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту *нет;* фактически *нет.*

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме.

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего - *10889609 тыс. тенге,* в том числе

строительно-монтажных работ - *9624895 тыс. тенге,* оборудования, инструмента и инвентаря - *нет.*

13.Фактическая стоимость работ - _____ *тыс. тенге*

Решение рабочей комиссии: «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ(на Самару)-Шымкент » км 2012-2057, входящей в состав международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» под I-Б техническую категорию с 4-х полосной проезжей частью», расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области».

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика и готовой для предъявления Государственной приемочной комиссии.

До предъявления Государственной приемочной комиссии принять участок с км 2012 до км 2057 автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ(на Самару) - Шымкент» во временное пользование на период гарантийной ответственности АО «Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Приложения к заключению:

1.Приложение М Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке.

2.Приложение Н Ситуационная схема объекта и фотодокументы.

3.Приложение П Список документов.

4.Приложение Характеристика мероприятий.

5.Приложение С - список субподрядных организаций.

Председатель рабочей комиссии: _____ А.Беков

Члены рабочей комиссии:

_____ Е.Жунисов

_____ А. Идирисов

_____ Т. Сигачева

_____ К. Досымахулы

_____ Б. Абыласанов

Е. Амиров

А.Ибрагимов

А. Кулмагамбетов

Нирмал Шрестха

Р. Ерманова

М. Абылкасымов

Б. Омаров

Ш. Ногаев

С. Аманбаев

С. Хожаметова

Ш. Калбергенов

А. Памурзин

О. Ахметов

А. Ахметов

Б. Налибаев

З. Аширбеков

Н.Ахметов

З.Уркараев

Р. Асматулаев

Д. Метель

Ахмет Будан

Фабио Алманьо

Мен,ИМАНГУЛОВА З.Т., 27.09.2012 ж. ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық
көмек көрсету комитеті берген № 12012460 мемлекеттік лицензия негізінде
Астана қаласы нотариаттық аймағының жеке сот нотариусы,
құжат тілнұсқасымен осы көшірменің дұрыстығын куәландырдым.
Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер
және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер
болған жоқ.

Я, ИМАНГУЛОВА З.Т., нотариус нотариального округа
г. Астана, действующий на основании гос. лицензии за № 12012460 выданной
Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК
от 27.09.2012 г., свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/Зарег-но в реестре за № _____
Өндірілді/Выдано _____
нотариус _____

13-02-2017

13-02-2017

Нотариус Имангулова З.Т.
Астана
НОТАРИУС

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Жекеше нотариус Имангулова Зарина Тағырқызы
ҚАЗАҚСТАН
27 қыркүйек 2012 жылы ҚР Әм Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12012460 лицензия негізінде
Частный нотариус Имангулова Зарина Тагыровна
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
