Глава 36. Конфиденциальность

1. Положения Договора ГЧП, информация, полученная или приобретенная какой-либо Стороной в процессе исполнения Договора ГЧП, являются конфиденциальными. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов.

2. Стороны не вправе передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев:

1) представления информации на запросы судебных или правоохранительных органов в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным Законодательством;

2) когда информация предоставляется государственным органам, которые правомочны получать финансовую и иную отчетность в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

3) когда информация предоставляется третьему лицу, оказывающему услуги Частному партнеру, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в установленных Сторонами целях, предусмотренных Договором ГЧП;

4) когда информация предоставляется Кредитору, с которым Частный партнер ведет переговоры о привлечении в Проект ГЧП финансовых средств, при условии, что Кредитор берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в целях, предусмотренных Проектом ГЧП.

3. По всем документам, информации и отчетам, относящимся к строительству и эксплуатации Объектов ГЧП, устанавливается срок соблюдения конфиденциальности на срок действия Договора ГЧП.

Глава 37. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

1. К Обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся особое событие или обстоятельство, которое:

1) вышло за рамки контроля действий какой-либо из Сторон по Договору ГЧП;

2) Сторона не может предвидеть, избежать или преодолеть при его возникновении;

3) не является прямым последствием нарушения одной из Сторон.

2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) также признаются следующие особые события или обстоятельства (но не ограничиваются ими):

1) военные действия;

2) акт терроризма, революция, мятеж;

3) беспорядки и забастовки, предпринятые лицами, не являющимися Персоналом Частного партнера;

4) природные катастрофы и разрушительные явления, в том числе землетрясение, ураган, наводнение, оползни, техногенные и экологические бедствия, катаклизмы, пожар, эпидемии, а также неблагоприятные климатические условия, приводящие к невозможности строительства и обеспечения безопасной эксплуатации Объектов ГЧП.

3. Стороны соглашаются, что следующие события не являются Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором):

1) неосторожное или намеренное действие, ошибки, бездействие, нарушение Договора ГЧП или несоблюдение Законодательства, допущенные Сторонами;

2) забастовки, снижение темпа работы, которые затрагивают только Персонал Частного партнера;

3) сложная экономическая ситуация, в которой находится Частный партнер, или изменение рыночных условий.

4. Факт наступления Обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться, по мере возможности, заключениями и справками органов, уполномоченных фиксировать наступление соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

5. Уведомление о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора):

1) Сторона, на которую оказали воздействия Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 24 (двадцати) четырех часов с момента, когда Сторона узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств. В письменном уведомлении указывается дата наступления Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), предполагаемый срок его действия, необходимо детально описывать такое обстоятельство и его влияние на выполнение обязательств Договора ГЧП Стороной, пострадавшей от обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также содержать описание действий, которые намерена предпринять Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажору). К указанному уведомлению должны прилагаться документальные подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора);

3) Сторона после отправления такого уведомления другой Стороне освобождается от исполнения своих обязательств по Договору ГЧП на время действия этого Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

6. Обязанность минимизировать несвоевременность исполнения Договора ГЧП:

1) Сторона, которая подверглась воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), должна приложить все разумные усилия, чтобы исправить положение, вызванное таким обстоятельством, и уменьшить его последствия;

2) каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора ГЧП обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

7. Последствия Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора):

1) как только обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) перестают оказывать воздействие на пострадавшую Сторону и более не препятствуют выполнению ей своих обязательств по Договору ГЧП, такая Сторона обязана незамедлительно в течении 24 часов уведомить об этом другую Сторону, и возобновить выполнение своих обязательств по Договору ГЧП;

2) в случае если Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), оказывающие какое-либо влияние на выполнение Стороной своих обязательств по Договору ГЧП, продолжаются более 60 (шестьдесят) календарных дней, то любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны провести встречу и обсудить вопрос о поиске выхода из сложившейся ситуации;

3) Срок действия Договора ГЧП и срок выполнения Сторонами определенных действий по Договору ГЧП должен быть продлен на период, равный периоду времени, в течение которого Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), не могла в полной мере выполнять свои обязательства и совершать соответствующие действия по Договору ГЧП. В случае если обязательства и действия Стороны, подвергшейся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), были приостановлены, лишь частично, Стороны должны встретиться, чтобы обсудить и согласовать соответствующее продление (если оно необходимо) такого периода (или этапа) с учетом всех сопутствующих обстоятельств.

Глава 38. Уведомления

1. Все уведомления в рамках Договора ГЧП должны быть составлены в письменной форме на государственном или русском языке.

2. Любое уведомление считается полученным Стороной, если оно зарегистрировано как входящая корреспонденция.

3. Любое уведомление или сообщение, направляемое Государственными партнерами Частному партнеру в соответствии с положениями Договора ГЧП, должно быть направлено Частному партнеру.

4. Любое уведомление или сообщение, направляемое Частным партнером Государственным партнерам в соответствии с положениями Договора ГЧП, должно быть направлено Государственным партнерам.

5. Государственный партнер-1 и/или Государственный партнер-2 и уполномоченные их представители вправе рассматривать любое действие уполномоченного представителя Частного партнера в связи с Договором ГЧП как действие, напрямую одобренное Частным партнером.

6. Частный партнер и уполномоченный его представитель вправе рассматривать любое действие уполномоченных представителей Государствен-

ных партнеров в связи с Договором ГЧП как действие, напрямую одобренное Государственными партнерами.

Глава 39. Язык Договора ГЧП

1. Настоящий Договор ГЧП составлен на государственном и русском языках в 6 (шести) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 4 (четыре) экземпляра для Государственного партнера-1 и Государственного партнера-2 и 2 (два) экземпляра для Частного партнера.

2. В случае возникновения разногласий или споров при уяснении содержания и толковании Договора ГЧП вариант текста на русском языке имеет преимущественную силу.

Глава 40. Заключительные положения

1. Все приложения и дополнения к Договору ГЧП должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

2. Любая переписка по Договору ГЧП направляется по следующим адресам:

1) Государственный партнер-1: E02M9H1, г. Атырау, ул.Айтеке би 77, эл.почта: a.energetika@atyrau.gov.kz

2) Государственный партнер-2: 060005 г.Атырау, пр. Азаттык, 101 А; эл.почта: zhkhatyrau@atyrau.gov.kz

2) Частный партнер: A05K2X1 г. Алматы, пр. Абая, д.218/1; эл. почта: secretary@bttr.kz

3. Переписка, изменяющая условия Договора ГЧП, не имеет юридической силы.

4. Изменение юридического статуса либо организационно-правовой формы Сторон не прекращает действия Договора ГЧП, и все права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам, за исключением случаев, когда Стороны изъявят желание расторгнуть Договор ГЧП, изменить его, либо нормы Законодательства требуют его переоформления. При этом, Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга об изменении своего правового статуса, места нахождения и иных реквизитов Сторон в течение 5 (пять) календарных дней.

5. Настоящий Договор ГЧП представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету Договора ГЧП.

6. Ни одна из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных, выраженных или подразумеваемых договоренностей, заявлений или соглашений, которые не изложены в Договоре ГЧП.

7. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении Договора ГЧП она никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, которые не изложены в Договоре ГЧП.

8. Права и средства правовой защиты Сторон по Договору ГЧП являются дополнительными, но не заменяющими, к каким-либо правам или средствам правовой защиты, предусмотренным применимым правом Республики Казахстан.

9. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору ГЧП имеют юридическую силу в период срока действия Договора ГЧП и должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

10. Договор ГЧП вступает в силу со дня его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2029 года.

Глава 41. Место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон Договора ГЧП

Государственный партнер-1
ГУ «Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»
E02M9H1, Республика Казахстан,
г. Атырау, улица Айтеке-Би, 77
БИП 070140003585,
ИИК KZ63070102KSN1501000,
БИК KKMFKZ2A, РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»

Телефон +7 (7122) [illegible]

Руководитель

_____ **Кенжебеков А.Ж.**

Частный партнер
АО «Батыс транзит»
A05K2X1, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 218/1
БИН 051 140 000 619
ИИК(р/с): KZ556017131000024505
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

эл. адрес: secretary@bttr.kz

И.о. Председателя Правления

_____ **Айтмухаметов К.К.**

Государственный партнер-2
ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
БИП 050140009421
ИИК KZ31070103KSN1510000
БИК KKMFKZ[illegible]
РГУ «Комитет [illegible] Министерства Финансов Республики Казахстан»
Телефон +7 (7[illegible]) [illegible]44259

Руководитель

_____ **Хамидуллаев Б.Ж.**

Приложение 1 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Техническое задание
на выполнение проектирования по строительству сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 319 068 метров

Перечень основных данных и требований

Обоснование

1. Цель и задачи работы

Разработать проектно-сметную документацию на строительство уличного освещения г.Атырау, обеспечивающего освещение территорий города в соответствии с действующими нормами и правилами. Стадия проектирования – рабочий проект (РП).

2. Перечень работ

Работы по проектированию объектов наружного освещения города, включая автоматизированную систему управления наружным освещением.

3. Характеристика и технико- экономические показатели объекта

Общая протяженность сетей уличного освещения – 319 068 метров,
модернизация 1 340 шт. опор освещения;
- установка 8 940 шт. новых опор освещения;
- модернизация 1 340 шт. светодиодных светильников;
- установка 8 940 шт. новых светодиодных светильников уличного освещения;
- установка 192 шкафов управления наружным освещением;
- прокладка воздушных линий (0,4 кВ – 305 000 метров), прокладка кабельных линий (10 кВ – 12 000 метров);
- установка 71 единиц КТПН стационарного типа

Категория электроснабжение – III. Уровень ответственности - технически несложные объекты II (нормального) уровня ответственности

4.Требования к проектно- сметной документации

Сметная документация должна содержать:
– пояснительную записку, в которой приводятся данные, характеризующие сметно-нормативную базу, уровень цен и другие сведения, отличающие условия данного объекта;
– сводные сметные расчеты стоимости строительства;
– локальные сметные расчеты;
– сметные расчеты на отдельные виды затрат (в т.ч. на изыскательские работы, авторский и технический надзор). Стоимость строительства приводится в текущем или прогнозном уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметы или прогнозируемых к периоду осуществления строительства объекта.
Рабочий проект должен быть выполнен в объеме достаточном для обоснования принятых проектных решений в соответствии с требованиями, но не ограничиваясь:
* ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
* СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями по состоянию на 21.10.2021 г.);
* Правила устройства электроустановок Республики Казахстан, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.);
* СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.);
* СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.03.2016 г.);
* иных нормативных документов, действующих на территории РК.

Сметную стоимость определить ресурсным методом на основании государственных элементарных сметных норм (либо в действующей редакции на момент составления сметной документации). Стоимость материальных ресурсов, не учтенных в сборнике «Смета», определить на основании прайс- листов, либо коммерческих предложений поставщиков на период составления смет.

5. Состав и содержание работ по проектированию объектов наружного освещения

Пояснительная записка. План расстановки оборудования на топографической съемке в масштабе 1:1000. Принципиальная однолинейная схема пункта питания. Схема электроснабжения осветительной установки. Ведомость объемов работ. Светотехнический расчет освещения.
Спецификация оборудования, изделий и материалов. Сметы. ОВОС.

6. Состав и содержание работ по проектированию объектов наружного освещения

В проекте предусмотреть тип опоры для ответвления силовых опор на 10 кВ, а также усиленные опоры на 0,4кВ от КТП до наружного освещения. Предусмотреть установку несиловых и силовых опор наружного освещения с однорожковым и/или двухрожковым кронштейном и светильником мощностью от 50 до 150 Вт. Для наружного освещения предусмотреть применение восьмигранных оцинкованных опор с горячим оцинкованием. Питающие сети от ШУНО до опоры преимущественно в воздухе. Электроснабжение с установкой КТП 10/0,4 кВ мощностью 63кВА- отпайка воздухом. Предусмотреть общее количество опор наружного освещения вместе с кронштейнами и светильниками согласно расчетным данным по проекту. ВЛИ 0,38 предусмотреть с применением самонесущих изолированных проводов (СИП-4). Протяженность строительства распределительной сети освещения – 319

068 метров. Строительство, питающий сети 10кВ и 0,4кВ. Управление наружным освещением предусмотреть с помощью шкафа АСУНО. При проектировании КТП предусмотреть место крепления для шкафа АСУНО. Для существующих КТП предусмотреть ограждение и опору для крепления шкафа АСУНО. Высота опоры должна исключать возможность подтопления шкафа. Для КТП и опор освещения предусмотреть фундаментные блоки с использованием сульфатостойкого цемента заводского изготовления либо изготовление сульфатостойких фундаментов на месте проведения СМР.

Перечень улиц, на которых создаются Объекты ГЧП
1 этап

№	Наименование улицы	Протяженность (метр)
1	Лесхоз 17 улица	140
2	Лесхоз 13 улица	300
3	Лесхоз 16 улица	211
4	Лесхоз 12 улица	180
5	Лесхоз ул.лесхозная	1 000
6	Лесхоз 22 улица	215
7	мкр.Лесхоз 19 улица	1 320
8	мкр.Лесхоз 18 улица	150
9	мкр.Лесхоз 1 проезд	170
10	Сарыкамыс ул.Доспанбет Жырау	745
11	Сарыкамыс ул.А.Тауке	660
12	Сарыкамыс ул.Д.Кунаева	665
13	Сарыкамыс ул.Ш.Бөкеева	670
14	Сарыкамыс ул.М.Габдулина	670
15	Сарыкамыс ул.Казтуган	364
16	Сарыкамыс ул.Ш.Кудайбергенова	320
17	Сарыкамыс ул.Аль-Фараби	540
18	Сарыкамыс ул.Жиембет	640
19	Сарыкамыс ул.И.Байзакова	707
20	Сарыкамыс ул.Туран	800
21	Сарыкамыс ул.Т.Ахтанова	300
22	Сарыкамыс ул.Касым-хана	530
23	Сарыкамыс ул.12	950
24	Сарыкамыс ул.13	700
25	Сарыкамыс-2 ул.6	230
26	Сарыкамыс-2 ул.4	175
27	Сарыкамыс ул.И.Баймукашев	180
28	Сарыкамыс-2 ул.14	1 500
29	мкр.Сарыкамыс-2, ул.№1	877
30	мкр.Сарыкамыс-2, ул.№12	904
31	мкр. Водников 2, 14 улица	300
32	мкр. Водников 2, 11 улица	1 022

33	мкр. Водников 2, 16 улица	300
34	мкр. Водников 2, 15 улица	300
35	мкр. Водников 2, 12 улица	600
36	мкр. Водников 2, 28 улица	200
37	мкр. Водников 2, 29 улица	200
38	мкр. Водников 2, 27 улица	200
39	мкр. Водников 2, 21 улица	600
40	мкр. Водников 3, Торехана Истилеува	2 200
41	мкр. Водников 3, 7 улица	300
42	мкр. Водников 3, 4 улица	1 100
43	мкр. Водников 3, 5 улица	535
44	мкр. Водников 3, 6 улица	800
45	мкр. Водников 3, 7 улица	800
46	мкр. Водников 3, 8 улица	900
47	мкр. Водников 3, 10 улица	450
48	мкр. Водников 3, 14 улица	700
49	мкр. Водников 3, 1 улица	667
50	мкр. Водников 3, 2 улица	500
51	мкр. Бирлик-2 ул.23	626
52	мкр. Бирлик пр-зд 1	400
53	мкр. Бирлик-2, ул. 21	300
54	мкр. Бирлик-2, ул. 22	250
55	мкр. Бирлик-2, ул. 24	250
56	мкр. Бирлик-2, ул. 25	250
57	мкр. Бирлик-2, ул. 26	600
58	мкр. Бирлик-2, ул. 27	250
59	мкр. Бирлик-2, ул. 28	250
60	мкр. Бирлик-2, ул. 18	1 200
61	мкр. Бирлик-2, ул. 10	150
62	мкр. Бирлик-2, ул. 19	180
63	мкр. Бирлик-2, ул. 11	240
64	мкр. Бирлик, ул. Без названия (от ул 29 до ул. С. Жанторина)	626
65	мкр. Бирлик, ул. Без названия (от ул. Бекет ата до ул. Г. Мустафина)	500
66	мкр. Бирлик ул. Западноказахстанская	900
67	мкр. Бирлик ул. Бекет ата	200
68	мкр. Бирлик ул. Рабочая	1 100
69	мкр. Бирлик ул. Геологоразведчиков	1 400
	Всего:	**39 159**

	Аксайский сельский округ	
70	пос.Акжар-2, ул. 2	1 090
71	пос.Акжар-2, ул. 3	1 210

72	пос.Акжар-2, ул. 4	1 210
73	пос.Акжар-2, ул.20	900
74	пос.Акжар-2, ул.7	900
75	пос.Аксай-2, ул. 7	1 370
76	пос.Аксай-2, ул. 22	1 630
77	пос.Аксай-2, ул. 21	1 575
78	пос.Аксай-2, ул. 26	1 300
79	пос.Аксай-2, ул. 27	1300
80	пос.Аксай-2, ул. 17	1020
81	пос.Аксай-2, ул. 16	1500
82	пос.Аксай-2, ул. 15	650
83	пос.Аксай-2, ул. 12	650
84	пос.Аксай-2, ул. 11	1080
85	пос.Аксай-2, ул. 10	900
86	пос.Аксай-2, ул. 9	520
87	пос.Аксай-2, ул. 18	200
88	пос.Аксай-2, ул. 6	200
89	пос.Аксай-2, ул. 5	1000
90	пос.Аксай-2, ул. 4	500
91	пос.Аксай-2, ул. 3	600
92	пос. Аксай-2, ул.23	1300
93	пос. Аксай-2, ул.24	1500
94	пос. Аксай-2, ул.20	1500
95	пос.Акжар Достық көшесі	500
96	пос.Аксай-2, ул. 2	800
	Всего:	**26 905**
	Итого 1-этап	**66 064**

2 этап

№	**Наименование улиц**	**Протяженность (метр)**
1	мкр.Атырау, ул.№22	370
2	ул. Бауыржана Момышулы (от Махамбета до на набережной)	800
3	8 улица (Атамура)	230
4	А.Молдагулова (от Бейбарыса с продолжением на М.Шокай)	3 110
5	Толе би	2 680
6	7 улица (Атамура)	217
7	Атамбаева (от Азаттык до Кабдолова)	1 790
8	Афанасьева	2 500
9	5 улица (Атамура)	118
10	Курмангалиева	1 800
11	переулок Наубетова	204
12	10 улица (Алиев-Курмангазы)	583
13	Мырзагали Казирета	2 260

14	пр.Елорда	2 090
15	2-ул Нурсая	558
16	мкр.Береке (ул. Музафара Алимбаева с продолжением на ул. Гурьевснаб до светофора Геолог)	3 280
17	мкр. Береке ул. 11	400
18	мкр. Береке ул. Ойсаз (ул. 12)	300
19	мкр. Береке ул. А.Айтканова (ул.13	500
20	мкр. Береке ул. 8	300
21	пр.Майлина	825
22	мкр. Атырау ул. 49	250
23	мкр. Атырау ул. Медеу	250
24	мкр. Атырау ул. Шалгын	250
25	мкр. Атырау ул. Ермек Дутбаев	1100
26	мкр. Атырау ул. 13	400
27	мкр.Атырау, ул.М.Суйсенова	702
28	мкр.Атырау, ул. Алтын Емель	916
29	мкр.Атырау, ул.№57 (ул.Бесшатыр)	300
30	мкр.Атырау, ул.№23 (ул.Айнабулак)	265
31	мкр. Атырау пр-зд Жусан	400
32	мкр. Атырау ул. Казына	200
33	мкр. Атырау ул. Дидар	200
34	мкр. Атырау ул. Кемер	200
35	мкр. Атырау пр-зд Дарабоз	200
36	мкр. Атырау ул.Шаттык	200
37	мкр. Атырау ул.Сайрам	200
38	мкр. Атырау ул. Толагай	200
39	мкр. Атырау ул.Акбокен	200
40	мкр.Авангард, ул.М.Калимова	860
41	мкр.Авангард, ул.Н.Тлендиева	1 110
42	мкр.Авангар, ул.Береке	428
43	мкр. Акшагала, пр.№12	126
44	мкр. Акшагала, пр.№5	340
45	мкр. Акшагала, пр.№8	315
46	мкр. Акшагала, ул.№2	1 700
47	Мунайшы ул.№4 (район огородный)	482
48	Мунайшы ул.№5 (район огородный)	736
49	Көк арна Төлеген Бейбіталиева	610
50	Көк арна Пазыл Хансұлтанова	700
51	Көк арна 12 улица	400
52	Көк арна 5 улица продолжение	51
53	Мукана Суйесинова	700
54	мкр. Курсай ул. Аксуат	1 600
55	мкр. Курсай 3-й проезд	338

56	мкр. Курсай 2-й проезд	400
57	мкр. Курсай, 2-ая улица	200
58	мкр. Курсай ул. Курмангазы	1 100
59	ул.М.Монкеулы	176
60	мкр.Оркен 47 улица	430
61	мкр.Атырау, ул.Акарыс	730
62	мкр.Атырау, ул.Жанарыс	810
63	мкр.Атырау, ул.Жибекжолы	655
64	мкр.Атырау, ул.48 коше	250
65	мкр.Атырау-2, ул.№7	250
66	мкр.Оркен улица Акканым Байдулина	430
67	мкр.Оркен улица 27	540
68	мкр.Оркен улица Т.Бимакова	1 000
69	мкр.Атырау, ул.С. Зорбаев	660
70	мкр.Атырау, ул.Нурлыжол	640
71	мкр.Атырау, ул.А. Нургалиев	365
72	мкр.Атырау, ул.Станционная	470
73	мкр.Атырау, ул.Мендыкулова	560
74	мкр.Атырау, ул.Алпамыс Батыр	390
75	мкр.Атырау, ул.44 коше	242
76	мкр.Атырау, ул.С. Кагазов	474
77	мкр.Атырау, ул.35 (Аксенгер)	550
78	мкр.Атырау, ул.36	293
79	мкр.Атырау, ул.22	363
80	мкр.Атырау, ул.23	265
81	мкр.Атырау, ул.57	453
82	мкр.Атырау, ул.38	200
83	мкр.Атырау, ул.4	340
84	мкр.Атырау, ул.3	340
85	мкр.Атырау, ул.2	340
86	мкр.Атырау, ул.1	320
87	мкр.Атырау, ул.7	340
88	мкр.Атырау, ул.5	100
89	мкр.Мирас, ул. Кобланды батыра	1 020
90	мкр.Мирас, ул. Сарайшык	1 047
91	мкр.Мирас, ул. КажимаЖумалиева	1 430
92	мкр. Мирас ул. Токсанбаева	1100
93	мкр. Мирас пр-зд Арай	500
94	мкр. Мирас ул. Кетбуга Батыр	500
95	Супагали Курманбаева	300
96	Тайманова (от моста до кольца)	1 770
97	Жарбосынова	1 850
98	Кулманова	2 300

99	мкр.Атырау-2, ул.№4	400
100	мкр.Атырау-2, ул. Байтерек	320
101	мкр.Атырау-2, ул.№5	340
102	мкр.Атырау-2, ул. Хазрета Науан	320
103	мкр.Атырау-2, ул.№7	300
104	мкр.Атырау-2, ул.№1 (от моста)	600
105	мкр. Атырау-2, ул. Без названия	300
106	мкр. Жумыскер ул. 14	150
107	мкр. Жумыскер ул. Без названия (от ул.14 до ул. К. Жумагалиева)	200
108	мкр. Жумыскер ул. Без названия (от ул. С. Кожанова до ул. К. Зенедена)	148
109	мкр. Жумыскер ул. 23	337
110	мкр. Жумыскер пр-зд 4	500
111	мкр. Жумыскер пр-зд 2	162
112	мкр. Жумыскер ул. Шерхана Муртазы	348
113	мкр. Самал ул. Кожаберген Жырау	1 200
114	мкр. Самал ул. Ыскака Отегалиева	1 230
115	мкр. Самал ул. 8	1 400
116	мкр. Самал ул. С. Нурмагамбетова от ул. А. Кикельбаева до ул. 22	1 200
117	мкр. Самал ул. Нурлыжол от ул. М. Бердаулы до ул. 22	500
118	мкр. Самал ул. Карабора от М. Бердаулы до ул. 22	600
119	мкр. Самал ул. С. Отебаева	1 130
120	мкр. Самал ул. М. Бердаулы	1 050
121	мкр. Самал ул. А.Кекибайулы	2 120
122	мкр. Самал ул. А. Сыдыханов	1 500
123	мкр. Самал пр-зд 17	700
124	мкр. Самал пр-зд 16	1 000
125	мкр. Самал пр-зд 8	500
126	мкр. Самал пр-зд 6	1 130
127	мкр. Самал пр-зд 7	200
128	мкр. Самал пр-зд 9	270
129	мкр. Самал пр-зд 10	330
130	мкр. Самал пр-зд 11	390
131	мкр. Самал пр-зд 12	800
132	мкр. Самал пр-зд 13	620
133	мкр. Самал пр-зд 14	530
134	мкр. Самал пр-зд 15	510
135	мкр. Самал пр-зд 19	320
136	мкр. Самал ул. А. Ахмирова	760
137	мкр. Самал ул. Б. Матвеева	570
138	мкр. Самал ул. Б. Саппаева	790
139	мкр. Самал пр-зд 1	500
140	мкр. Самал пр-зд 2	730

141	мкр. Самал пр-зд 3	500
142	мкр. Самал пр-зд 4	430
143	мкр. Самал пр-зд 5	600
144	мкр. Самал пр-зд 29	220
145	мкр. Самал ул. Без названия (от ул. 29 до ул. А. Ахмирова)	900
146	мкр. Жеруйык пр-зд 11 (взади инфекционной больницы)	200
	Всего:	**98 192**
	Еркинкалинский сельский округ	
147	Балауса, ул.№2	790
148	Балауса, ул.№5	790
149	Балауса, ул.№6	790
150	Балауса, ул.№7	690
151	Балауса, ул.№8	690
152	Балауса, ул.№9	96
153	Балауса, ул.№10	208
154	Балауса, ул.№12	148
155	Балауса, ул.№13	247
156	Балауса, ул.№14	191
157	Балауса, ул.№15	430
158	Балауса, ул.№16	239
159	Балауса, ул.№17	630
160	Балауса, ул.№18	705
161	Балауса, ул.№24	215
162	Балауса, ул.№25	570
163	Балауса, ул.№27	700
164	Балауса, ул.№20	1500
165	Балауса, ул.№28	1160
166	Балауса, ул.№30	1236
167	Балауса, ул.№44	391
168	Балауса, ул.№45	200
169	Балауса, ул.№46	260
170	Балауса, ул.№21	840
171	Балауса, ул.№29	1430
172	Балауса, ул.№32	241
173	Балауса, ул.№35	920
174	Балауса, ул.№37	1 360
175	Балауса, ул.№38	266
176	мкр.Еркинкала-2, ул. Г. Шапаува (ул.4)	700
177	мкр.Еркинкала-2, ул.37	1 349
178	мкр.Еркинкала-2, ул.17	900
179	мкр.Еркинкала-2, ул.16	900
180	мкр.Еркинкала-2, ул.24	1 040
181	мкр.Еркинкала-2, ул.27	1 060

182	мкр.Еркинкала-2, ул.13	1 000
183	мкр.Еркинкала-2, ул. З. Сартынбетова (ул.43)	1 100
184	мкр.Еркинкала-2, ул.44	1 795
185	мкр.Еркинкала-2, ул.39	1 200
186	мкр.Еркинкала-2, ул.41	1 360
187	мкр.Еркинкала-2, ул.42	1 360
188	мкр.Еркинкала-2, ул.36	1 200
189	мкр.Еркинкала-2, ул.33	1 056
190	мкр.Еркинкала, ул.Т.Касанова	1 387
191	мкр.Еркинкала-2, ул. Б. Сыртанулы (ул. 1)	1 900
192	мкр.Еркинкала-2, ул. М. Шомбасова (ул.2)	1 900
193	мкр.Еркинкала-2, ул. Е. Азбергенова (ул.3)	1 900
194	мкр.Еркинкала-2, ул. 5	1 900
195	мкр.Еркинкала-2, ул. 9	1 900
196	мкр.Еркинкала-2, ул. 14	1 000
197	Ракуш, ул.Жаксыбаева	1 750
198	Ракуш, проезд перед школой М.Утемисова	260
199	Ракуш, проезд между улицами Бокашева-Хасанова	1 040
200	Ракуш, проезд между улицами Нугыманова-Хасанова	500
201	Ракуш, проезд между улицами Хасанова-Бокашева	700
	Всего:	**50 090**

	Кенузекский сельский округ	
202	Таскала-2, ул.№3	500
203	Таскала 1 Бейбитшилик	860
204	Таскала Орталык	775
205	Таскала-2, ул.№4	1 120
206	Таскала-2, ул.№6	920
207	Таскала-2, ул.№7	790
208	Таскала-2, ул.№9	780
209	Таскала-2, ул.№10	600
210	Таскала-2, ул.№11	980
211	Таскала-2, ул.№12	1 290
212	Таскала-2, пр.№1	1 210
213	Таскала-3, ул.№3	1 170
214	Таскала-3, ул.№4	1 130
215	Таскала-3, ул.№6	1 210
216	Таскала-3, ул.№7	860
217	Таскала-3, ул.№12	860
218	Таскала-3, ул.№13	860
219	Таскала-3, ул.№14	980
220	Таскала-3, ул.№15	860
221	Таскала-3, ул.№16	860

222	Таскала-3, ул.№17	860
223	Таскала-3, ул.№18	1 100
224	Таскала-3, ул.№19	1100
	Всего:	**21 675**
	Атырауский сельский округ	
225	Жанаталап, ул.№5	770
226	Жанаталап, ул.№6	1 250
227	Жанаталап, ул.№7	1 250
228	Жанаталап, ул.№9	1 250
229	Жанаталап, ул.№14	1 250
230	Жанаталап, ул.№12	852
231	Жанаталап, ул.№13	780
232	Жанаталап, ул.№21	520
233	Жанаталап, ул.№23	1 300
234	Жанаталап, ул.№25	285
235	Жанаталап, ул.Садыков	225
236	Жанаталап, ул.Бабатөбе	1 300
237	Жанаталап, ул.Исмагулова	1 000
238	Жанаталап, ул.Ащыкөл	1 700
239	Жанаталап, ул.Бестөбе	1 700
240	Зарослый, ул.№1	1 160
241	Зарослый, ул.№2	1 100
242	Зарослый, ул.№10	1 050
243	Зарослый, ул.№13	1 116
244	Зарослый, ул.№16	260
245	Қызыл балық К.Көшелиев	780
246	Қызыл балық Ферма	1 300
247	Қызыл балық Ф.Дахиев	674
248	Қызыл балық Ж.Иманғалиев	970
249	Қызыл балық Т.Құмаров	890
250	Қызыл балық А.Салин	800
251	Қызыл балық ул.№15	574
252	Қызыл балық ул.№20	360
253	Қызыл балық ул.№23	1 000
254	Қызыл балық Золотенок	560
255	Қызыл балық ул.№17	700
	Всего:	**28 726**

	Кайыршахтинский сельский округ	
256	Талғайран 2 ул.13	1 020
257	Талғайран 2 ул.1	1 000
258	Талғайран 2 ул.2	1 020

259	Талғайран 2 ул.4	450
260	Талғайран 2 ул.12	500
261	Талғайран 2 ул.11	500
262	Талғайран 2 ул.10	600
263	Талғайран 2 ул.9	550
264	Талғайран 2 ул.8	500
265	Талғайран 2 ул.7	1 360
266	Талғайран 2 ул.6	240
267	Талғайран 2 ул.5	554
268	Талгайран 2 ул.Без названия (от ул. 5 до ул. 13)	835
269	Талгайран 2 ул.3(от трассы до ул. 10)	444
270	Талгайран 2 пр-зд 1	200
271	Бесекты ул. Балгожина	667
272	Бесекты ул. С. Барменова	621
273	Бесекты ул. Без названия (от С. Барменовой до К. Нуржановой)	452
274	Бесекты ул. Без названия (между К. Нуржановой до А. Егизбаева)	150
275	Жулдыз ул.23	1 960
276	Жулдыз ул.24	200
277	Жулдыз ул.25	1 880
278	Жулдыз ул.26	160
279	Жулдыз ул.27	1 060
280	Жулдыз ул.28	130
281	Жулдыз ул.29	600
282	Жулдыз ул.30	840
283	Жулдыз ул.31	1 520
284	Жулдыз ул.33	300
285	Жулдыз ул.35	560
286	Жулдыз ул.38	840
287	Жулдыз ул.39	2 118
288	Жулдыз ул.43	980
289	Жулдыз ул.42	1 420
290	Жулдыз ул.45	1 180
291	Жулдыз ул.48	860
292	Жулдыз ул.50	1 120
293	Жулдыз ул.51	1 130
294	Жулдыз 3 ул.13	1 160
295	Жулдыз 3 ул.12	1 120
296	Жулдыз 3 ул. 8	1 210
297	Жулдыз 3 ул.11	1 300
298	Жулдыз 3 ул.10	940
299	Жулдыз 3 ул.9	940

300	Жұлдыз 3 ул.Аль-Фараби	180
301	Томарлы ул. Ж. Кулмангабетова	200
302	Томарлы ул. Баян Аул	600
303	Томарлы ул. П. Амангалиева	500
304	Томарлы ул. С. Шалхарова	400
305	Томарлы ул. М. Мусина	500
306	Томарлы ул. С. Молбаева	600
307	Томарлы ул. Без названия (от К. Етемировой до Ж. Кулмангабетова)	500
308	Көктем ул.7	260
309	Көктем ул.9	200
310	Көктем ул.10	960
311	Көктем ул.13	600
312	Көктем ул.С.Жумаханов	760
313	Көктем ул.К.Әділбеков	380
314	Көктем ул.19	280
315	Көктем ул.21	160
316	Көктем ул.22	100
317	Көктем ул.23	960
318	Көктем ул.24	840
319	Көктем ул.25	450
320	Көктем ул.26	400
321	Көктем ул.27	400
322	Көктем пр.1	500
323	Көктем пр.2	500
324	Көктем пр.3	500
325	Набережная (сторона Азия)	5400
	Всего:	**54 321**
	ИТОГО 2-этап:	**253 004**

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.К.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 2 к Договору
государственно-частного партнерства по проекту
государственно-частного партнерства «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

График осуществления проекта ГЧП

Финансовое закрытие проекта	в течении 3 (трех) месяцев с момента регистрации Договора ГЧП
Срок завершения строительства	**1-ый этап**: 31.12.2023 г. **2-ой этап**: 31.12.2024 г.
Срок эксплуатации	**1-ый этап**: январь 2024-2029 годы **2-ой этап**: январь 2025-2029 годы
Срок действия Договора ГЧП	6 лет 8 месяцев / 82 месяцев

Подписи Сторон

Частный партнер	**Государственный партнер-1**	**Государственный партнер-2**
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 3 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Расшифровка стоимости строительства

Новое строительство (260 223 м.)				
№	**Наименование**	**Кол-во**	**Стоимость**	**Сумма**
1	Металлическая опора (с фундаментом и кронштейном)	8 670	220 000	1 907 400 000
2	Светодиодный светильник	8 670	220 000	1 907 400 000
3	Модуль управления	8 670	85 000	736 950 000
4	Линейно-подвесная арматура	8 670	75 000	650 250 000
5	ВЛ 0,4 Кв, сип 4х35	260 000	2 000	520 000 000
6	КЛ 10 кВ	10 000	17 000	170 000 000
7	Оборудование 10 кВ	55	160 000	8 800 000
8	Шкаф управления	155	5 500 000	852 500 000
9	РЛНД	55	100 000	5 500 000
10	КТПН	55	2 700 000	148 500 000
11	Лабораборные профессиональные испытания	8 670	10 000	86 700 000
12	Строительно-монтажные работы	8 670	200 000	1 734 000 000
13	Пуско-наладочные работы	8 670	30 000	260 100 000
			Итого	**8 988 100 000**

Демонтаж (40 175 м.)				
№	**Наименование**	**Кол-во**	**Стоимость**	**Сумма**
1	Металлическая опора (с фундаментом и кронштейном)	1 340	220 000	294 800 000
2	Светодиодный светильник	1 340	220 000	294 800 000
3	Модуль управления	1 340	85 000	113 900 000
4	Линейно-подвесная арматура	1 340	75 000	100 500 000
5	ВЛ 0,4 Кв, сип 4х35	45 000	2 000	90 000 000
6	КЛ 10 кВ	2 000	17 000	34 000 000
7	Оборудование 10 кВ	15	160 000	2 400 000
8	Шкаф управления	35	5 500 000	192 500 000
9	РЛНД	15	100 000	1 500 000
10	КТПН	15	2 700 000	40 500 000
11	Лабораборные профессиональные испытания	1 340	10 000	13 400 000
12	Строительно-монтажные работы	1 340	270 000	361 800 000
13	Пуско-наладочные работы	1 340	30 000	40 200 000
			Итого	**1 580 300 000**

Набережная (новое строительство 5 400 м.)				
№	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Металлическая опора (с фундаментом и кронштейном)	270	190 000	51 300 000
2	Светодиодный светильник	270	200 000	54 000 000
3	Модуль управления	270	85 000	22 950 000
4	Линейно-подвесная арматура	270	75 000	20 250 000
5	КЛ ВВВШБ 4х10	7 000	10 000	70 000 000
6	Шкаф управления	2	5 500 000	11 000 000
7	РЛНД	2	100 000	200 000
8	КТПН	1	2 700 000	2 700 000
9	Лабораборные профессиональные испытания	270	10 000	2 700 000
10	Строительно-монтажные работы	270	200 000	54 000 000
11	Пуско-наладочные работы	270	30 000	8 100 000
			Итого	**297 200 000**

Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
№	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Проектирование и топосъемка	1	300 000 000	300 000 000
2	Авторский надзор	1	100 000 000	100 000 000
3	Технический надзор	1	220 000 000	220 000 000
			Итого	**620 000 000**

ИТОГО СТОИМОСТЬ	**11 485 600 000**

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Аутмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамитжанов Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 4 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Организационная схема управления проектом ГЧП

План реализации Проекта ГЧП включает следующие стадии:
I. инвестиционный период;
II. постинвестиционный период.

Основные участники проекта ГЧП:

Государственный партнер-1 – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»;
Государственный партнер-2 – ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной испекции»;
Частный партнер – АО «Батыс Транзит».

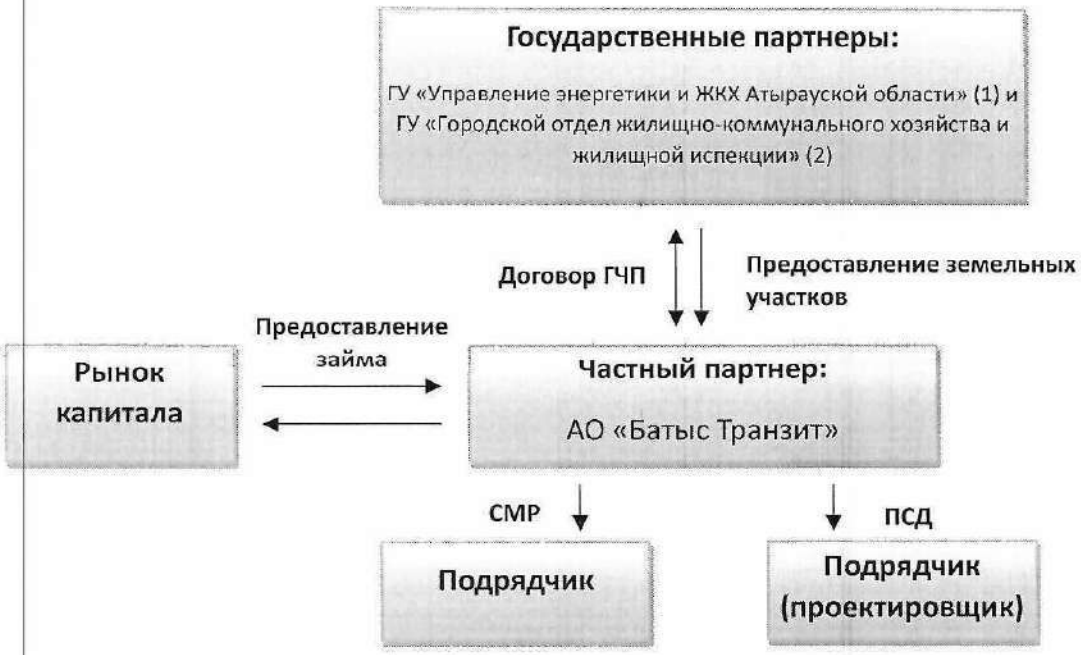

Рисунок 1. Организационная схема управления Проектом ГЧП в инвестиционный период

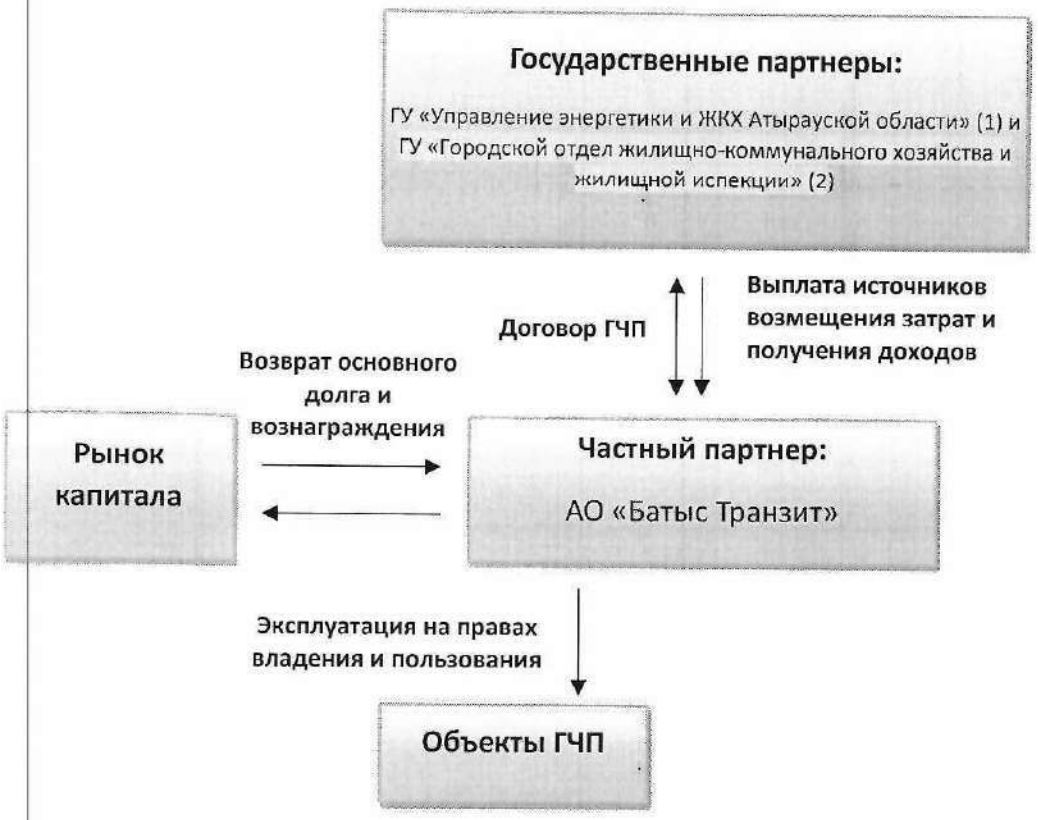

Рисунок 2. Организационная схема управления Проектом ГЧП в постинвестиционный период

Участники проекта	Инвестиционный период	Постинвестиционный период
Государственные партнеры – ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области» (Государственный партнер-1) и ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной испекции» (Государственный партнер-2)	осуществляют контроль за исполнением договора ГЧП и деятельностью частного партнера в рамках договора ГЧП принимают на себя обязательства в соответствии с договором ГЧП, включая предоставление технических условий на подключение объектов к инженерным сетям города и необходимых земельных участков для строительства объектов ГЧП (Государственный партнер-2) осуществляет принятие Объекта ГЧП в коммунальную собственность (Государственный партнер-2) и государственную регистрацию прав на Объекты ГЧП	Государственный партнер-2 передает права владения и пользования Объектами ГЧП Частному партнеру Государственные партнеры осуществляют мониторинг и контроль за исполнением условий договора Частным партнером, в том числе в отношении соблюдения показателей качества, в соответствии с договором ГЧП Государственный партнер-2 выплачивает источники возмещения затрат частному партнеру в виде компенсации инвестиционных затрат, компенсации операционных затрат и источники получения дохода - вознаграждение за управление Объектами ГЧП

Частный партнер – АО «Батыс Транзит»	обеспечивает проведение проектно-изыскательских работ по проекту ГЧП, согласование проектно-сметной документации с Государственным партнером-2, получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы на ПСД обеспечивает финансирование проекта ГЧП получает разрешения, которые могут потребоваться для строительства и эксплуатации объектов ГЧП обеспечивает строительство объектов ГЧП инициирует принятие Объектов ГЧП (в том числе, поэтапное) в коммунальную собственность и их введение в эксплуатацию обеспечивает эксплуатацию объектов ГЧП в соответствии с показателями качества, согласно договору ГЧП выполняет другие обязательства, предусмотренные договором ГЧП	осуществляет эксплуатацию сетей уличного освещения на праве доверительного управления, предоставляет отчеты государственым партнерам об осуществляемой деятельности в рамках проекта ГЧП получает коменсацию затрат (выплаты) и ВЗУ от Государственного партнера-2 обеспечивает оговоренные в договоре ГЧП характеристики объектов ГЧП и показатели качества, осуществляет возврат основного долга и вознаграждения по займу, обеспечивает доступность объектов ГЧП для проведения государственными партнерами мониторинга, осуществляет возврат прав владения и пользования объектами ГЧП Государственному партнеру-2
Подрядчик (строительная компания, привлекаемая частным партнером на основании договора строительного подряда)	обеспечивает непосредственное проведение строительно-монтажных работ отвечает за привлечение в проект рабочих, служащих и инженерно-технических работников, специальной и строительной техники несет ответственность за качество строительства Объектов ГЧП перед частным партнером	несет ответственность за качество выполненных строительно-монтажных работ
Подрядчик (проектировщик)	проводит проектно-изыскательские работы по проекту ГЧП с предоставлением частному партнеру проектно-сметной и рабочей документации по строительству объектов ГЧП	
Рынок капитала (международные финансовые организации, банки	предоставляют денежные средства для реализации проекта на основании кредитного соглашения	осуществляют контроль за возвратом денежных средств частным партнером , выданных для реализации проекта ГЧП на основании кре-

второго уровня или национальные компании)		дитного соглашения с частным партнером

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 5 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Требования к порядку передачи Объекта ГЧП после периода эксплуатации

1. За 3 (три) месяца до даты истечения срока действия Договора или в случае досрочного прекращения Договора в согласованный Сторонами срок, Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объектов ГЧП и их подготовке к передаче.

2. В состав комиссии должны входить уполномоченные представители Частного партнера и Государственного партнера-2. Стороны вправе привлечь экспертов для участия в работе комиссии.

3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после ее создания, комиссия должна установить:

1) порядок передачи Объектов ГЧП, включая состав и состояние передаваемого имущества;

2) состав документов, относящихся к Объектам ГЧП и подлежащих передаче.

4. В случае обнаружения на Объектах ГЧП каких-либо дефектов или недостатков, делающих невозможным дальнейшую их эксплуатацию, по письменному требованию Государственного партнера-2 Частный партнер должен в согласованный срок, устранить дефекты и привести Объекты ГЧП в состояние пригодное для эксплуатации.

5. Частный партнер передает Объекты ГЧП Государственному партнеру 2 на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами.

6. Одновременно с передачей Объектов ГЧП, Частный партнер обязан передать Государственному партнеру-2 документы, относящиеся к Объектам ГЧП.

7. Передача Частным партнером Объектов ГЧП Государственному партнеру-2 считается исполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи.

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев В.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 6 к Договору государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Финансово-экономический план реализации проекта ГЧП

Инвестиции Частного партнера:

	2023	2024	Итого
	1	2	
Инвестиции	2 948 485 926,40	9 238 480 000,00	12 186 965 926,40
Стоимость строительства	2 297 120 000,00	9 188 480 000,00	11 485 600 000,00
Вознаграждения по займам в период создания (строительства) объекта ГЧП	139 481 126,40	0,00	139 481 126,40
Финтех аудит	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Комиссия за организацию займа	91 884 800,00	0,00	91 884 800,00
Расходы связанные с оформлением земельного участка	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
Страхование строительства	50 000 000,00	50 000 000,00	100 000 000,00

Обязательства Государственного партнера:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
КИЗ+КОЗ+ВЗУ (с НДС)	2 263 280 260,27	5 681 469 312,63	5 331 162 445,24	4 983 212 843,69	4 639 889 528,09	4 349 177 438,44	27 248 191 828,36

Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) с НДС 1-этапа	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	3 067 182 459.42
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) с НДС 2-этапа	0,00	1 840 309 475.63	1 840 309 475.63	1 840 309 475.63	1 840 309 475.63	1 840 309 475.63	9 201 547 378.15
Компенсация операционных затрат (КОЗ) с НДС	1 520 921 887,07	2 374 504 631,80	2 024 197 764,41	1 676 248 162,86	1 332 924 847,26	1 042 212 757,61	9 971 010 051,01
ВЗУ с НДС	231 161 296,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	5 008 451 939.78

КИЗ 1-этапа – ежегодно с 2024 года(не позднее 15 апреля)
КИЗ 2-этапа – ежегодно с 2025 года (не позднее 15 апреля)
КОЗ – до конца каждого месяца, следующего за отчетным периодом
ВЗУ – ежегодно с 2024 года (не позднее 15 апреля)

Тенге (с НДС)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (КОЗ) (с НДС):	1 520 921 887,07	2 374 504 631,80	2 024 197 764,41	1 676 248 162,86	1 332 924 847,26	1 042 212 757,61	9 971 010 051,01
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (КОЗ) (без НДС):	1 357 965 970,60	2 120 093 421,25	1 807 319 432,51	1 496 650 145,41	1 190 111 470,77	930 547 105,01	8 902 687 545,55

Энергопотребление	123 910 714,29	265 168 928,57	283 730 753,57	303 591 906,32	324 843 339,76	347 582 373,55	1 648 828 016,06
Эксплуатационные расходы	55 071 428,57	131 995 200,00	141 234 864,00	151 121 304,48	161 699 795,79	173 018 781,50	814 141 374,34
Заработная плата	30 249 367,20	32 366 822,90	34 632 500,51	37 056 775,54	39 650 749,83	90 748 101,60	264 704 317,58
Страхование залогового имущества	13 051 586,00	13 051 586,00	13 051 586,00	13 051 586,00	13 051 586,00	13 051 586,00	78 309 516,00
Налог на имущество	48 581 986,29	164 313 346,04	164 313 346,04	164 313 346,04	164 313 346,04	164 313 346,04	870 148 716,49
Вознаграждения по займам в период эксплуатации объекта ГЧП	1 087 100 888,25	1 513 197 537,74	1 170 356 382,39	827 515 227,03	486 552 653,35	141 832 916,32	5 226 555 605,08

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 7 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство
и эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Распределение рисков между Частным партнером и Государственным партнером-1 и/или Государственным партнером-2

Наименование риска	Классификация риска	Ответственная сторона	Меры по снижению вероятности возникновения риска
Подготовительный этап			
Расторжение договора по вине Государственных партнеров до начала работ по строительству	Юридический риск	Государственные партнеры	Государство должно: - предоставлять полную информацию о проекте; - проводить встречи по решению проблем; - искоренять ошибочную информацию в ходе передачи какой-либо информации; - предоставлять материалы, касающиеся проекта. На стадии переговоров по заключению контракта стороны должны детально обсудить все условия и обязательства по заключаемому Договору ГЧП
Несоблюдение сроков разработки проектной документации и получения на нее заключения комплексной вневедомственной экспертизы	Технико-производственный риск	Частный партнер	Должный отбор подрядчиков/субподрядчиков с соответствующим опытом для выполнения работ, положительным имиджем, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования и тщательная проработка условий договора с ними. Организация своевременного контроля над соблюдением сроков и процессов разработки ПСД. Предусмотреть применение штрафных санкций при отклонении по срокам разработки ПСД.
Не привлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для создания Объектов ГЧП	Финансовый риск	Частный партнер	Частному партнеру рекомендуется заключить предварительное соглашение с банком о возможности предоставления финансирования для реализации проекта.
Несвоевременное предоставление земельного	Технико-производственный	Государственный партнер-2	Обеспечение Государственным партнером-2 своевременного выделения земельных участков и надлежащее оформление прав

участка / государственного имущества Государственным партнером-2	риск		пользования ими
Несвоевременное получение разрешительных и прочих документов на строительство Объектов ГЧП	Технико-производственный риск	Частный партнер	Государственному партнеру 2 обеспечить своевременное предоставление всех разрешительных документов на строительство Объектов ГЧП. Частный партнер должен предварительно ознакомиться с пакетом документации, требуемой соответственным государственным органом, для получения разрешительных документов, определить последовательность и длительность операций Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750, а также вести контроль сроков рассмотрения документов
Этап строительства			
Расторжение Договора по инициативе Частного / Государственных партнеров после начала работ по строительству	Юридический риск	Государственные партнеры / Частный партнер	Стороны должны: - рассмотреть приемлемые сроки в Договоре ГЧП; - проводить встречи по решению возникших проблем; - искоренять ошибочную информацию в ходе передачи какой-либо информации; - добросовестно соблюдать все условия в соответствии с Договором ГЧП и проектно-сметной документацией.
Увеличение стоимости строительства (рост цен на материалы, транспортировку, на оборудование и т.п.)	Финансовый риск	Частный партнер	Планирование Частным партнером своих денежных потоков, а также поставок необходимых товаров, работ и услуг с учетом возможного изменения конъюнктуры цен на соответствующих рынках. Заключение предварительных контрактов на оказание работ/услуг и поставку товаров (строительных материалов), в том числе проработка схемы оплаты, предусматривающей расчет по факту выполненных работ/услуг/поставки товара с небольшой долей авансового платежа (до 30% от стоимости работ/услуг/товара). Привлечение строительной компании с положительным имиджем, опытом работы в строительстве, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования. Соблюдение графика строительства,

			своевременная оплата товаров и услуг. Обеспечение своевременного контроля со стороны частного партнера за ходом и качеством строительства. Применение таких инструментов как страхование надлежащего исполнения строительно-подрядного контракта, заключение контрактов с фиксированной ценой, включая поставку материалов. Привлечение независимого инженера для контроля над качеством работ от лица Частного партнера. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей в местах хранения, в том числе посредством договора с охранными организациями.
Рост инфляции	Финансовый риск	Частный партнер	«Со стороны Частного партнера предусмотреть возможности нивелирования указанного риска»
Увеличение ставок по страхованию	Финансовый риск	Частный партнер	
Увеличение процентной ставки займа после заключения договора	Финансовый риск	Частный партнер	заключение Частным партнером договора займа с финансовой организацией на приемлемых условиях, в т.ч. с фиксированной процентной ставкой
Дефолт / банкротство подрядчика / субподрядчика	Финансовый риск	Частный партнер	Должный отбор подрядчиков / субподрядчиков с соответствующим опытом для выполнения работ, положительным имиджем, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования и тщательная проработка условий договора с ними.
Увеличение сроков строительства в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком	Технико-производственный риск	Частный партнер	Привлечение строительной компании с положительным имиджем, опытом работы в строительстве, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования. Организация своевременного контроля над соблюдением графика строительства. Тщательная проработка условий Договора с подрядчиками/субподрядчиками. Тщательная проработка длительности работ, потребностей в ресурсах и ограничений графика работ. Предусмотреть применение штрафных санкций и предоставление обеспечения исполнения обязательств по строительству Объектов ГЧП. Рекомендуется внедрение проектного управления согласно международным

			стандартам.
Изменение проектных решений в ходе строительства	Технико-производственный риск	Частный партнер / Государственные партнеры	На стадии переговоров по заключению договора стороны должны: - рассмотреть возможные проектные решения с учетом имеющихся требований и возможностей; - проводить встречи по решению возникающих проблем; - искоренять ошибочную информацию в ходе обмена информацией; - добросовестно соблюдать все условия в соответствии с Договором ГЧП и проектно-сметной документацией.
Нарушение строительных норм и правил, в т.ч. несоответствие работ проектной документации	Технико-производственный риск	Частный партнер	Частному партнеру необходимо тщательно изучить все необходимые требования (СНиП, СН, др.) по строительству. Осуществление надлежащего контроля за ходом строительства. Тщательная проработка контрактных обязательств, в т.ч. в случае привлечения субподрядных организаций. Предусмотреть соответствующие штрафные санкции при возникновении нарушений.
Возникновение пожара в ходе строительства с участием или без участия третьих лиц	Технико-производственный риск	Частный партнер	Частному партнеру необходимо: - соблюдать правила пожарной безопасности, а также техники безопасности; - проводить инструктаж рабочих по правилам техники безопасности; - при наборе рабочих, ответственных за сварочно-монтажные работы, учитывать опыт работы в отрасли, квалификацию; - застраховать имущество, строящиеся объекты, оборудование и строительные материалы. Государственному партнеру-2 необходимо вести мониторинг соблюдения норм пожарной безопасности.
Проблемы во взаимодействии с энергоснабжающей компанией	Технико-производственный риск	Государственный партнер-2	Государственный партнёр-2 на этапе планирования проекта ГЧП должен обеспечить согласование с энергоснабжающей организацией принимаемых по проекту решений
Несоответствие материалов и оборудования требованиям экологической безопасности и энергосбережения	Экологический риск	Частный партнер	Использование и/или применение разрешенных, допущенных, сертифицированных стандартизированных материалов и оборудования. Закуп материалов с учетом специфики строительства Объектов ГЧП.
Производственный конфликт со	Операционный риск	Частный партнер	Строгое соблюдение трудового законодательства Республики Казахстан.

стороны персонала частного партнера (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и т.д.)			
Возникновение государственного переворота, революции, терроризма, военных действии, митинга, бунта, локауты, забастовки и т.д.	Социальный риск	совместный	Государство должно указать в договоре ГЧП форс-мажорные обстоятельства и план дальнейших действий в случае возникновения политического риска. Частному партнеру необходимо застраховать имущество, строящиеся объекты, оборудование и строительные материалы.
Этап эксплуатации			
Изменение законодательных норм, касающихся регулирования отношений Государственных и Частного партнеров, деятельности компании Частного партнера в процессе эксплуатации объектов ГЧП в рамках договора ГЧП	Юридический риск	совместный	В случае изменения законодательных норм, регулирующих отношения Государственных и Частного партнеров необходимо предусмотреть возможность внесения изменений и/или дополнений в договор ГЧП, не ухудшающих существенных условий договора ГЧП.
Расторжение договора по инициативе Государственных партнеров / Частного партнера после даты начала оказания Услуг	Юридический риск	Частный / Государственные партнеры	Стороны должны рассмотреть приемлемые сроки в договоре ГЧП, предоставлять полную информацию о проекте, проводить встречи по решению проблем, искоренять искаженную информацию в ходе обмена данными, предоставления тех или иных материалов, касающихся проекта.
Нехватка квалифицированного персонала	Операционный риск	Частный партнер	Частный партнер должен предусмотреть возможность обучения персонала эксплуатации и техническому обслуживанию конструктивных элементов сетей уличного освещения.
Увеличение налоговых ставок	Финансовый риск	Частный партнер	

Рост инфляции	Финансовый риск	Частный партнер	«Со стороны Частного партнера предусмотреть возможности нивелирования указанного риска»
Увеличение ставок по страхованию	Финансовый риск	Частный партнер	
Банкротство Частного партнера	Финансовый риск	Частный партнер	
Возникновение пожара в ходе эксплуатации сетей уличного освещения с участием третьих лиц	Технико-производственный риск	Частный партнер	Частному партнеру необходимо: - соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности; - проводить инструктаж персонала по эксплуатации оборудования.
Некачественное техническое обслуживание конструктивных элементов сетей уличного освещения	Операционный риск	Частный партнер	Тщательный подбор и расстановка персонала, контроль за процессом обучения персонала по работе с оборудованием, обеспечение квалификации персонала, контроль работ персонала по техническому обслуживанию.
Возникновение государственного переворота, революции, терроризма, военных действии, митинга, бунта, локауты, забастовки и т.д.	Социальный риск	совместный	Государство должно указать в договоре ГЧП форс-мажорные обстоятельства и план дальнейших действий в случае возникновения политического риска. Частному партнеру необходимо застраховать имущество, строящиеся объекты, оборудование и строительные материалы.

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 8 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Форма отчета об исполнении Частным партнером обязательств по доверительному управлению Объектами ГЧП

№	Улица	К-во установленных светодиодных светильников (шт.)	К-во вышедших из строя светодиодных светильников (шт.)	К-во установленных опор. шт.	К-во поврежденных опор в результате дорожно-транспортного происшествия, умышленного/неумышленного повреждения механизмами третьих лиц
1					
2					
3					
	Итого				

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 9 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство и
эксплуатация сетей уличного
освещения в городе Атырау
(протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Периодичность

технического обслуживания и текущего ремонта установок Объектов ГЧП

Наименование установки	Перечень работ	Периодичнось выполнения работ	Повторяемость работы в течение года / объем работ
Светильники	Проверка состояния горения	1 раз в 2 недели с октября по март, 1 раз в 3 недели с апреля по сентябрь	22
	Осмотр светильников	2 раза в год	2
	Замена светодиодных светильников	только при выходе из строя	
	Расфазировка светильников	10% в год	0,1
	Перезарядка арматуры и замены патронов	5% в год	0,05
	Замена пускорегулирующей аппаратуры	20% в год	0,2
	Замена зарядного провода	5% в год	0,05
Воздушные линии	Верховой осмотр воздушных линий	1 раз в месяц	12
	Очистка сетей от веток и набросов	1 раз в год (не менее 35% от общего количества ВЛНО)	0,35
	Перетяжка проводов и регулировка тросов	20% в год	0,2

Опоры	Замена металлических опор	Только в случае повреждения	
	Уборка сбитых опор	6% в год	0,06
	Замена изоляторов	3% в год	0,03
	Перезарядка кронштейнов	20% в год	0,02
	Выправка опор	12% в год	0,12
	Покраска кронштейнов	40% в год	0,4
	Замена бандажа	5% в год	0,05
	Укрепление бандажа	10%	0,1
	Установка пасынков	1% в год	0,01
	Нумерация опор	1раз в год	1
	Покраска металлических опор	1раз в 3 года	0,33
	Проверка состояния на коррозию и антикоррозию, покрытие металлических опор	1 раз в 6 лет	0,17
	Проверка на коррозию металлических фундаментов опор	1 раз в 6 лет	0,17
	Замена, монтаж и демонтаж самонесущего изолированного провода	не реже 1 раза в месяц	0,01
Кабельные линии	Осмотр кабельной линии, кабельных колодцев, концевых муфт (на линиях до 1000 В)	4 раза в год	4
	Замена кабельной линии, муфт, восстановление каменных кладок колодцев и каналов; вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии	10% в год	0,1
	Проверка состояния изоляции	1 раз в 3 года	0,34
Пункты питания	Техническое обслуживание	4 раза в год	4
	Текущий ремонт	1 раз в год	1
	Снятие показания приборов учета	3 раза в месяц	12
Устройство автоматического	Техническое обслуживание установок	1 раз в месяц	12

управления наружными сетями освещения	каналов связи наружного освещения		

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Приложение 10 к Договору
государственно-частного партнерства
по проекту государственно-частного партнерства
«Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе
Атырау (протяженность – 319 068 метров)
от «__»_____2023 г.

Расчет Штрафных очков за нарушения индикаторов качества и доступности предоставляемых Услуг и по обеспечению полной эксплуатационной готовности Объектов ГЧП

Частный партнер в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, обязан направлять сопроводительным письмом Государственному партнеру-2 отчет об исполнении индикаторов качества и доступности Услуг, о наличии или отсутствии иного нарушения. Отчет должен содержать подробное описание исполнения/неисполнения индикаторов качества и доступности Услуг с приложением подтверждающих документов.

Государственный партнер-2 в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения отчета направляет Частному партнеру уведомление о подтверждении исполнения или неисполнении индикаторов качества и доступности, наличия/отсутствия замечаний. Достоверность отчета проверяется представителями Сторон.

Частный партнер обязан устранить выявленные нарушения индикаторов качества и доступности, дефекты, связанные с эксплуатацией Объектов ГЧП в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от Государственного партнера-2.

Если Частный партнер не устранил или не выполнил замечания, указанные в уведомлении, Государственный партнер-2, начиная с 6 (шестого) календарного дня начисляет Штрафные очки до полного их устранения Частным партнером, уведомив об этом Частного партнера.

Количество Штрафных очков представляет собой максимальное количество, которое может быть оплачено в отношении одного нарушения.

Штрафные очки будут начисляться путем сложения всех начисленных Штрафных очков с указанием соответствующих пояснений.

Размер одного штрафного очка составляет 5 000 тенге.

Размер оплаты за Штрафные очки и штрафы за несвоевременную оплату удерживаются с ВЗУ.

Частный партнер вправе оспорить уведомление о начислении Штрафных очков, направив Государственным партнерам мотивированное возражение с приложением письменного обоснования и указанием причины неустранения/невыполнения в течение 5 (пяти) календарных дней после получения подобного уведомления.

Если Государственные партнеры и Частный партнер не смогут прийти к соглашению по любому такому вопросу в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого возражения со стороны Частного партнера, любая из сторон может воспользоваться порядком разрешения споров, согласно Законодательства.

Сбор данных для проведения оценки потребителями качества услуг эксплуатации Объектов ГЧП осуществляется представителями Сторон путем просмотра социальных сетей.

1. Индикаторы качества и доступности Услуг[1]

№п/п	**Наименование индикаторов**	**Периодичность информации**	**Пороговое значение**	**Количество штрафных очков при выявлении нарушений индикаторов качества и доступности**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**Обеспечение условий работы Объектов ГЧП**			
1.1	Некачественное техническое обслуживание (эксплуатация) сетей наружного освещения *(далее – СНО)* *Начисляется на каждую единицу наряд-задания на устранение неисправностей, обследований СНО, др. отчетных документов Частного партнера, связанных с эксплуатацией Объектов ГЧП согласно периодичности технического обслуживания, установленного Приложение 9.*	**Ежемесячно**	Исполненный в срок и в полном объеме наряд-задание, обследований СНО, др.документов/обязательств, касающихся сервисного обслуживания	10 Штрафных очков
1.2	Несоблюдение нормативов освещенности улиц по категориям (СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и	2 раза в месяц	Соблюдение нормативов	2 Штрафных очка

[1] Перечень индикаторов может меняться с внесением соответствующих изменений в Договор

	искусственное освещение») *Начисляется за каждый случай несоблюдения по каждой улице*			
1.3	Наличие аварийных отключений, произошедших по вине Частного партнера, вне зависимости от площади и времени отключения *Начисляется за каждый день неустранения аварийной ситуации со дня возникновения*	Ежеквартально	Не более одной аварийной ситуации в год	2 Штрафных очка
1.4	Наличие единовременных отказов и/или поломок на СНО *Начисляется за каждый случай, оценивающийся более 5% от общего количества сетей наружного освещения города Атырау (общее количество светоточек города). При этом продолжительность не функционирования сетей не берется в учет. Итоги плановых/внеплановых проверок актируются.*	Ежемесячно	Не более 5% от общего количества сетей наружного освещения города Атырау	5 Штрафных очков
1.5	Нерегулярность проведения текущего ремонта Объектов ГЧП или их отдельных частей Объектов ГЧП *Начисляется в случае отсутствия работ по текущему ремонту, подтвержденных документально*	Ежегодно	1 раз в год	10 Штрафных очков
2	**Оценка потребителями качества Объектов ГЧП**			
2.1	Наличие обоснованных жалоб населения, зафиксированных в социальных сетях, мессенджерах, интернет-обращениях, письмах, поступающих в местные исполнительные органы города	Ежемесячно	Не более одной жалобы	2 Штрафных очка

	Атырау, касательно ненадлежащего функционирования сетей наружного освещения по вине Частного партнера, факт нарушений должен быть подтвержден специально созданной комиссией из представителей Государственного партнера-2 и Частного партнера. *Начисляется в случае превышения порогового значения.*			

Способ оценки:

а) Количество Штрафных баллов представляет собой максимальное количество, которое может быть начислено за нарушение одного обязательства;

б) Штрафные баллы начисляются путем их сложения за каждый день просрочки нарушенного обязательства.

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.

Расшифровка компенсации инвестиционных затрат по проекту ГЧП

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	итого
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) с НДС 1-этапа	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	511 197 076,57	**3 067 182 459,42**
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) с НДС 2-этапа	0,00	1 840 309 475,63	1 840 309 475,63	1 840 309 475,63	1 840 309 475,63	1 840 309 475,63	**9 201 547 378,15**
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) без НДС 1- этапа	456 425 961,22	456 425 961,22	456 425 961,22	456 425 961,2*6 2	456 425 961,22	456 425 961,22	**2 738 555 767,33**
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) без НДС 2- этапа	0,00	1 643 133 460,38	1 643 133 460,38	1 643 133 460,38	1 643 133 460,38	1 643 133 460,38	**8 215 667 301,91**

Расшифровка компенсации операционных затрат по проекту ГЧП

1. **Энергопотребление в год**

Мощность светильника	Количество часов работы одного светильника в год	Потребл. Одного светильника в год (кВт*ч)	Количество светильников по (шт.)	Общее потребление электроэнергии в год (кВт*ч)	Стоимость одного кВт*ч в г.Атырау (тенге)	Общая стоимость потребленной электроэнергии за 1 год в тенге с НДС
0,15	4 500	675	10 281	**6 939 675**	40	**277 587 000**

2. **Эксплуатационные расходы в год**

Техническое обслуживание (ВЛ 0,4, светильников и опор освещения)	123 372 000
Итого	**123 372 000**

3. **Заработная плата в год**

Наименование штатной единицы	**Ежемесячная заработная плата**	**Кол-во штатных единиц**	**Годовая заработная плата**
Директор филиала	1 037 734	1	12 452 809
Бухгалтер-сметчик	397 474	1	4 769 684
Главный диспетчер	480 844	1	5 770 128
Диспетчер	348 708	5	20 922 486
Инженер-электрик	489 116	1	5 869 391
Инженер по ТБ	412 018	1	4 944 217
Инженер по ИТ	317 353	1	3 808 241
Электромонтер	277 121	2	6 650 904
Водитель-механик	279 254	1	3 351 052
Охрана	96 223	2	2 309 362
Электрик	269 421	1	3 233 053
Уборщица помещения	128 508	1	1 542 091
Итого		**18**	
		Итого оплата труда	**75 623 418**

Расшифровка Вознаграждения за управление по проекту ГЧП

	2024	2026	2026	2027	2028	2029	Итого
ВЗУ с НДС	231 161 296,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	955 458 128,63	5 008 451 939,78
ВЗУ без НДС	206 394 014,85	853 087 614,85	853 087 614,85	853 087 614,85	853 087 614,85	853 087 614,85	**4 471 832 089,10**
Маржинальность (%)	7%	7%	7%	7%	7%	7%	

Подписи Сторон

Частный партнер	Государственный партнер-1	Государственный партнер-2
Айтмухаметов К.К.	**Кенжебеков А.Ж.**	**Хамидуллаев Б.Ж.**
Подпись м.п.	Подпись м.п.	Подпись м.п.
